



FIRMA DIGITAL

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Firmado digitalmente por CUBAS DE LA TORRE Rosa Beatriz FAU  
20453744168 soft  
Especialista - Ingeniero Civil  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15.12.2020 10:11:44 -05:00

Cajamarca, 15 de Diciembre del 2020

## INFORME N° D000447-2020-GRC-SGSL

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**  
SUBGERENTE  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE**  
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : ALCANZA LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01, DE LA SUPERVISIÓN DEL ING ALFREDO QUISPE ALFARO, DEL MES DE NOVIEMBRE (11/11/2020 AL 30/11/2020) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL – DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA"..

Referencia : PROVEIDO N° D003191-2020-GRC-SGSL (09Diciembre2020)

Fecha : Cajamarca, 15 de Diciembre de 2020

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzar como adjunto para el trámite de pago, la Valorización de Obra N° 01, de la Supervisión a cargo del Ing Alfredo Quispe Alfaro, de la Obra: "Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Primario En Las Localidades De Cajen Y Bellavista De Cajen – Distrito De Sucre, La Quinua Y Pajonal – Distrito De Oxamarca, De La Provincia De Celendín, Región Cajamarca", correspondiente al período del 11 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020.

Donde se informa que el avance físico hasta el 30 de noviembre del 2020 presentado por la supervisión es de 2.82% de lo programado 3.36%, teniendo un avance acumulado de 2.82%, de lo programado es de 3.36% según el cronograma valorizado de obra, encontrándose que dicha obra está atrasada en un 0.54%

A continuación se detalla la valorización N°1 de la supervisión:



VALORIZACIÓN CONTRACTUAL N° 001

**CONTRATO** : "Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Primario En Las Localidades De Cajen Y Bellavista De Cajen – Distrito De Sucre, La Quinua Y Pajonal – Distrito De Oxamarca, De La Provincia De Celendín, Región Cajamarca".

**Entidad** : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
**Consultor** : ALFREDO QUISPE ALFARO.  
**Contrato** : N° 006-2020-GRCAJ-Primera Convocatoria

ITEM	CONCEPTO	VALORIZACION No. 01 (S/.)
A	<b>MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES:</b>	<b>32,231.43</b>
	VALORIZACIÓN DEL SERVICIO N°001	32,231.43
B	<b>DETRACCION:</b>	<b>-3,867.77</b>
	DETRACCION	-3,867.77
C	<b>RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>-11,657.63</b>
D	<b>REAJUSTES</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00</b>	<b>MONTO FACTURABLE A+B+C+D (SIN IGV)</b>	<b>13,698.94</b>
<b>2.00</b>	<b>IGV (18%)</b>	<b>3,007.09</b>
<b>3.00</b>	<b>MONTO TOTAL A FACTURAR (INC. IGV)</b>	<b>16,706.03</b>
<b>4.00</b>	<b>PENALIDAD</b>	<b>2,150</b>
<b>5.00</b>	<b>MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>	<b>14,556.03</b>

Monto a pagar al contratista **S/ 14,556.03** (Catorce mil quinientos cincuenta y seis con 03/00) soles, se adjunta el informe de pago de valorización de la supervisión con 198 folios.

**NOTA:** La penalidad impuesta es debido al retraso en la presentación del infomre mensual según lo establecido en la CLAUSULA DECIMOTERCERA en el Item 13 que a la letra dice "**Por no presentar a la Entidad el informe mensual de obra concluida la valorización, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente**"



mensuales de control de calidad.		
<b>INFORME MENSUAL A PRESENTAR</b>		
Por no presentar a la ENTIDAD el Informe mensual de Obra concluida la valorización, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente.	Media (0.50) UIT vigente.	

El informe ingresa con fecha 09/12/2020, siendo su plazo máximo el día 07/12/2020, por lo que se realiza la penalidad de media UIT VIGENTE, según el cuadro del MEF, el valor de la UIT vigente es de 4300 soles

2019	ANUAL	Soles	4200	D.S. 298-2018-EF	(18-12-2018)
2020	ANUAL	Soles	4300	D.S. 380-2019-EF	(20-12-2019)

**FICHA TECNICA DE OBRA**

<b>Nombre de la obra</b>	:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL – DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".
<b>Unidad ejecutora</b>	:	Gobierno Regional de Cajamarca
<b>Licitación publica</b>	:	Nº 001-2020-GRCAJ – Primera Convocatoria
<b>Fecha de buena pro</b>	:	30 de setiembre del 2020
<b>Contrato de servicios</b>	:	Nº 002-2020-GRCAJ – Primera Convocatoria
<b>Monto del servicio</b>	:	S/.7'449,323.31 (Inc. IGV)
<b>Fecha de suscripción</b>	:	02 de noviembre del 2020
<b>Financiamiento</b>	:	Recursos ordinarios
<b>Modalidad</b>	:	Suma alzada
<b>Plazo de ejecución</b>	:	I.E Nº82524 CAJEN -170 días I.E Nº82526 BELLAVISTA DE CAJEN -213 días I.E Nº82422 LA QUINUA -255 días I.E Nº821096 PAJONAL -192 días
<b>Ubicación</b>	:	Cajen, Bellavista De Cajen, La Quinua. Pajonal
<b>Contratista</b>	:	Consortio Virgen de Guadalupe
<b>Representante legal</b>	:	JOSE MANUEL LOPEZ ZAPATA
<b>Residente de obra</b>	:	Ing. Jorge Rodas Balcazar
<b>Acta de terreno</b>	:	I.E Nº82524 CAJEN -10/11/2020 I.E Nº82526 BELLAVISTA DE CAJEN -10/11/2020 I.E Nº82422 LA QUINUA -11/11/2020 I.E Nº821096 PAJONAL -11/11/2020
<b>Fecha de inicio de obra</b>	:	I.E Nº82524 CAJEN -11/11/2020 I.E Nº82526 BELLAVISTA DE CAJEN -11/11/2020 I.E Nº82422 LA QUINUA -12/11/2020 I.E Nº821096 PAJONAL -12/11/2020
<b>Fecha de término de obra (vigente)</b>	:	I.E Nº82524 CAJEN -30/04/2021 I.E Nº82526 BELLAVISTA DE CAJEN -12/06/2021 I.E Nº82422 LA QUINUA -25/07/2021



		I.E N°821096 PAJONAL -23/05/2021
<b>Supervisión</b>	:	
<b>Contrato de supervisión de obra</b>	:	N° 007-2020-GRCAJ-GGR.
<b>Jefe de supervisión</b>	:	Ing. ALFREDO QUISPE ALFARO
<b>Inicio de Supervisión</b>	:	I.E N°82524 CAJEN -11/11/2020 I.E N°82526 BELLAVISTA DE CAJEN -11/11/2020 I.E N°82422 LA QUINUA -12/11/2020 I.E N°821096 PAJONAL -12/11/2020
<b>Avance de ejecutado al mes de diciembre 2020</b>	:	2.82 %

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE**  
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



Ing. ALFREDO QUISPE ALFARO  
CIP: 54579, OSCE 06133

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJÉN Y BELLAVISTA DE CAJÉN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".

Cajamarca, 07 de diciembre del 2020

**CARTA N° 09 -2020 /AQA-SO.**

Señores : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL  
 Atención : Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA  
 Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones  
 Asunto : Solicito **Pago N° 01**, correspondiente al período 11 /11/2020 al 30/11/2020  
 Referencia : a.-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "Mejoramiento del Servicio Eeducativo del nivel primerio en las localidades de Cajen y Bellavista de Cajen- distrito de sucre, la quinua y pajonal- distrito de Oxamarca de la provincia de Celendín, región Cajamarca.

**GRC**  
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**SGD**  
EXPEDIENTE  
2020 - 16555

09 DIC. 2020

09101 e  
RECIBIDO

01 CD  
02 + 03 corrección  
FOLIOS

**TRAMITE DOCUMENTARIO**

b. contrato N° 006-2020-GR-CAJ-GGR

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi calidad de Supervisor de Obra del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo del nivel primerio en las localidades de Cajen y Bellavista de Cajen- distrito de sucre, la quinua y pajonal- distrito de Oxamarca de la provincia de Celendín, Región Cajamarca", obra que es ejecutado por la empresa Contratista él; CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE con la finalidad de solicitarle el **Pago N° 01** correspondiente al Servicio de Supervisión de Obra, que corresponde al.

Período 11/11/2020 al 30/11/2020 (Mes de noviembre del 2020), de acuerdo al siguiente detalle:

PERÍODOS - MESES	MONTO TOTAL - MENSUAL VALORIZADO	DETRACCIÓN	RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	MONTO PARA PAGO
Mes I - Noviembre 2020	S/. 32,231.43	S/. 3,867.77	S/. 11,657.63	S/. 16,706.03

El Monto Solicitado es S/. 32,231.43 Soles

1°. Adjunto:

- 03 archivadores (02 Originales + 01 Copia + 1 CD) – Correspondiente al Informe de la Supervisión.

2°. Para el cumplimiento del pago, solicito que el depósito se realice a las siguientes Cuentas:

- Cuenta Corriente y Código de Cuenta Interbancario (CCI)

**BANCO DE CRÉDITO:**

Número de Cuenta Corriente: 220-2227195-0-40 Soles.

Número de Código de Cuenta Interbancario: 002-220-002227195040-28

*Alfredo Quispe Alfaro*  
**ALFREDO QUISPE ALFARO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. N° 54579

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO - CONSULTOR DE OBRA  
 RUC N° 10282269282

Av. Mariano cornejo N° 1447 -Urb. San Bernardo, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento Lima y  
 Av. Casuarinas N° 445, Urb. Jardín, distrito de Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga - Ayacucho  
 Teléfono CEL. N° 999016410



Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO  
CIP 54579, OSCE C6133

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJÉN Y BELLAVISTA DE CAJÉN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".**

- **N° de Cuenta de Dedicaciones:**  
Número de Cuenta: 0401-071903

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
ALFREDO QUISPE ALFARO  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 54579

Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO  
CIP 54579  
Supervisor de Obra

C.c  
Archivo

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO – CONSULTOR DE OBRA  
RUC N° 10282269282

Av. Mariano cornejo N° 1447 –Urb. San Bernardo, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento Lima y  
Av. Casuarinas N° 445, Urb. Jardín, distrito de Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga - Ayacucho  
Teléfono CEL. N° 999016410

## CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82524 CAJEN - NOVIEMBRE 2020

Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	N° de Contrato de Obra:	N° 002-2020-GR.CAJ-GGR	
Supervisor Externo:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO	Fecha Firma de Contrato:	2/11/2020	
Monto del Contrato:	S/. 7,449,323.31 Con IGV	Departamento:	CAJAMARCA	
Monto del Adelanto Directo:	S/. 0.00 Sin IGV	Provincia:	CELENDIN	
Nombre de Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		Distrito:	SUCRE
		Localidad:	CAJEN	

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO		VALORIZADO (S./.)	%
		VALORIZADO (S./.)	%	VALORIZADO (S./.)	%	VALORIZADO (S./.)	%	VALORIZADO (S./.)	%		
01	DEL 11/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 40,621.88	3.39%	S/ 34,891.54	2.91%	S/ 40,621.88	3.39%	S/ 34,891.54	2.91%	S/ 1,163,772.43	97.09%
02		S/ 162,596.37	13.57%			S/ 203,218.24					
03		S/ 365,790.45	30.52%			S/ 569,008.70					
04		S/ 262,087.08	21.86%			S/ 831,095.77					
05		S/ 238,772.35	19.92%			S/ 1,069,868.12					
06		S/ 128,795.84	10.74%			S/ 1,198,663.97					
07											

**Nota:** Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

1	Avance Programado Vigente:	3.39%	S/	40,621.88
2	Avance Ejecutado en el Mes:	2.91%	S/	34,891.54
3	Avance Programado Acumulado al Mes:	3.39%	S/	40,621.88
4	Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	2.91%	S/	34,891.54

Situación Actual de la Obra:

Normal:	NO
Retrasada:	SI
Adelantada:	NO

## CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN - NOVIEMBRE 2020

Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	N° de Contrato de Obra:	N° 002-2020-GR.CAJ-GGR	
Supervisor Externo:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO	Fecha Firma de Contrato:	2/11/2020	
Monto del Contrato:	S/. 7,449,323.31 Con IGV	Departamento:	CAJAMARCA	
Monto del Adelanto Directo:	S/. 0.00 Sin IGV	Provincia:	CELENDIN	
Nombre de Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		Distrito:	SUCRE
		Localidad:	BELLAVISTA	

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%
01	DEL 11/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 50,759.14	3.31%	S/ 44,856.19	2.92%	S/ 50,759.14	3.31%	S/ 44,856.19	2.92%	S/ 1,490,883.05	97.08%
02		S/ 133,015.10	8.66%			S/ 183,774.23					
03		S/ 129,691.41	8.44%			S/ 313,465.64					
04		S/ 360,982.16	23.51%			S/ 674,447.80					
05		S/ 421,718.47	27.46%			S/ 1,096,166.27					
06		S/ 207,376.60	13.50%			S/ 1,303,542.87					
07		S/ 165,347.19	10.77%			S/ 1,468,890.06					
08		S/ 66,849.19	4.35%			S/ 1,535,739.24					
09											

**Nota:** Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

- |   |                                     |       |              |
|---|-------------------------------------|-------|--------------|
| 1 | Avance Programado Vigente:          | 3.31% | S/ 50,759.14 |
| 2 | Avance Ejecutado en el Mes:         | 2.92% | S/ 44,856.19 |
| 3 | Avance Programado Acumulado al Mes: | 3.31% | S/ 50,759.14 |
| 4 | Avance Ejecutado Acumulado al Mes:  | 2.92% | S/ 44,856.19 |

Situación Actual de la Obra:

Normal:	NO
Retrasada:	SI
Adelantada:	NO

## CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82422 LA QUINUA - NOVIEMBRE 2020

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisor Externo: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Monto del Contrato: S/. 7,449,323.31 Con IGV

Monto del Adelanto Directo: S/. 0.00 Sin IGV

Nombre de Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

N° de Contrato de Obra: N° 002-2020-GR.CAJ-GGR

Fecha Firma de Contrato: 2/11/2020

Departamento: CAJAMARCA

Provincia: CELENDIN

Distrito: OXAMARCA

Localidad: LA QUINUA

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%
01	DEL 12/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 68,202.87	3.17%	S/ 59,077.70	2.75%	S/ 68,202.87	3.17%	S/ 59,077.70	2.75%	S/ 2,090,250.81	97.25%
02		S/ 75,166.37	3.50%			S/ 143,369.24					
03		S/ 162,084.04	7.54%			S/ 305,453.28					
04		S/ 336,658.54	15.66%			S/ 642,111.82					
05		S/ 461,983.42	21.50%			S/ 1,104,095.24					
06		S/ 132,859.09	6.18%			S/ 1,236,954.33					
07		S/ 97,645.22	4.54%			S/ 1,334,599.55					
08		S/ 349,586.95	16.27%			S/ 1,684,186.50					
09		S/ 465,142.01	21.64%			S/ 2,149,328.51					
10											

**Nota:** Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

1	Avance Programado Vigente:	3.17%	S/ 68,202.87
2	Avance Ejecutado en el Mes:	2.75%	S/ 59,077.70
3	Avance Programado Acumulado al Mes:	3.17%	S/ 68,202.87
4	Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	2.75%	S/ 59,077.70

Situación Actual de la Obra:

Normal: NO

Retrasada: SI

Adelantada: NO

## CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 821096 PAJONAL - NOVIEMBRE 2020

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE  
 Supervisor Externo: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO  
 Monto del Contrato: S/. 7,449,323.31 Con IGV  
 Monto del Adelanto Directo: S/. 0.00 Sin IGV  
 Nombre de Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

N° de Contrato de Obra: N° 002-2020-GR.CAJ-GGR  
 Fecha Firma de Contrato: 2/11/2020  
 Departamento: CAJAMARCA  
 Provincia: CELENDIN  
 Distrito: OXAMARCA  
 Localidad: PAJONAL

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%
01	DEL 12/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 52,814.69	3.70%	S/ 39,363.97	2.75%	S/ 52,814.69	3.70%	S/ 39,363.97	2.75%	S/ 1,389,890.17	97.25%
02		S/ 86,428.77	6.05%			S/ 139,243.46					
03		S/ 330,379.94	23.12%			S/ 469,623.40					
04		S/ 317,162.56	22.19%			S/ 786,785.96					
05		S/ 205,802.85	14.40%			S/ 992,588.81					
06		S/ 280,770.74	19.64%			S/ 1,273,359.55					
07		S/ 155,894.59	10.91%			S/ 1,429,254.14					
08											

**Nota:** Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

- 1 Avance Programado Vigente: 3.70% S/ 52,814.69
- 2 Avance Ejecutado en el Mes: 2.75% S/ 39,363.97
- 3 Avance Programado Acumulado al Mes: 3.70% S/ 52,814.69
- 4 Avance Ejecutado Acumulado al Mes: 2.75% S/ 39,363.97

Situación Actual de la Obra:

Normal: NO

Retrasada: SI

Adelantada: NO


## ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA

Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

### RESUMEN GENERAL DE OBRA

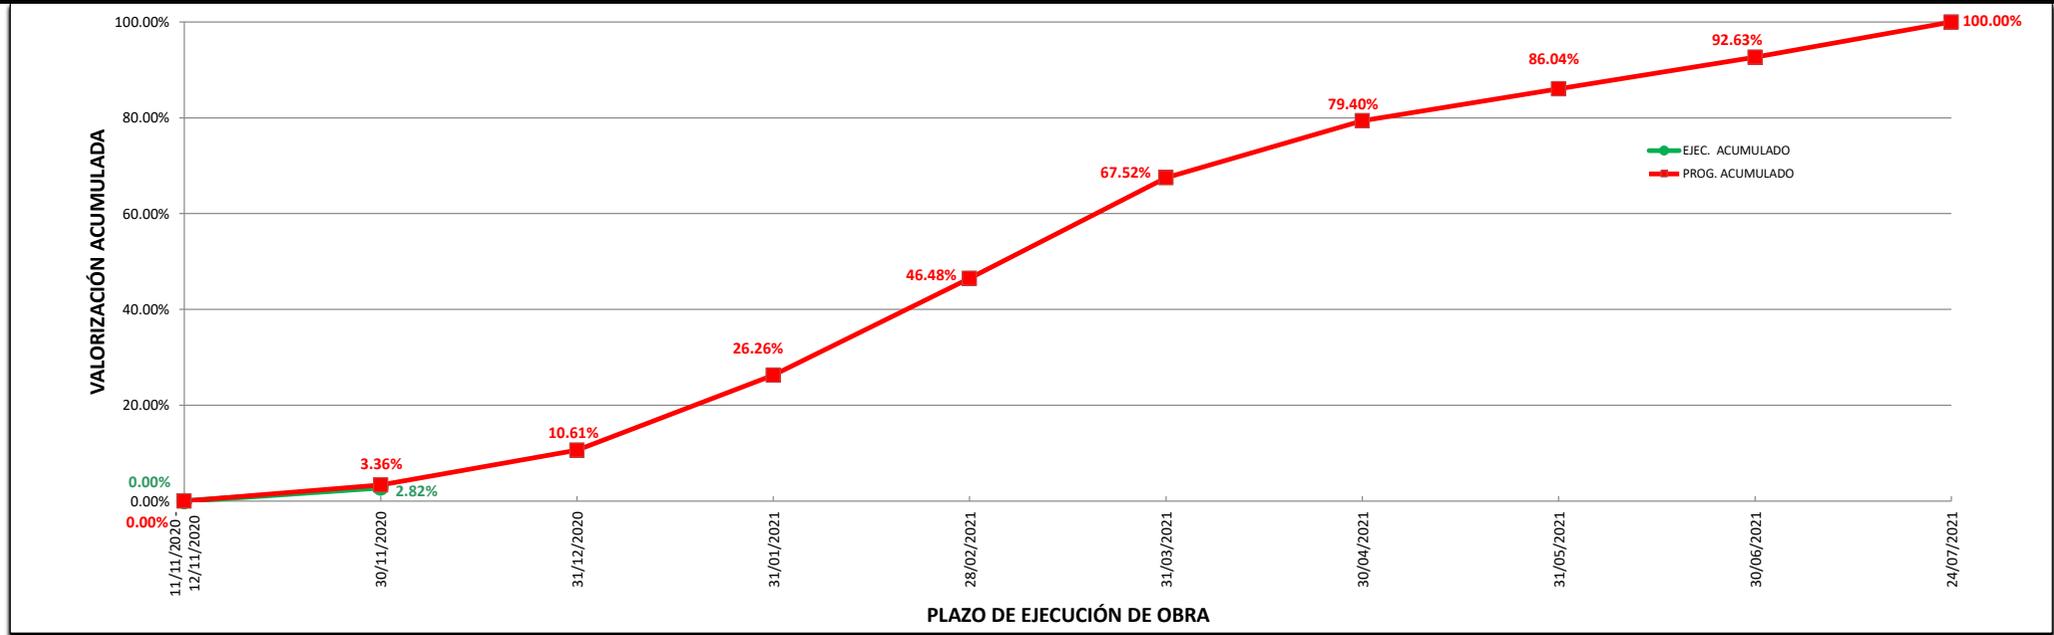

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020 - 12/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	24/07/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 212,398.58	S/ 457,206.60	S/ 987,945.84	S/ 1,276,890.34	S/ 1,328,277.09	S/ 749,802.27	S/ 418,887.00	S/ 416,436.14	S/ 465,142.01
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 212,398.58	S/ 669,605.18	S/ 1,657,551.02	S/ 2,934,441.36	S/ 4,262,718.44	S/ 5,012,520.72	S/ 5,431,407.71	S/ 5,847,843.85	S/ 6,312,985.86
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 178,189.40								
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40	S/ 178,189.40

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES		3.36%	7.24%	15.65%	20.23%	21.04%	11.88%	6.64%	6.60%	7.37%
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.36%	10.61%	26.26%	46.48%	67.52%	79.40%	86.04%	92.63%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES		2.82%							
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.82%							

NOTA.- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN INICIARON SU PLAZO CONTRATUAL EL 11/11/2020, MIENTRAS QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA QUINUA Y PAJONAL INICIARON EL 12/11/2020.

## GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO

Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista:

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE


Supervisión Externa:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión:

ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

**I.E No. 82524 CAJEN**

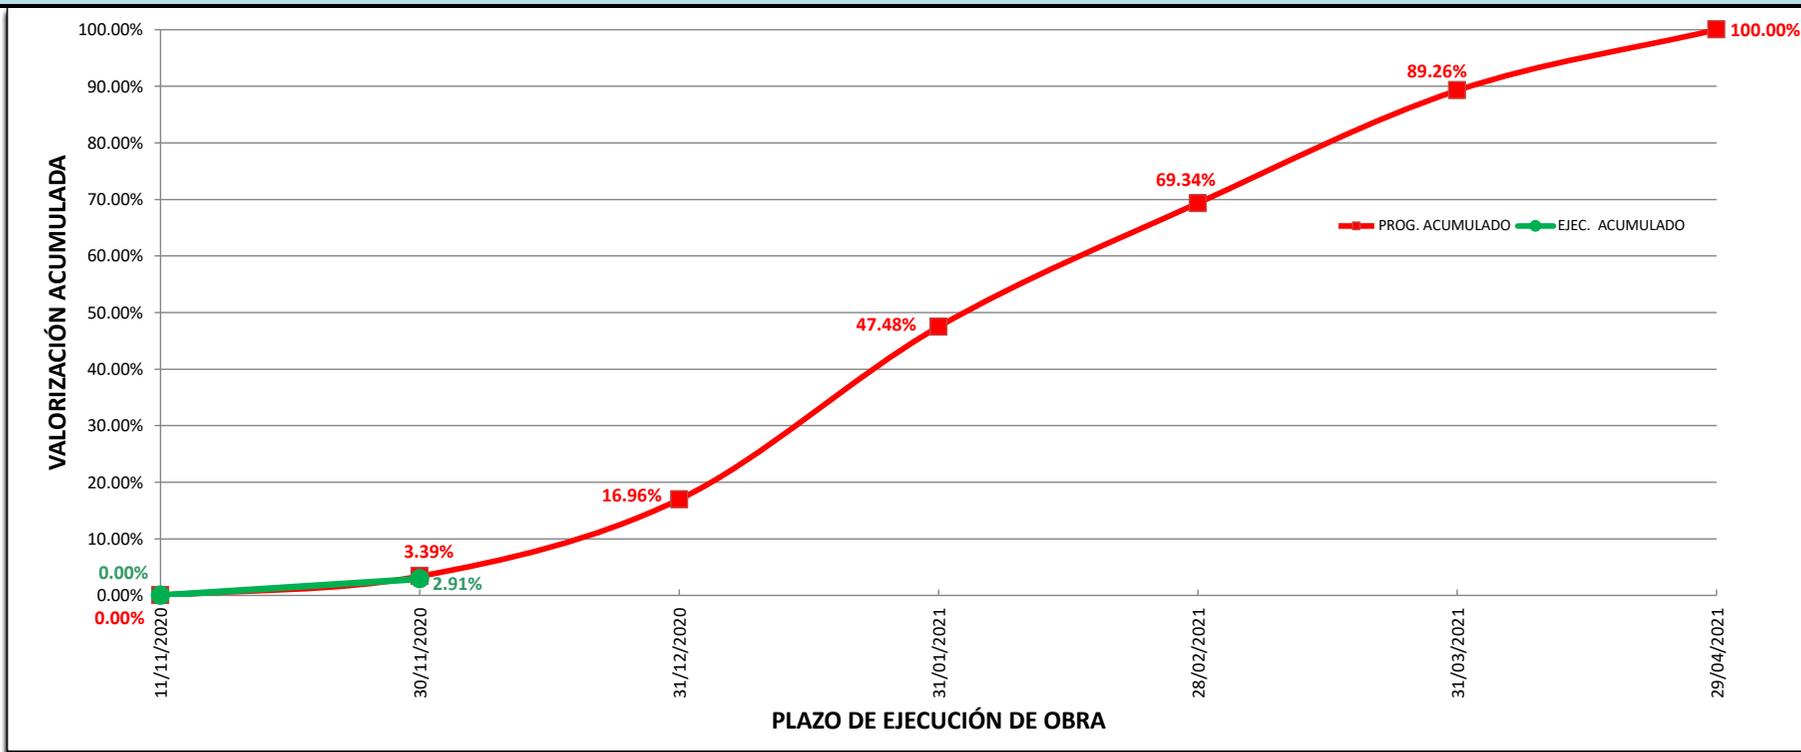

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	29/04/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 40,621.88	S/ 162,596.37	S/ 365,790.45	S/ 262,087.08	S/ 238,772.35	S/ 128,795.84
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 40,621.88	S/ 203,218.24	S/ 569,008.70	S/ 831,095.77	S/ 1,069,868.12	S/ 1,198,663.97
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 34,891.54					
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 34,891.54	S/ 34,891.54	S/ 34,891.54	S/ 34,891.54	S/ 34,891.54	S/ 34,891.54

PROGRAMADO		%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES		3.39%	13.57%	30.52%	21.86%	19.92%	10.74%
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.39%	16.96%	47.48%	69.34%	89.26%	100.00%

EJECUTADO		%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES		2.91%					
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.91%					

## GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

### I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN

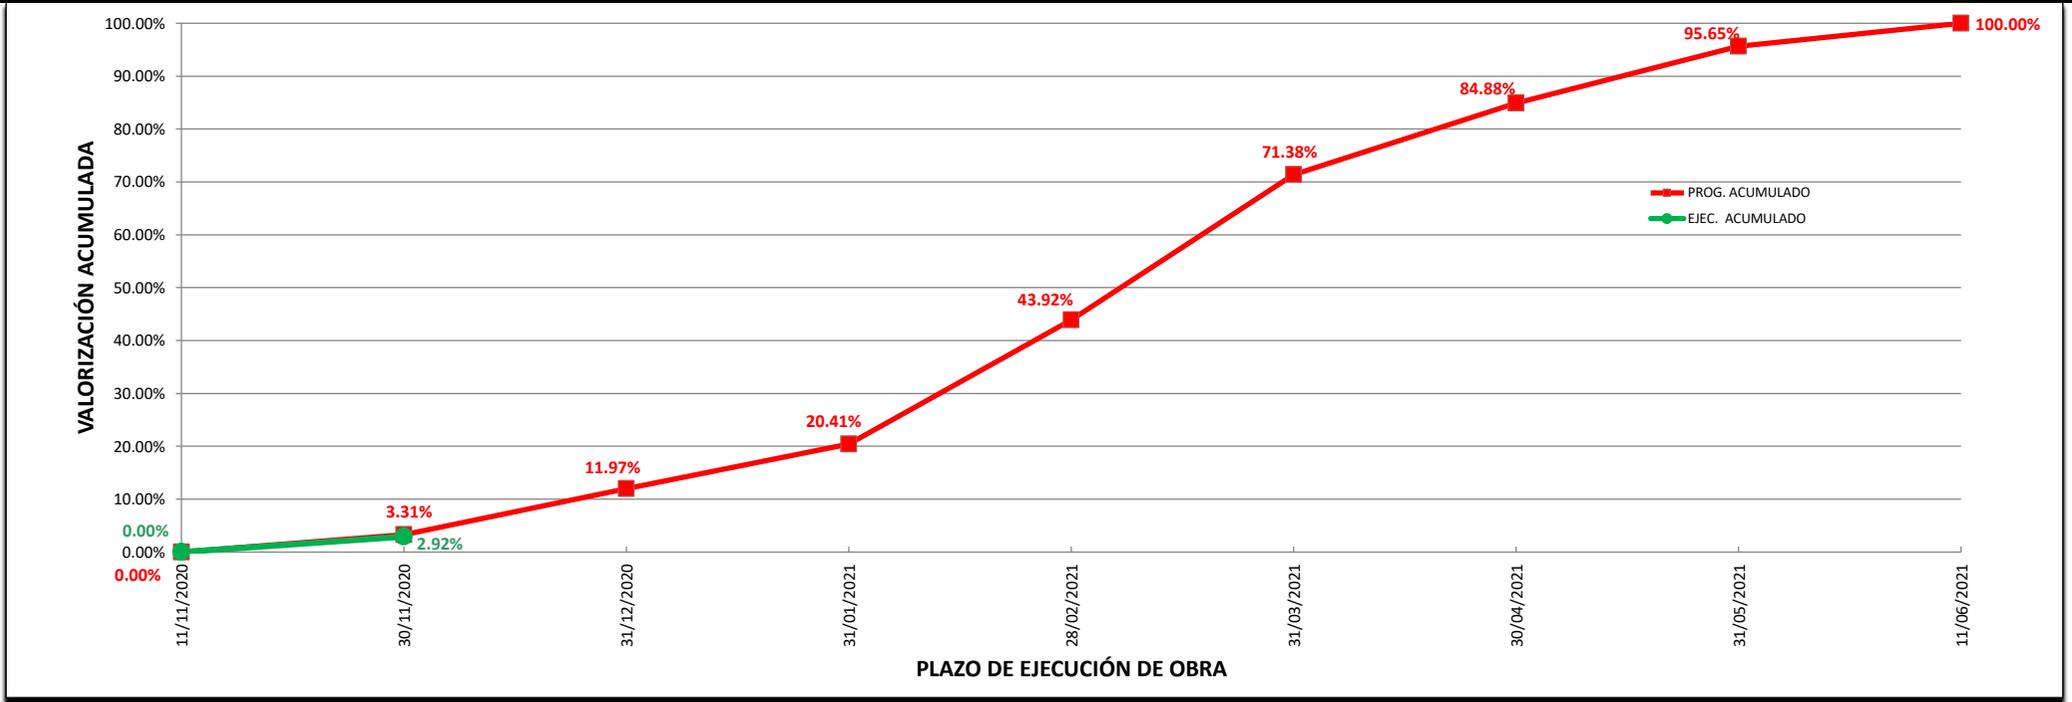

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	11/06/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 50,759.14	S/ 133,015.10	S/ 129,691.41	S/ 360,982.16	S/ 421,718.47	S/ 207,376.60	S/ 165,347.19	S/ 66,849.19
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 50,759.14	S/ 183,774.23	S/ 313,465.64	S/ 674,447.80	S/ 1,096,166.27	S/ 1,303,542.87	S/ 1,468,890.06	S/ 1,535,739.24
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 44,856.19							
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19	S/ 44,856.19

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES		3.31%	8.66%	8.44%	23.51%	27.46%	13.50%	10.77%	4.35%
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.31%	11.97%	20.41%	43.92%	71.38%	84.88%	95.65%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES		2.92%							
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.92%							



## GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

### I.E No. 821096 PAJONAL

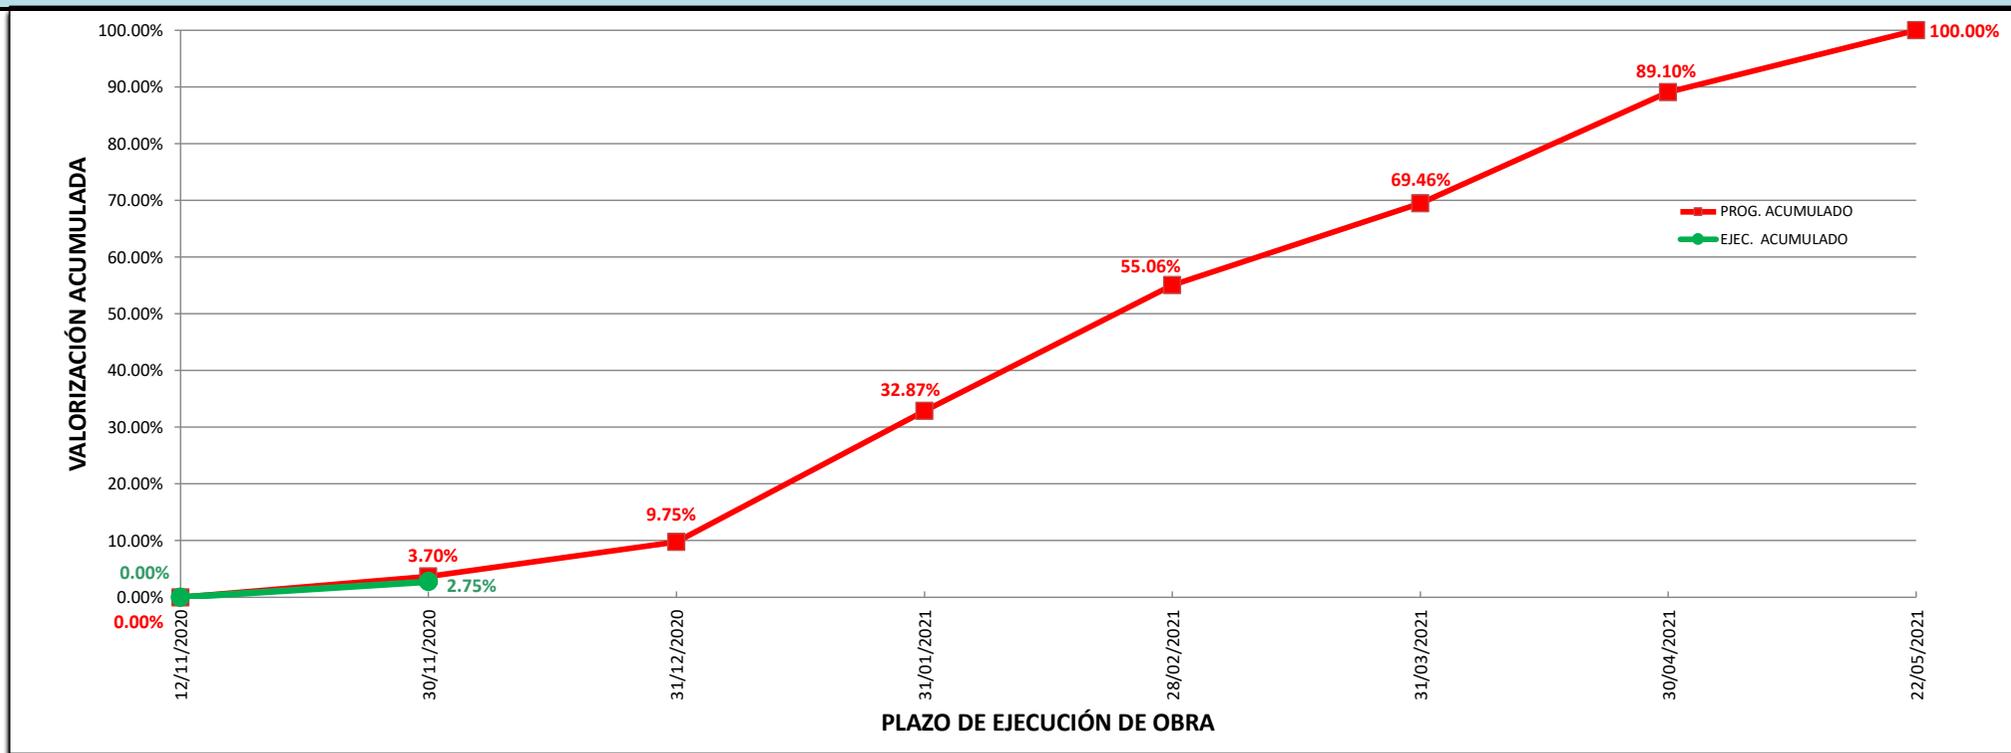

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES
Entrega de Terreno	12/11/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	22/05/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 52,814.69	S/ 86,428.77	S/ 330,379.94	S/ 317,162.56	S/ 205,802.85	S/ 280,770.74	S/ 155,894.59
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 52,814.69	S/ 139,243.46	S/ 469,623.40	S/ 786,785.96	S/ 992,588.81	S/ 1,273,359.55	S/ 1,429,254.14
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 39,363.97						
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES		3.70%	6.05%	23.12%	22.19%	14.40%	19.64%	10.90%
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.70%	9.75%	32.87%	55.06%	69.46%	89.10%	100.00%


EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES		2.75%					
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.75%					



Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO  
CIP 54579, OSCE C6133



## PANEL FOTOGRÁFICO-DE LA I. E N°82524-CAJEN

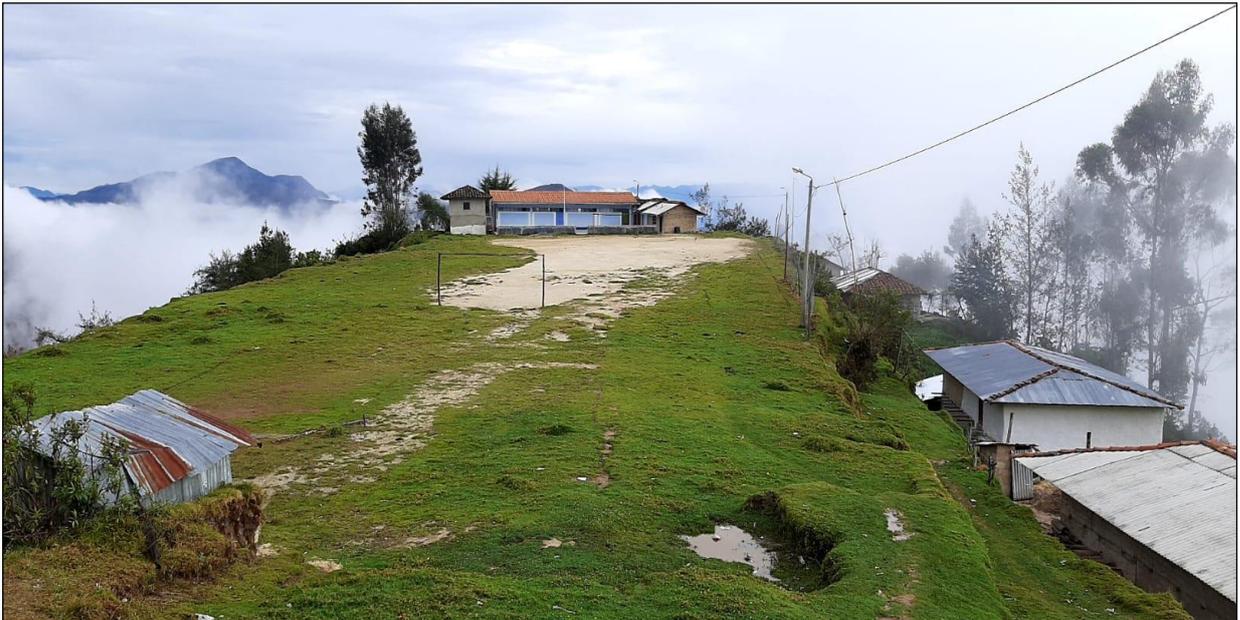

**Fotografía 01:** Vista Panorámica que muestra el Estado Inicial de la de la I. E N°82524- Cajén. Se observa que la I.E, no cuenta con el cerco perimétrico.



**Fotografía 02:** Vista que muestra la instalación del cartel de identificación de Obra de la I.E N° 82524 – Cajén, con la información básica del proyecto para la población y visitantes.



Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO  
CIP 54579, OSCE C6133



**Fotografía 03:** En la vista se aprecia al jefe de supervisión verificando la ejecución del cerco provisional de obra, delimitando de esta manera el área total destinada para la construcción de la obra.



**Fotografía 04:** Previa coordinación con el Ing. Residente de obra, la supervisión ubica el lugar donde se debe instalar la puerta principal de ingreso a la obra.
