



Cajamarca, 15 de Enero del 2021

INFORME N° D000003-2021-GRC-SGSL-RCD

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE**
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : **INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA DEL MES DE DICIEMBRE.**

Referencia : **PROVEIDO N° D003406-2020-GRC-SGSL (21Diciembre2020)**

Fecha : **Cajamarca, 15 de Enero de 2021**

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzarle el informe mensual del supervisor de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL – DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA" luego de la revisión respectiva, donde se pudo observar que se encuentra conforme al contrato de supervisión de la obra en referencia, para que pue pueda ser archivado.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP 54579, OSCE C6133

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJÉN Y BELLAVISTA DE CAJÉN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".

Cajamarca, 21 de diciembre de 2020

CARTA N° 016 - 2020-C6133-AQA

Señores : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

Atención : Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Asunto : **PRESENTO INFORME DE SUPERVISIÓN - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/12/2020 AL 15/12/2020.**

Referencia : a.- SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN- DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL- DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA"
b.- Contrato N° 006-2020-GR-CAJ-GGR

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi calidad de Supervisor de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN- DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL- DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA", con la finalidad de remitirle el Informe de Supervisión - Valorización de Obra N° 02, correspondiente al período 01/12/2020 al 15/12/2020.

ADJUNTO:

- 02 Archivadores (02 Originales + 1 CD) – Correspondiente a la Supervisión.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP 54579
Supervisor de Obra

GRG GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	SGO EXPEDIENTE 2020-17504
21 DIC. 2020	
15:20 RECIBIDO	01 + 02 Archivadores FOLIO 01 CD
TRAMITE DOCUMENTARIO	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES
PASE A: Ing. Rosa Cubas

C.c
Archivo

PARA: Revisión e Informe

FECHA: 21 DIC 2020

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO – CONSULTOR DE OBRA
RUC N° 10282269282

v. Mariano cornejo N° 1447 – Urb. San Bernardo, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento Lima y
v. Casuarinas N° 445, Urb. Jardín, distrito de Andrés Bello Cáceres, provincia de Huamanga - Ayacucho.
Teléfono CEL. N° 999016410

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
REG: 21 DIC 2020
FECHA: 21 DIC 2020
HORA: 15:20

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIÓN 02

Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista:

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisor Externo:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión:

ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

ITEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1.	Valorización Bruta del Mes (Sin IGV.)	S/85,240.03	
1.1.0	Reajustes		
1.1.1	Reajuste reconocido	S/2,389.48	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		S/87,629.51
2.0.0	<u>DESCUENTOS</u>		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	S/0.00	
2.2.0	Amortización del Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	S/0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	DQNC por Adelanto Directo Presupuesto Principal	S/0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales		
2.4.1	DQNC por Adelanto de Materiales Pres. Principal	S/0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		S/0.00
3.0.0	TOTAL NETO (A-B)		S/87,629.51
4.0.0	I.G.V. (18%)		S/15,773.31
5.0.0	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/103,402.82

SON:

Ciento Tres Mil Cuatrocientos Dos con 82/100 Soles.

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02

Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
Supervisor Externo:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO
Jefe de Supervisión:	ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA
Nombre de Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

N° de Contrato de Obra:	N° 002-2020-GR.CAJ-GGR
Fecha de Inicio de Obra:	11/11/2020 - 12/11/2020

Ampliación de Plazo: 0.00

Término Ampliación de Plazo: NO APLICA

Presupuesto Adicional N° 01: S/. 0.00

Deductivo de Obra N° 01: S/. 0.00

MONTOS	NETO	I.G.V.	BRUTO
MONTO TOTAL DE OBRAS CIVILES	S/. 6,159,010.59	S/. 1,108,621.91	S/. 7,267,632.50
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19	S/. 153,975.27	S/. 27,715.55	S/. 181,690.82
TOTAL PRESUPUESTO	S/. 6,312,985.86	S/. 1,108,621.91	S/. 7,449,323.31

N°	VALORIZACIÓN BRUTA	REINTEGRO REAJUSTE PPTT PRINCIPAL	ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO		ADELANTO EN MATERIALES			RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SUB TOTAL	I.G.V.	MONTO NETO A PAGARSE
			ADELANTO	AMORTIZACION	ADELANTO 1	ADELANTO 2	AMORTIZACION				
1.00	S/. 178,189.40	S/. 4,941.95	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 183,131.35	S/. 32,963.64	S/. 216,094.99
OBRA SE SUSPENDE POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA - MEDIANTE ACTA											
2.00	S/. 85,240.03	S/. 2,389.48	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 87,629.51	S/. 15,773.31	S/. 103,402.82
3.00										S/. 0.00	S/. 0.00
4.00										S/. 0.00	S/. 0.00
5.00										S/. 0.00	S/. 0.00
6.00										S/. 0.00	S/. 0.00
7.00										S/. 0.00	S/. 0.00
8.00										S/. 0.00	S/. 0.00
9.00										S/. 0.00	S/. 0.00
10.00										S/. 0.00	S/. 0.00
11.00											
PARCIAL	S/. 263,429.43	S/. 7,331.43	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 270,760.86	S/. 48,736.95	S/. 319,497.81
			SALDO POR AMORTIZAR	S/. 0.00	SALDO POR AMORTIZAR		S/. 0.00				

ADICIONALES:

1.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
2.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
PARCIAL	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

TOTAL GENERAL	S/. 263,429.43	S/. 7,331.43	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 270,760.86	S/. 48,736.95	S/. 319,497.81
---------------	----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------	----------------

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO (%)		AVANCE PROGRAMADO (%)	
ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
2.82%	2.82%	3.36%	3.36%
CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS		CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS	
1.35%	4.17%	3.50%	6.87%
0.00%	4.17%	3.74%	10.61%
0.00%	4.17%	15.65%	26.26%
0.00%	4.17%	20.23%	46.48%
0.00%	4.17%	21.04%	67.52%
0.00%	4.17%	11.88%	79.40%
0.00%	4.17%	6.64%	86.04%
0.00%	4.17%	6.60%	92.63%
0.00%	4.17%	7.37%	100.00%

--	--	--	--

CONTROL DE AMORTIZACIONES (ADELANTO DIRECTO)

Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista:

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisor Externo:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión:

ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

DATOS GENERALES		
DESCRIPCIÓN	MONTO (\$/.)	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO (SIN IGV)	S/6,312,985.86	(C)
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO (CON IGV)	S/7,449,323.31	
MONTO ADELANTO DIRECTO (SIN IGV)	S/0.00	(A)
MONTO ADELANTO DIRECTO (CON IGV)	S/0.00	
FECHA DE DESEMBOLSO	-	
% DE AMORTIZACIÓN	0.00%	
$Aad = \frac{A \times 100}{C}$		
N° CARTA FIANZA	NO APLICA	
VIGENCIA	NO APLICA	

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO						
VALORIZACION BRUTA (SIN IGV)			AMORTIZACION			SALDO
VAL. N°	MES	MONTO (\$/.)	Aad	MONTO (\$/.)	ACUMULADO (\$/.)	MONTO (\$/.)
TOTAL		0.00		0.00		0.00

NOTA.- EL CONSTRATISTA NO HA RECIBIDO ADELANTO DIRECTO.

CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82524 CAJEN - DICIEMBRE 2020

Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	Nº de Contrato de Obra:	Nº 002-2020-GR.CAJ-GGR
Supervisor Externo:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO	Fecha Firma de Contrato:	2/11/2020
Monto del Contrato:	S/. 7,449,323.31 Con IGV	Departamento:	CAJAMARCA
Monto del Adelanto Directo:	S/. 0.00 Sin IGV	Provincia:	CELENDIN
Nombre de Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		
		Distrito:	SUCRE
		Localidad:	CAJEN

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%
01	DEL 11/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 40,621.88	3.39%	S/ 34,891.54	2.91%	S/ 40,621.88	3.39%	S/ 34,891.54	2.91%	S/ 1,163,772.43	97.09%
OBRA SE SUSPENDE POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA - MEDIANTE ACTA											
02	DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020	S/ 78,675.66	6.57%	S/ 21,980.02	1.83%	S/ 119,297.54	9.96%	S/ 56,871.56	4.74%	S/ 1,141,792.41	95.26%
03		S/ 83,920.70	7.00%			S/ 203,218.24					
04		S/ 365,790.45	30.52%			S/ 569,008.70					
05		S/ 262,087.08	21.86%			S/ 831,095.77					
06		S/ 238,772.35	19.92%			S/ 1,069,868.12					
07		S/ 128,795.84	10.74%			S/ 1,198,663.97					
08											

Nota: Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

1	Avance Programado Vigente:	6.57%	S/ 78,675.66
2	Avance Ejecutado en el Mes:	1.83%	S/ 21,980.02
3	Avance Programado Acumulado al Mes:	9.96%	S/ 119,297.54
4	Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	4.74%	S/ 56,871.56

Situación Actual de la Obra:

Normal:	NO
Retrasada:	SI
Adelantada:	NO

CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN - DICIEMBRE 2020

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisor Externo: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Monto del Contrato: S/. 7,449,323.31 Con IGV

Monto del Adelanto Directo: S/. 0.00 Sin IGV

Nombre de Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

N° de Contrato de Obra: N° 002-2020-GR.CAJ-GGR

Fecha Firma de Contrato: 2/11/2020

Departamento: CAJAMARCA

Provincia: CELENDIN

Distrito: SUCRE

Localidad: BELLAVISTA

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%
01	DEL 11/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 50,759.14	3.31%	S/ 44,856.19	2.92%	S/ 50,759.14	3.31%	S/ 44,856.19	2.92%	S/ 1,490,883.05	97.08%
OBRA SE SUSPENDE POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA - MEDIANTE ACTA											
02	DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020	S/ 64,362.14	4.19%	S/ 21,110.92	1.37%	S/ 115,121.28	7.50%	S/ 65,967.11	4.30%	S/ 1,469,772.13	95.70%
03		S/ 68,652.95	4.47%			S/ 183,774.23					
04		S/ 129,691.41	8.44%			S/ 313,465.64					
05		S/ 360,982.16	23.51%			S/ 674,447.80					
06		S/ 421,718.47	27.46%			S/ 1,096,166.27					
07		S/ 207,376.60	13.50%			S/ 1,303,542.87					
08		S/ 165,347.19	10.77%			S/ 1,468,890.06					
09		S/ 66,849.19	4.35%			S/ 1,535,739.24					
10											

Nota: Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

- 1 Avance Programado Vigente: 4.19% S/ 64,362.14
- 2 Avance Ejecutado en el Mes: 1.37% S/ 21,110.92
- 3 Avance Programado Acumulado al Mes: 7.50% S/ 115,121.28
- 4 Avance Ejecutado Acumulado al Mes: 4.30% S/ 65,967.11

Situación Actual de la Obra:

Normal: NO

Retrasada: SI

Adelantada: NO

CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 82422 LA QUINUA - DICIEMBRE 2020

Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	Nº de Contrato de Obra:	Nº 002-2020-GR.CAJ-GGR
Supervisor Externo:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO	Fecha Firma de Contrato:	2/11/2020
Monto del Contrato:	S/. 7,449,323.31 Con IGV	Departamento:	CAJAMARCA
Monto del Adelanto Directo:	S/. 0.00 Sin IGV	Provincia:	CELENDIN
Nombre de Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		
		Distrito:	OXAMARCA
		Localidad:	LA QUINUA

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%	VALORIZADO (S/.)	%
01	DEL 12/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 68,202.87	3.17%	S/ 59,077.70	2.75%	S/ 68,202.87	3.17%	S/ 59,077.70	2.75%	S/ 2,090,250.81	97.25%
OBRA SE SUSPENDE POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA - MEDIANTE ACTA											
02	DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020	S/ 36,370.82	1.69%	S/ 42,149.09	1.96%	S/ 104,573.69	4.86%	S/ 101,226.79	4.71%	S/ 2,048,101.72	95.29%
03		S/ 38,795.54	1.81%			S/ 143,369.24					
04		S/ 162,084.04	7.54%			S/ 305,453.28					
05		S/ 336,658.54	15.66%			S/ 642,111.82					
06		S/ 461,983.42	21.50%			S/ 1,104,095.24					
07		S/ 132,859.09	6.18%			S/ 1,236,954.33					
08		S/ 97,645.22	4.54%			S/ 1,334,599.55					
09		S/ 349,586.95	16.27%			S/ 1,684,186.50					
10		S/ 465,142.01	21.64%			S/ 2,149,328.51					
11											

Nota: Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

1	Avance Programado Vigente:	1.69%	S/ 36,370.82
2	Avance Ejecutado en el Mes:	1.96%	S/ 42,149.09
3	Avance Programado Acumulado al Mes:	4.86%	S/ 104,573.69
4	Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	4.71%	S/ 101,226.79

Situación Actual de la Obra:

Normal: NO

Retrasada: SI

Adelantada: NO

CONTROL DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DE LA OBRA DE LA I.E No. 821096 PAJONAL - DICIEMBRE 2020

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisor Externo: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Monto del Contrato: S/. 7,449,323.31 Con IGV

Monto del Adelanto Directo: S/. 0.00 Sin IGV

Nombre de Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Nº de Contrato de Obra: N° 002-2020-GR.CAJ-GGR

Fecha Firma de Contrato: 2/11/2020

Departamento: CAJAMARCA

Provincia: CELENDIN

Distrito: OXAMARCA

Localidad: PAJONAL

ÍTEM	MES DE VALORIZACIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
		PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO		EJECUTADO			
		VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%	VALORIZADO (\$/.)	%
01	DEL 12/11/2020 AL 30/11/2020	S/ 52,814.69	3.70%	S/ 39,363.97	2.75%	S/ 52,814.69	3.70%	S/ 39,363.97	2.75%	S/ 1,389,890.17	97.25%
OBRA SE SUSPENDE POR CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA - MEDIANTE ACTA											
02	DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020	S/ 41,820.37	2.93%	S/ -	0.00%	S/ 94,635.06	6.63%	S/ 39,363.97	2.75%	S/ 1,389,890.17	97.25%
03		S/ 44,608.40	3.12%			S/ 139,243.46					
04		S/ 330,379.94	23.12%			S/ 469,623.40					
05		S/ 317,162.56	22.19%			S/ 786,785.96					
06		S/ 205,802.85	14.40%			S/ 992,588.81					
07		S/ 280,770.74	19.64%			S/ 1,273,359.55					
08		S/ 155,894.59	10.90%			S/ 1,429,254.14					
09											

Nota: Analizando los valores descritos en el cuadro precedente, se puede interpretar los siguiente:

1	Avance Programado Vigente:	2.93%	S/ 41,820.37
2	Avance Ejecutado en el Mes:	0.00%	S/ -
3	Avance Programado Acumulado al Mes:	6.63%	S/ 94,635.06
4	Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	2.75%	S/ 39,363.97

Situación Actual de la Obra:

Normal: NO


Retrasada: SI

Adelantada: NO

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA

Obra:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		
Contratista:	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE		
Supervisión Externa:	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO		
	Jefe de Supervisión:		ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

RESUMEN GENERAL DE OBRA

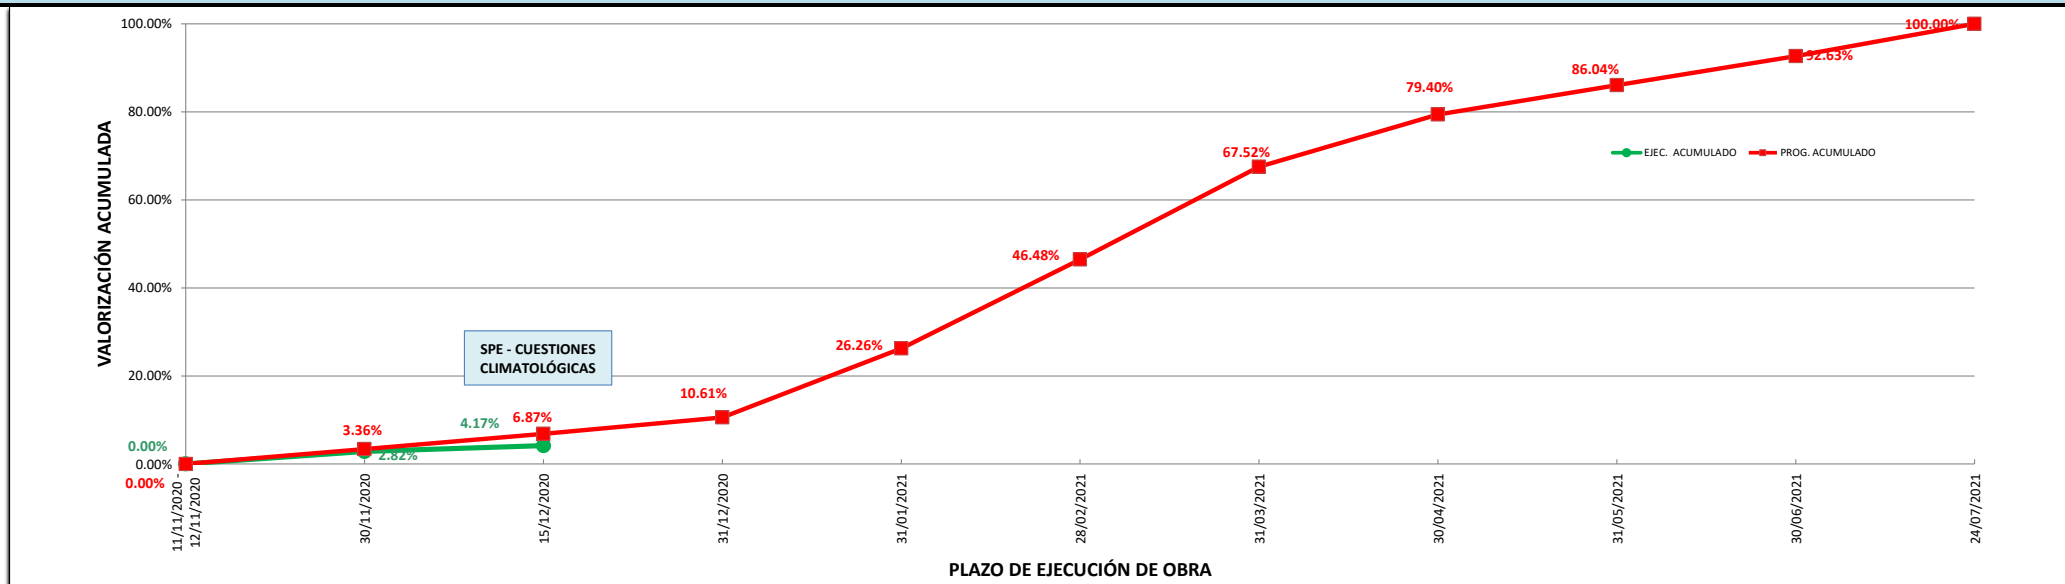

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020 - 12/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	24/07/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 212,398.58	S/ 221,229.00	S/ 235,977.60	S/ 987,945.84	S/ 1,276,890.34	S/ 1,328,277.09	S/ 749,802.27	S/ 418,887.00	S/ 416,436.14	S/ 465,142.01
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 212,398.58	S/ 433,627.57	S/ 669,605.17	S/ 1,657,551.01	S/ 2,934,441.35	S/ 4,262,718.44	S/ 5,012,520.71	S/ 5,431,407.71	S/ 5,847,843.85	S/ 6,312,985.86
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 178,189.40	S/ 85,240.03								
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 178,189.40	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES	3.36%	3.50%	3.74%	15.65%	20.23%	21.04%	11.88%	6.64%	6.60%	7.37%	
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.36%	6.87%	10.61%	26.26%	46.48%	67.52%	79.40%	86.04%	92.63%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES	2.82%	1.35%									
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.82%	4.17%								

NOTA.- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN INICIARON SU PLAZO CONTRATUAL EL 11/11/2020, MIENTRAS QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA QUINUA Y PAJONAL INICIARON EL 12/11/2020.

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

RESUMEN GENERAL DE OBRA

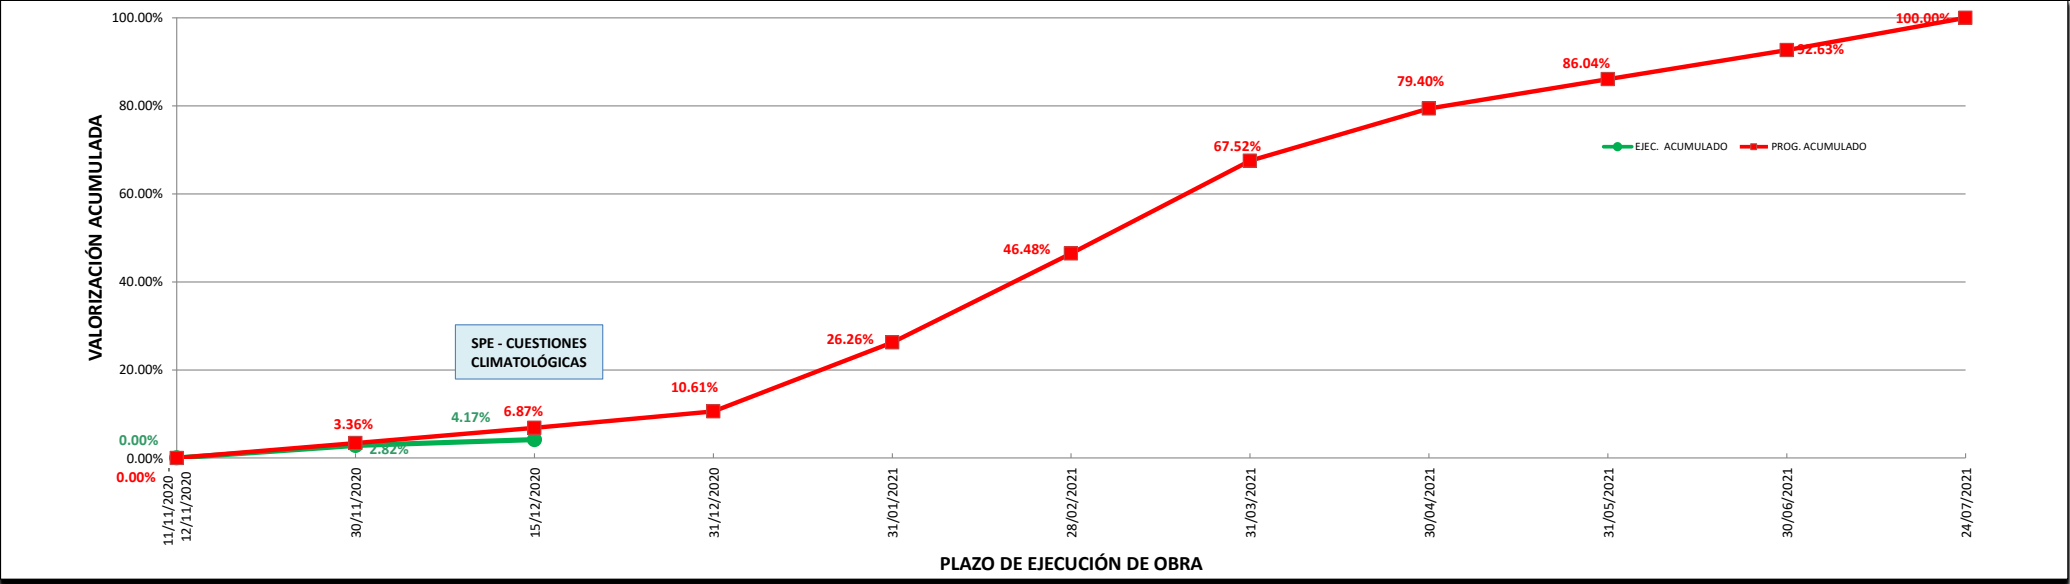

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020 - 12/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	24/07/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 212,398.58	S/ 221,229.00	S/ 235,977.60	S/ 987,945.84	S/ 1,276,890.34	S/ 1,328,277.09	S/ 749,802.27	S/ 418,887.00	S/ 416,436.14	S/ 465,142.01
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 212,398.58	S/ 433,627.57	S/ 669,605.17	S/ 1,657,551.01	S/ 2,934,441.35	S/ 4,262,718.44	S/ 5,012,520.71	S/ 5,431,407.71	S/ 5,847,843.85	S/ 6,312,985.86
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 178,189.40	S/ 85,240.03								
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 178,189.40	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43	S/ 263,429.43

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES	3.36%	3.50%	3.74%	15.65%	20.23%	21.04%	11.88%	6.64%	6.60%	7.37%	
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.36%	6.87%	10.61%	26.26%	46.48%	67.52%	79.40%	86.04%	92.63%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES	2.82%	1.35%									
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.82%	4.17%								

NOTA.- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN INICIARON SU PLAZO CONTRATUAL EL 11/11/2020, MIENTRAS QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA QUINUA Y PAJONAL INICIARON EL 12/11/2020.

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

I.E No. 82524 CAJEN

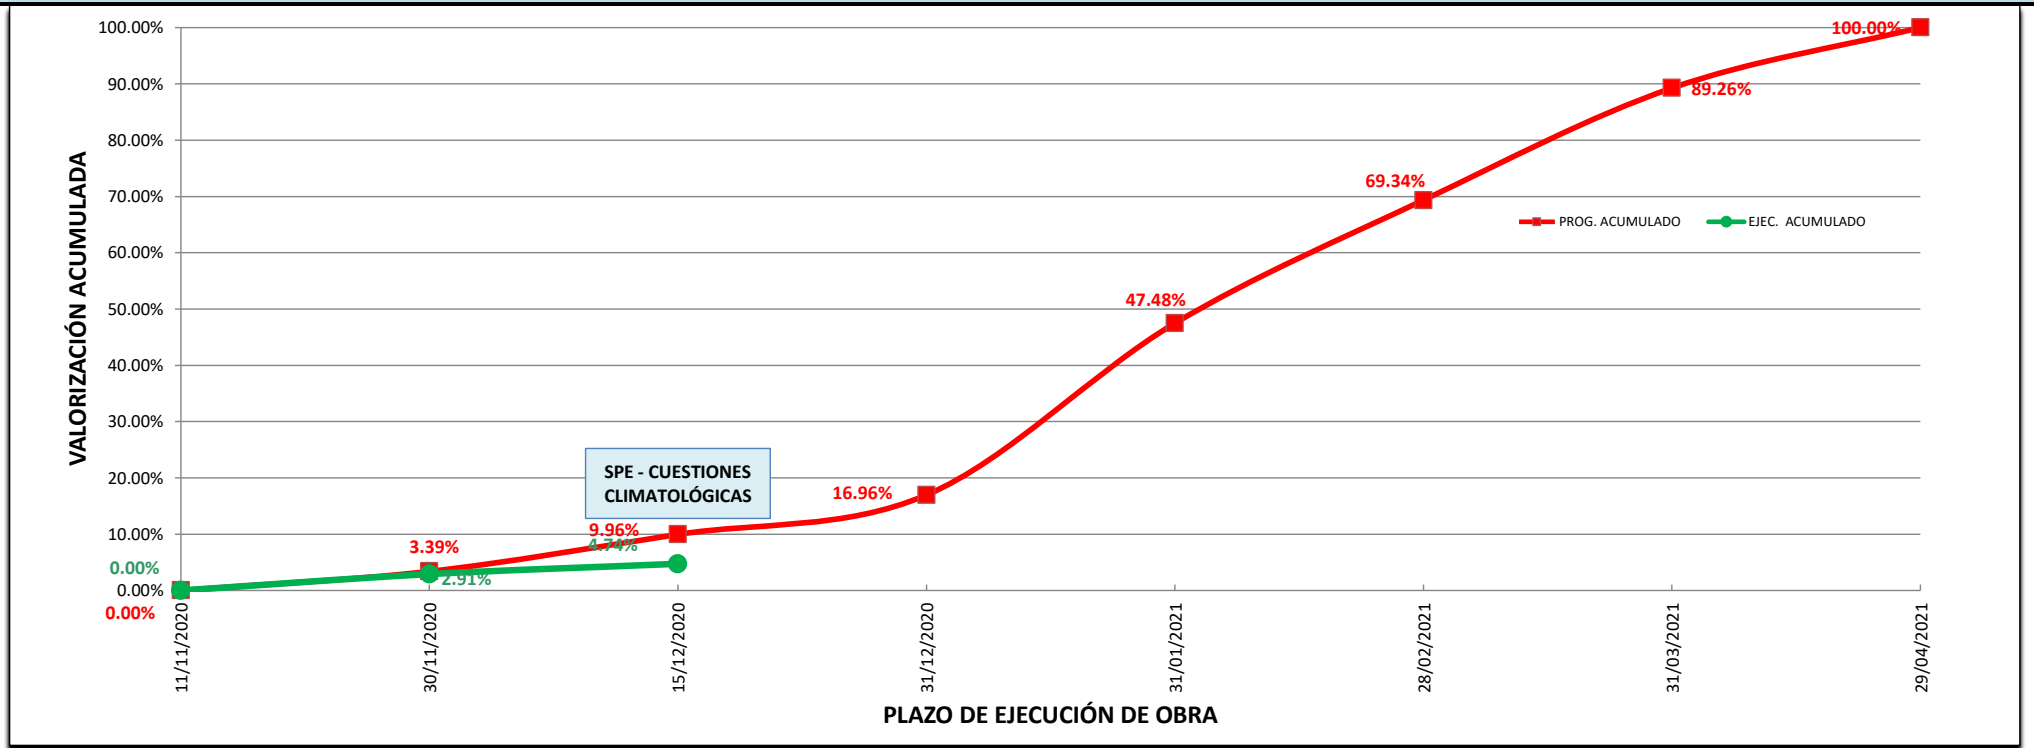

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	29/04/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 40,621.88	S/ 78,675.66	S/ 83,920.70	S/ 365,790.45	S/ 262,087.08	S/ 238,772.35	S/ 128,795.84
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 40,621.88	S/ 119,297.54	S/ 203,218.24	S/ 569,008.70	S/ 831,095.77	S/ 1,069,868.12	S/ 1,198,663.97
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 34,891.54	S/ 21,980.02					
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 34,891.54	S/ 56,871.56	S/ 56,871.56	S/ 56,871.56	S/ 56,871.56	S/ 56,871.56	S/ 56,871.56

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES		3.39%	6.57%	7.00%	30.52%	21.86%	19.92%	10.74%
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.39%	9.96%	16.96%	47.48%	69.34%	89.26%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES		2.91%	1.83%					
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.91%	4.74%					

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN

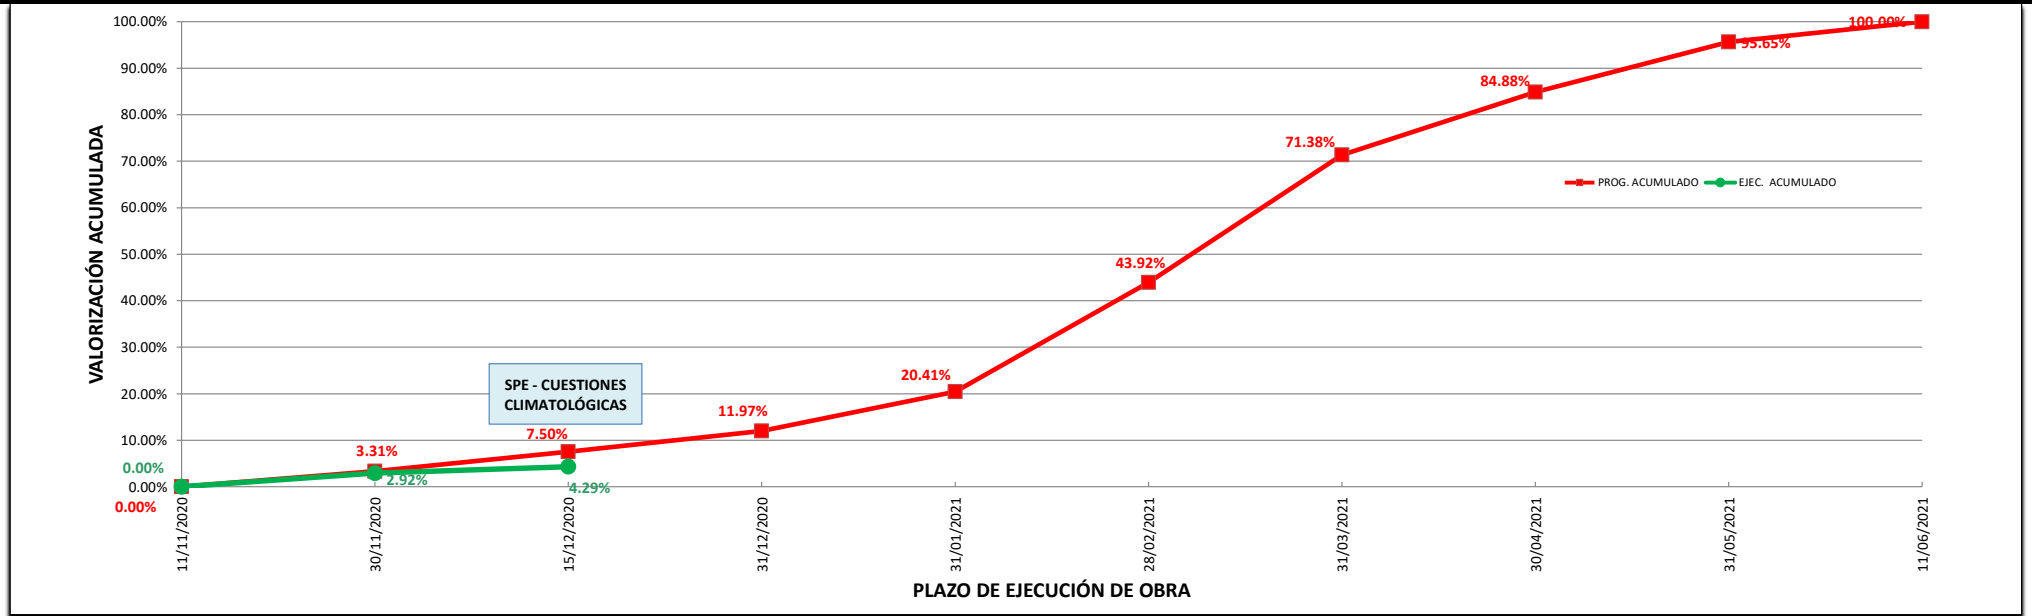

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	11/06/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 50,759.14	S/ 64,362.14	S/ 68,652.95	S/ 129,691.41	S/ 360,982.16	S/ 421,718.47	S/ 207,376.60	S/ 165,347.19	S/ 66,849.19
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 50,759.14	S/ 115,121.28	S/ 183,774.23	S/ 313,465.64	S/ 674,447.80	S/ 1,096,166.27	S/ 1,303,542.87	S/ 1,468,890.06	S/ 1,535,739.24
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 44,856.19	S/ 21,110.92							
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 44,856.19	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11	S/ 65,967.11

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES	3.31%	4.19%	4.47%	8.44%	23.51%	27.46%	13.50%	10.77%	4.35%	
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.31%	7.50%	11.97%	20.41%	43.92%	71.38%	84.88%	95.65%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES	2.92%	1.37%								
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.92%	4.29%							

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO

Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista:

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE


Supervisión Externa:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión:

ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

I.E No. 82422 LA QUINUA

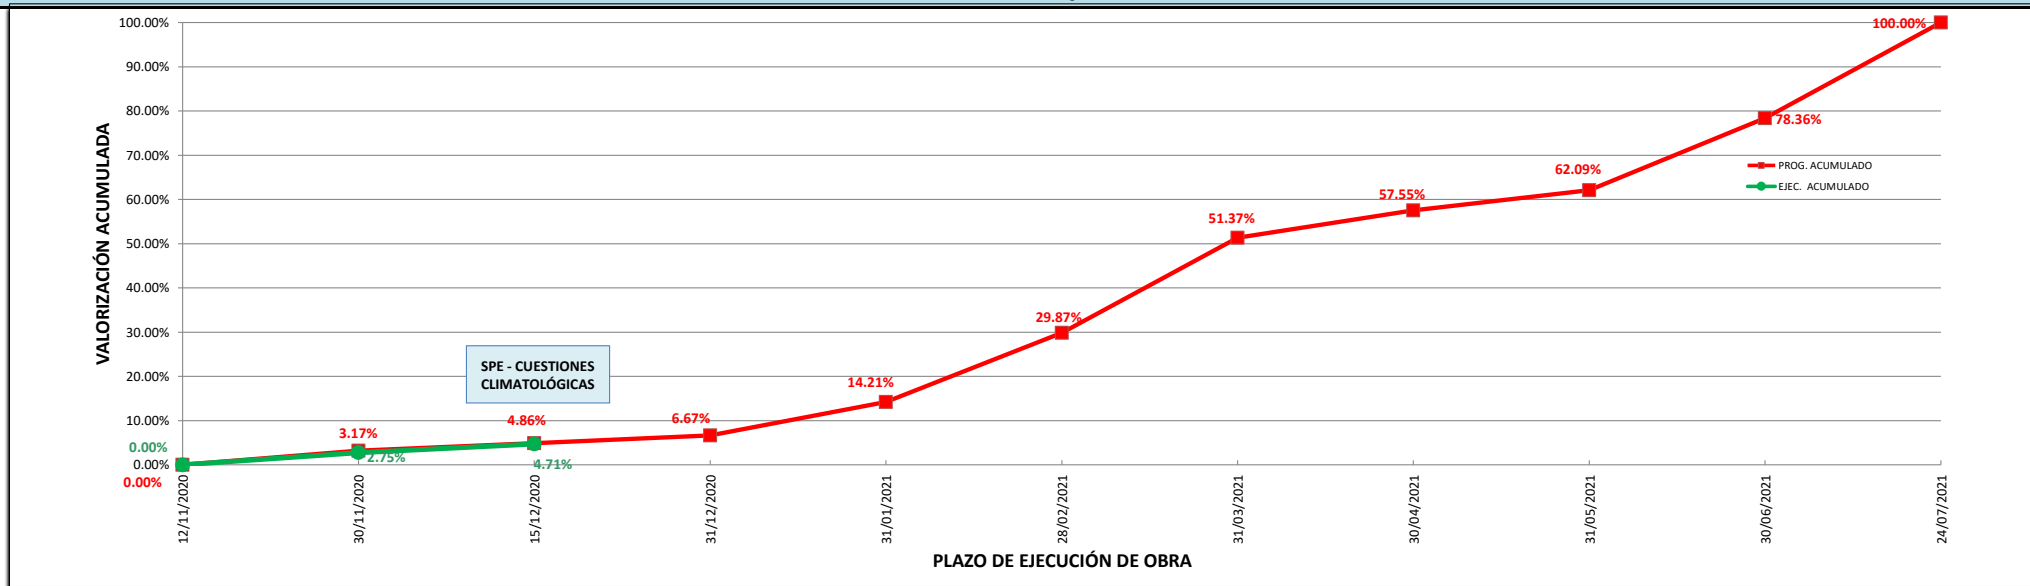

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES
Entrega de Terreno	12/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	24/07/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 68,202.87	S/ 36,370.82	S/ 38,795.54	S/ 162,084.04	S/ 336,658.54	S/ 461,983.42	S/ 132,859.09	S/ 97,645.22	S/ 349,586.95	S/ 465,142.01
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 68,202.87	S/ 104,573.69	S/ 143,369.24	S/ 305,453.28	S/ 642,111.82	S/ 1,104,095.24	S/ 1,236,954.33	S/ 1,334,599.55	S/ 1,684,186.50	S/ 2,149,328.51
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 59,077.70	S/ 42,149.09								
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 59,077.70	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79	S/ 101,226.79

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES	3.17%	1.69%	1.81%	7.54%	15.66%	21.50%	6.18%	4.54%	16.27%	21.64%	
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.17%	4.86%	6.67%	14.21%	29.87%	51.37%	57.55%	62.09%	78.36%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES	2.75%	1.96%									
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.75%	4.71%								

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

I.E No. 821096 PAJONAL

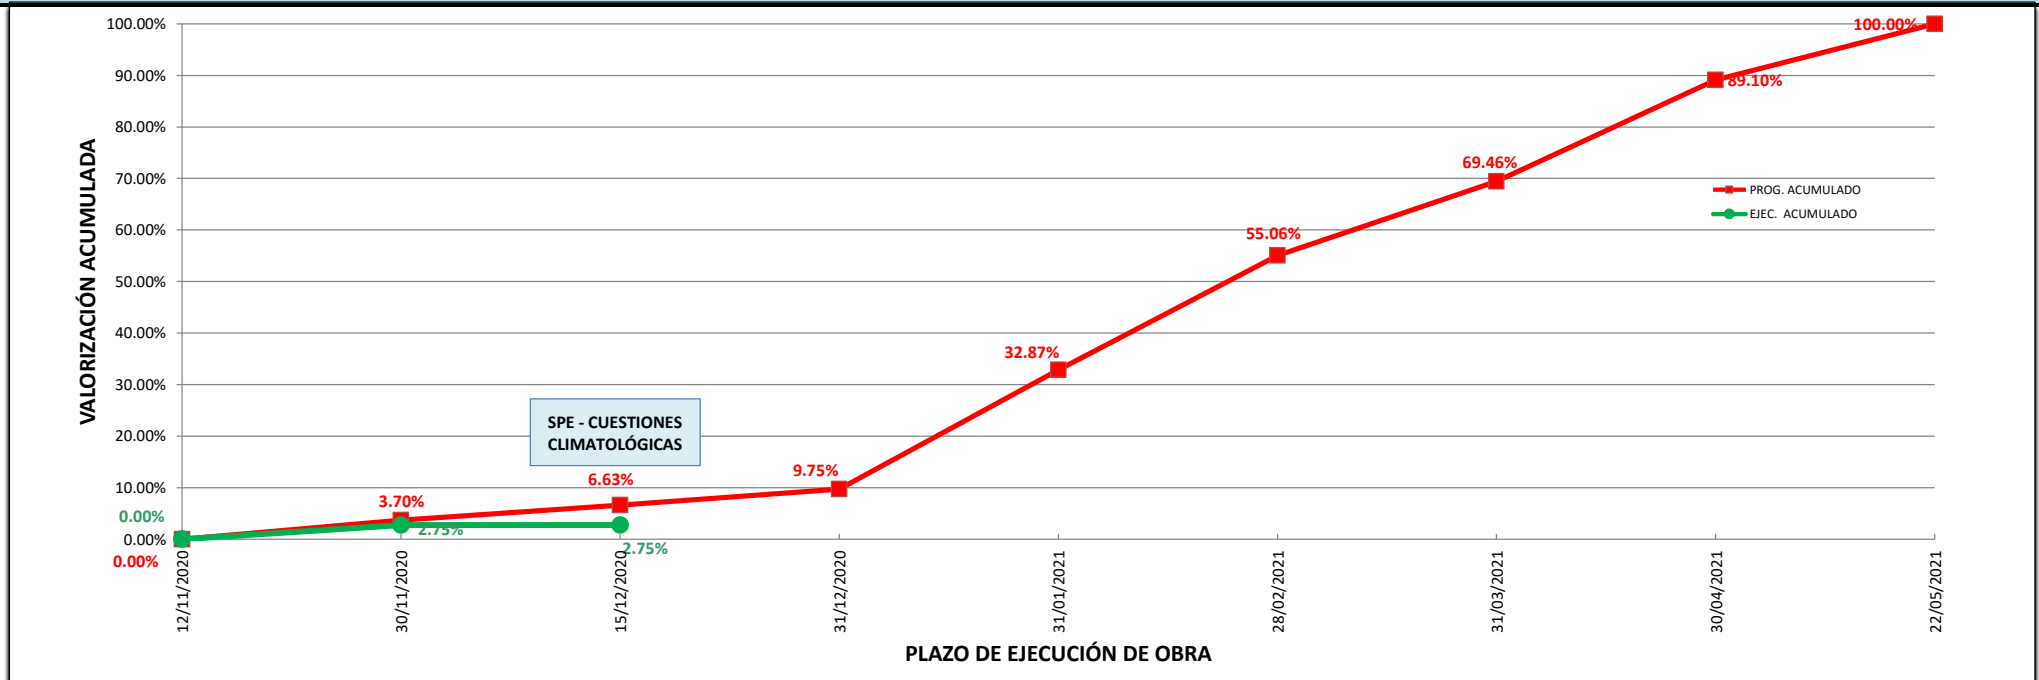

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES I	SEGUNDO MES II	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES
Entrega de Terreno	12/11/2020	30/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	22/05/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	S/ 52,814.69	S/ 41,820.37	S/ 44,608.40	S/ 330,379.94	S/ 317,162.56	S/ 205,802.85	S/ 280,770.74	S/ 155,894.59
PROGRAM. ACUMULADO	0	S/ 52,814.69	S/ 94,635.06	S/ 139,243.46	S/ 469,623.40	S/ 786,785.96	S/ 992,588.81	S/ 1,273,359.55	S/ 1,429,254.14
EJECUTADO MENSUAL	0	S/ 39,363.97	S/ -						
EJECUTADO ACUMULADO	0	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97	S/ 39,363.97

PROGRAMADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%
PROGRAMADO MES	3.70%	2.93%	3.12%	23.12%	22.19%	14.40%	19.64%	10.90%	
PROG. ACUMULADO	0.00%	3.70%	6.63%	9.75%	32.87%	55.06%	69.46%	89.10%	100.00%

EJECUTADO	%	%	%	%	%	%	%	%	%
EJECUTADO MES	2.75%	0.00%							
EJEC. ACUMULADO	0.00%	2.75%	2.75%						
