

Cajamarca, 20 de Enero del 2021

INFORME N° D000042-2021-GRC-SGSL

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **SANDRA MELISSA GUTIERREZ CUBAS**
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : Revisión de Informe Mensual N° 02, de Supervisión de Obra del mes de Diciembre (1/12/2020 al 31/12/2020) de la Obra: "Instalación del Servicio Escolarizado Del Nivel Inicial en las Localidades de la Totorá en el Distrito de Calquis, el Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel - Región Cajamarca".

Referencia : PROVEIDO N° D000255-2021-GRC-SGSL (19Enero2021)

Fecha : Cajamarca, 20 de Enero de 2021

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de referencia, emitido por el Representante Legal de la Empresa Jhon Francis Julca Chacón, supervisor de la obra y proveído a su despacho, se remite el Informe Mensual N° 02, de Supervisión de Obra del mes de diciembre (01/12/2020 al 31/12/2020) de la Obra: "Instalación del Servicio Escolarizado Del Nivel Inicial en las Localidades de la Totorá en el Distrito de Calquis, el Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel - Región Cajamarca".

I. Antecedentes

- Que mediante Carta N° 015- 2021 – C/JFJ de fecha 08 de enero del 2021 la supervisión alcanza su Informe Mensual N°02 a la entidad.
- Que con informe N° D000034-2021-GRC-SGSL de fecha 14.01.2021 se devuelve Informe Mensual N° 02 para levantamiento de Observaciones.
- Que con Carta N°026 – 2021 –C/JFJ de fecha 18 de enero de 2021 se alcanza la Subsanación de Observaciones del informe Mensual N° 02 de la Supervisión , según Informe N°008-2021-AHNL/JSUP de fecha 16.01.2021.

II. Objetivo

Mantener permanentemente informado al Gobierno Regional de Cajamarca sobre el estado de la ejecución de trabajos del presente Proyecto: "Instalación del Servicio Escolarizado Del Nivel Inicial en las Localidades de la Totorá en el Distrito de Calquis, el Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel - Región Cajamarca".

III. Análisis

De la revisión al Informe Mensual N° 02, solo se está revisando únicamente los documentos presentados, que se encuentran en el detalle 5.13 PRODUCTOS O ENTREGABLES – Informe Mensuales de las bases integradas que dio origen a la adjudicación de la buena pro y suscripción del contrato para la Supervisión de la ejecución de obra del indicado proyecto, teniendo las siguientes observaciones:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

1. Se corrobora que las observaciones hechas según N° D000034-2021-GRC-SGSL, han sido subsanadas.
2. Se cumple con los entregables que se el detalle 5.13 PRODUCTOS O ENTREGABLES – Informe Mensuales de las bases integradas que dio origen a la adjudicación de la buena pro y suscripción del contrato para la Supervisión de la ejecución de obra del indicado proyecto.

Se adjunta expediente en físico consistente en dos archivadores de palanca cada uno consistente en 741 folios +2 CDs.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
SANDRA MELISSA GUTIERREZ CUBAS
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

1	Obra	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL
2	Ubicación	
	Departamento	CAJAMARCA
	Provincia	SAN MIGUEL
	Distrito	CALQUIS
	Localidad	LA TOTORA
3	Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
4	Fuente de Financiamiento	Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y P.
5	Tipo de proceso de Selección	LICITACION PUBLICA N° 004-2020-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
6	Sistema de contratacion	A SUMA ALZADA
7	Valor referencial Total	S/. 3,893,864.72
7.1	Valor referencial - IE La Totora	S/. 1,122,067.71
8	Monto del contrato Total, con IGV	S/. 3,436,780.60
8.1	Monto del contrato, con IGV - IE. La Totora	S/. 1,008,496.79
9	Monto del contrato Total, sin IGV	S/. 2,912,525.93
9.1	Monto del contrato, sin IGV - La Totora	S/. 854,658.30
10	Fecha base del Expediente Tecnico	Dic. 2019
11	Plazo de ejecución según Bases de Licitación	
11.1	I.E. La Totora	128 DIAS CALENDARIOS
12	Plazo de ejecución según Contrato	
12.1	I.E. La Totora	128 DIAS CALENDARIOS
13	Número de contrato	004-2020-GRCAJ-GGR.
14	Contratista	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
15	Residente de Obra	ING. VICENTE SANCHEZ LA TORRE
16	Supervisor de Obra	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
17	Fecha de solicitud de Adelanto Directo	
	Adelanto Directo N° 01, con IGV y fecha pago	S/. 0.00
	Fecha de entrega del Adelanto Directo	
18	Fecha de solicitud de Adelanto de Materiales	
	Adelantos para Materiales N° 01, con IGV y fecha	S/. 0.00
	Fecha de entrega del Adelanto de Materiales	
19	Entrega del terreno	
	I.E. La Totora	12/11/2020
20	Inicio contractual del plazo de obra	
	I.E. La Totora	13/11/2020
21	Plazo para comienzo de trabajos programados	
	I.E. La Totora	13/11/2020
22	Término vigente programado de obra	
	I.E. La Totora	20/03/2021
23	Días pendientes de Plazo Contractual	
	I.E. La Totora	80


 Ing. Abraham H. Nuñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 295708


 John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 48814905

17 Fecha de solicitud de Adelanto Directo	
Adelanto Directo N° 01, con IGV y fecha pago	S/. 0.00
Fecha de entrega del Adelanto Directo	
18 Fecha de solicitud de Adelanto de Materiales	
Adelantos para Materiales N° 01, con IGV y fecha	S/. 0.00
Fecha de entrega del Adelanto de Materiales	
19 Entrega del terreno	
I.E. La Totorá	12/11/2020
I.E. Palmito	12/11/2020
I.E. Tallapampa	13/11/2020
20 Inicio contractual del plazo de obra	
I.E. La Totorá	13/11/2020
I.E. Palmito	13/11/2020
I.E. Tallapampa	14/11/2020
21 Plazo para comienzo de trabajos programados	
I.E. La Totorá	13/11/2020
I.E. Palmito	13/11/2020
I.E. Tallapampa	14/11/2020
22 Término vigente programado de obra	
I.E. La Totorá	20/03/2021
I.E. Palmito	27/04/2021
I.E. Tallapampa	27/04/2021
23 Días pendientes de Plazo Contractual	
I.E. La Totorá	80
I.E. Palmito	118
I.E. Tallapampa	118


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205700


 John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
ONI N° 40804305

CURVA "S" FISICO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/04/2021	


MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00	3.96%	3.96%
Val N° 02 - Dic	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24	15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 668,367.30	S/. 1,230,022.54	22.95%	42.23%
Val N° 04 - Febrero	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.36	22.86%	65.09%
Val N° 05 - Marzo	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.03	21.37%	86.46%
Val N° 06 - Abril	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.93	13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.93		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.00	S/. 103,954.00	3.57%	3.57%
Val N° 02 - Dic	S/. 287,073.69	S/. 391,027.69	9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 391,027.69	0.00%	13.43%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 391,027.69	0.00%	13.43%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 391,027.69	0.00%	13.43%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 391,027.69	0.00%	13.43%
TOTAL	S/. 391,027.69		13.43%	13.43%

John Francis Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 39804305

Ing. Abraham H. Nuñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

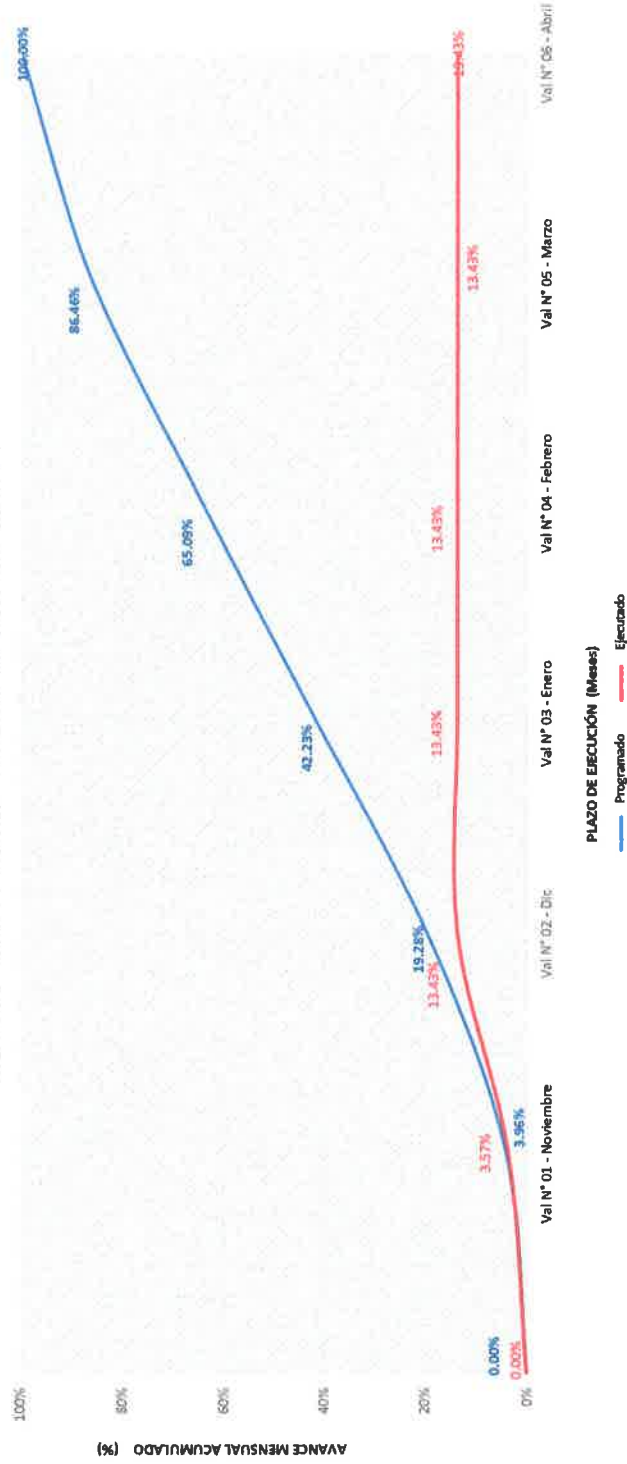


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 48804305


Ing. Abraham H. Núñez Latorcano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	27/04/2021


MES	MONTOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00		3.96%	3.96%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24		15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 668,367.30	S/. 1,230,022.54		22.95%	42.23%
Val N° 04 - Febrero	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.36		22.86%	65.09%
Val N° 05 - Marzo	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.03		21.37%	86.46%
Val N° 06 - Abril	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.93		13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.93			100.00%	

MES	MONTOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.00	S/. 103,954.00		3.57%	3.57%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 287,073.69	S/. 391,027.69		9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 391,027.69		0.00%	13.43%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 391,027.69		0.00%	13.43%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 391,027.69		0.00%	13.43%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 391,027.69		0.00%	13.43%
TOTAL	S/. 391,027.69			13.43%	13.43%


Ing. Abraham H. Muñoz Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205703


John Franco Jara Chacon
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

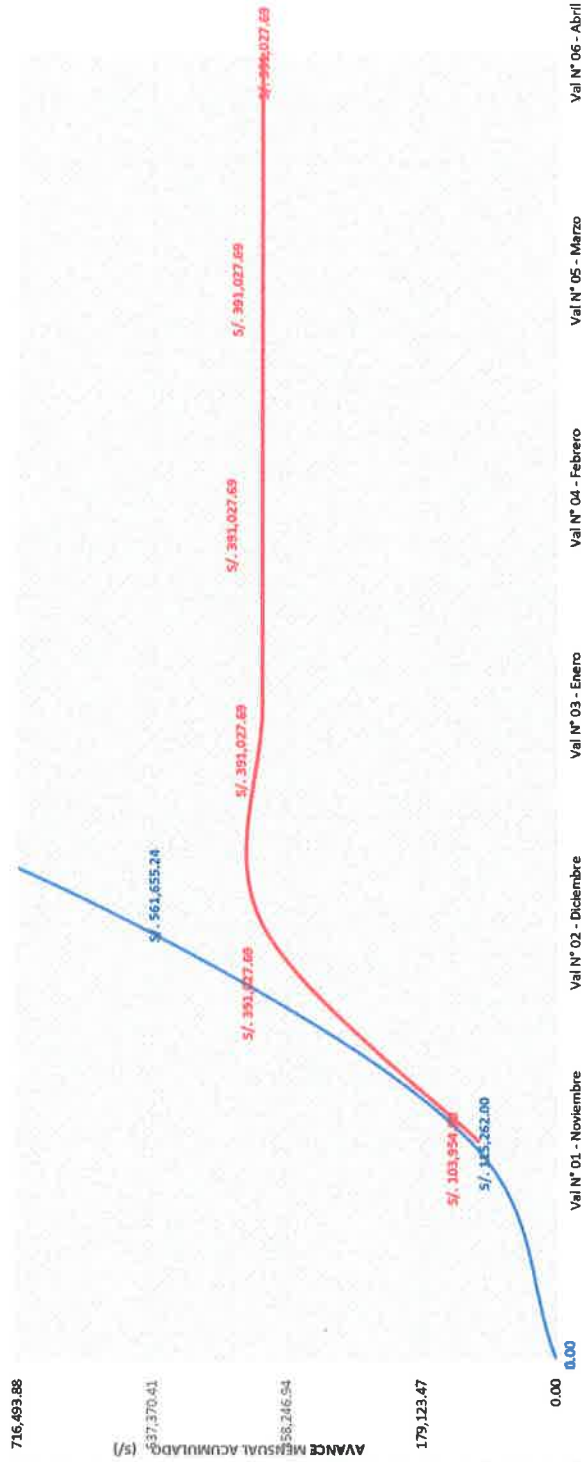

PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)

Programado Ejecutado

Ing. Abraham H. Muñoz Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

John Francis Julia Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305

I.E.I LA TOTORA


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708


CURVA "S" FISICO - I.E.I. LA TOTORA

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	20/03/2021	


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 35,217.94	S/. 35,217.94		4.12%	4.12%
Val N° 02 - Dic	S/. 159,078.37	S/. 194,296.31		18.61%	22.73%
Val N° 03 - Enero	S/. 321,034.46	S/. 515,330.77		37.56%	60.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 126,561.46	S/. 641,892.23		14.81%	75.11%
Val N° 05 - Marzo	S/. 212,766.07	S/. 854,658.30		24.89%	100.00%
TOTAL	S/. 854,658.30			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33		4.03%	4.03%
Val N° 02 - Dic	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57		14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
TOTAL	S/. 162,358.57			19.00%	19.00%


John Francis Jica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 40604305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

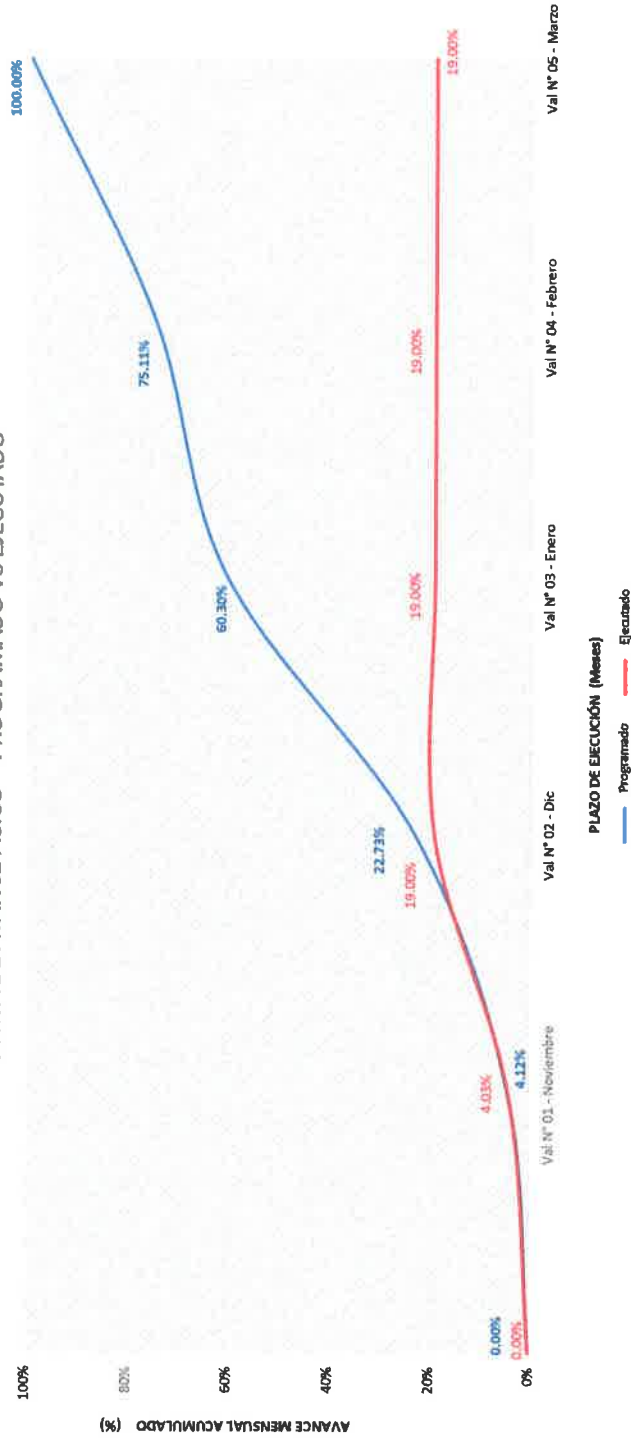

[Signature]
Ing. Abraham H. Núñez-Lauricario
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

[Signature]
John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. La Totora

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	20/03/2021	


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 35,217.94	S/. 35,217.94		4.12%	4.12%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 159,078.37	S/. 194,296.31		18.61%	22.73%
Val N° 03 - Enero	S/. 321,034.46	S/. 515,330.77		37.56%	60.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 126,561.46	S/. 641,892.23		14.81%	75.11%
Val N° 05 - Marzo	S/. 212,766.07	S/. 854,658.30		24.89%	100.00%
TOTAL	S/. 854,658.30			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Diciembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33		4.03%	4.03%
Val N° 02 - Enero	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57		14.97%	19.00%
Val N° 03 - Febrero	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
Val N° 04 - Marzo	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
Val N° 05 - Agosto	S/. 0.00	S/. 162,358.57		0.00%	19.00%
TOTAL	S/. 162,358.57			19.00%	19.00%


 ING. ABRAHAM V. NÚÑEZ LAUREANO
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 JOHN FRANCIS JULCA CHACON
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

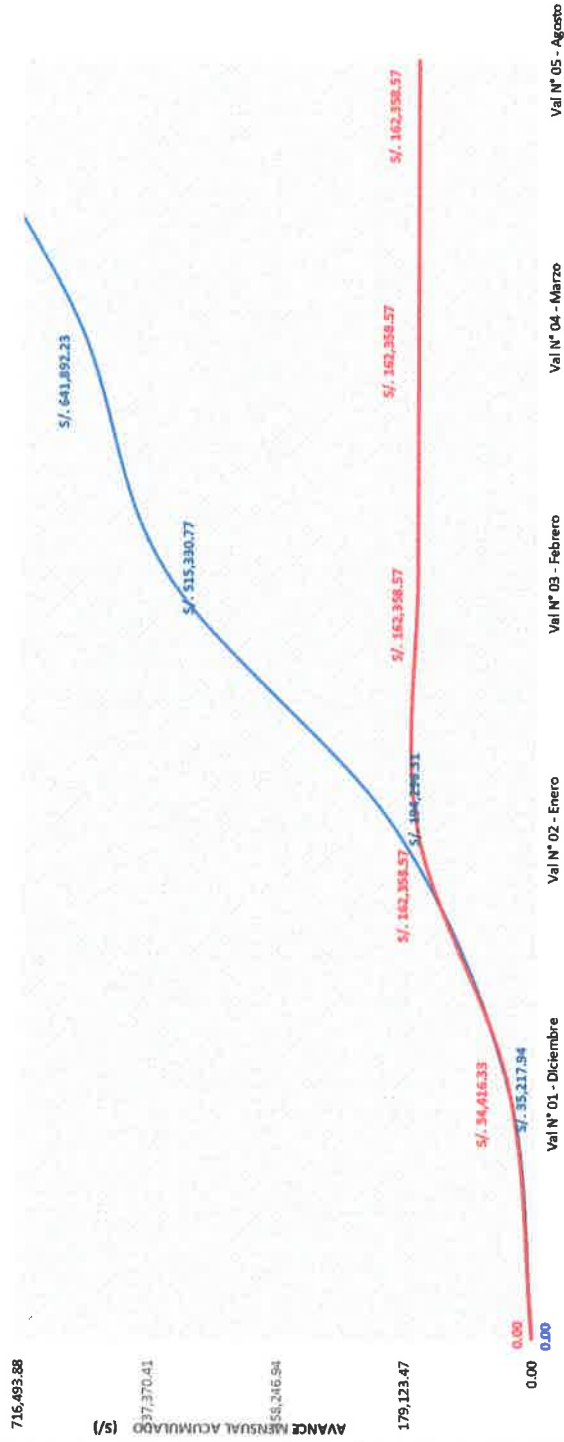

Ing. Abraham H. Vázquez Lauricario
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

I.E.I EL PALMITO



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305



Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FISICO - I.E.I. EL PALMITO

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	27/04/2021


MES	MONTOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	S/.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 40,218.64	S/. 40,218.64		3.53%	3.53%
Val N° 02 - Dic	S/. 167,447.85	S/. 207,666.49		14.72%	18.25%
Val N° 03 - Enero	S/. 130,009.50	S/. 337,675.99		11.43%	29.68%
Val N° 04 - Febrero	S/. 344,626.54	S/. 682,302.52		30.29%	59.97%
Val N° 05 - Marzo	S/. 290,672.60	S/. 972,975.12		25.55%	85.52%
Val N° 06 - Abril	S/. 164,786.69	S/. 1,137,761.81		14.48%	100.00%
TOTAL	S/. 1,137,761.81			100.00%	

MES	MONTOS			PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	S/.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34		3.22%	3.22%
Val N° 02 - Dic	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12		8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
TOTAL	S/. 134,551.12			11.83%	11.83%

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205788

John Francisco Jilca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

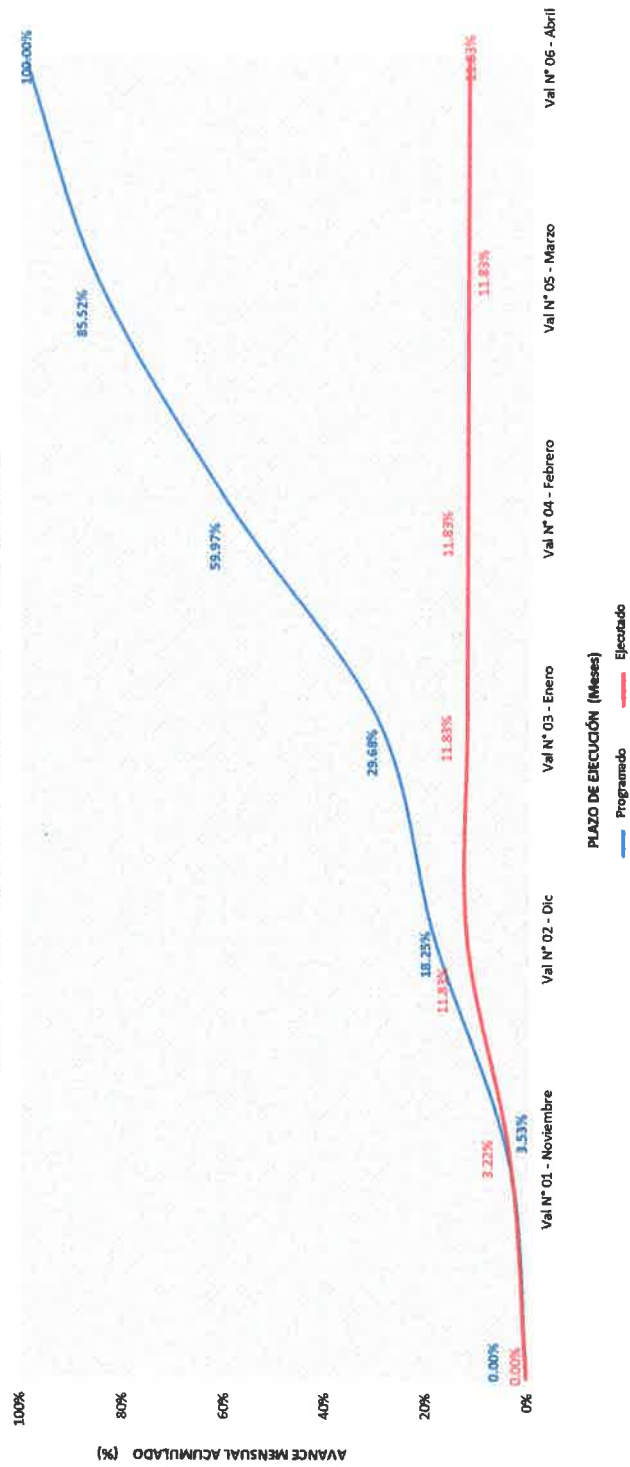

John Francisco Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.N.I. N° 43804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. El Palmito

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	27/04/2021


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 40,218.64	S/. 40,218.64		3.53%	3.53%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 167,447.85	S/. 207,666.49		14.72%	18.25%
Val N° 03 - Enero	S/. 130,009.50	S/. 337,675.99		11.43%	29.68%
Val N° 04 - Febrero	S/. 344,626.54	S/. 682,302.52		30.29%	59.97%
Val N° 05 - Marzo	S/. 290,672.60	S/. 972,975.12		25.55%	85.52%
Val N° 06 - Abril	S/. 164,786.69	S/. 1,137,761.81		14.48%	100.00%
TOTAL	S/. 1,137,761.81			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34		3.22%	3.22%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12		8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 134,551.12		0.00%	11.83%
TOTAL	S/. 134,551.12			11.83%	11.83%


 Abraham H. Nuñez Laureano
 - SE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Jilca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40604305

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

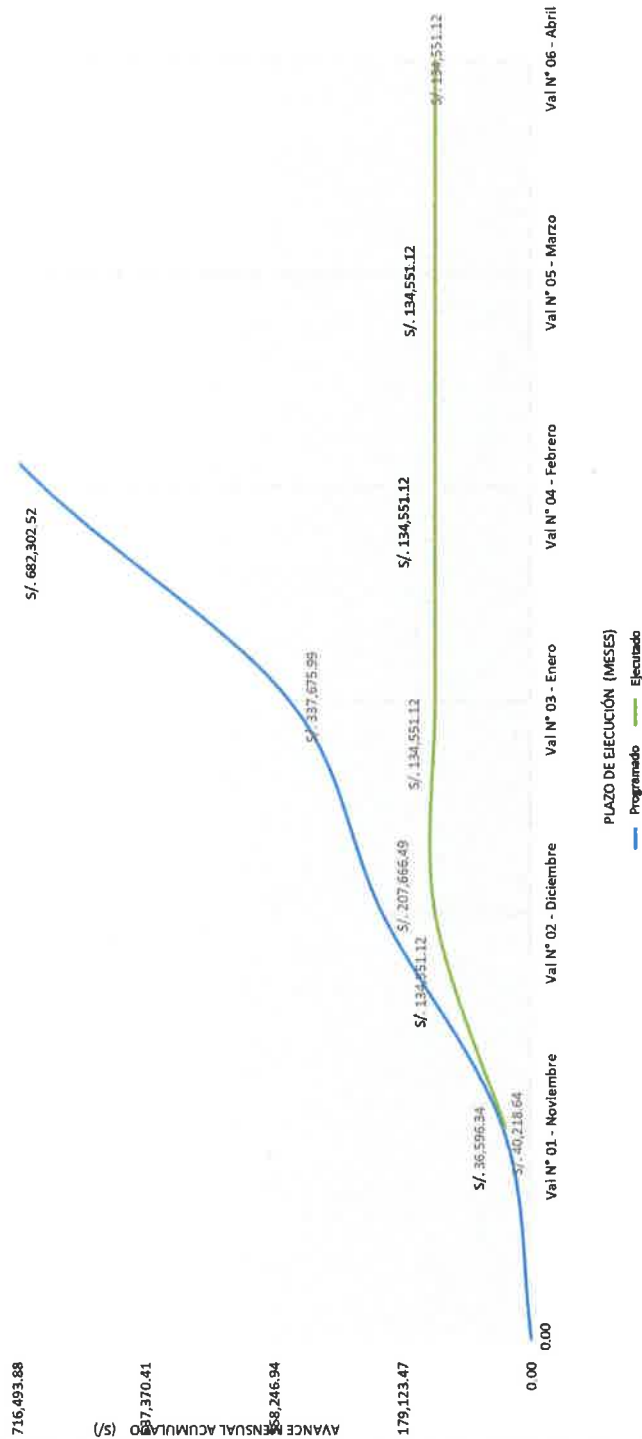

[Signature]
John Francis Jolca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

[Signature]
Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

I.E.I TALLAPAMPA


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FISICO - I.E.I. TALLAPAMPA

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	14/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/04/2021	

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	ACUMUL. %	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 39,825.42	S/. 39,825.42	4.33%	4.33%	4.33%
Val N° 02 - Dic	S/. 119,867.02	S/. 159,692.44	17.36%	13.03%	17.36%
Val N° 03 - Enero	S/. 217,323.34	S/. 377,015.78	40.98%	23.62%	40.98%
Val N° 04 - Febrero	S/. 194,664.83	S/. 571,680.61	62.13%	21.16%	62.13%
Val N° 05 - Marzo	S/. 118,981.00	S/. 690,661.61	75.06%	12.93%	75.06%
Val N° 06 - Abril	S/. 229,444.21	S/. 920,105.82	100.00%	24.94%	100.00%
TOTAL	S/. 920,105.82			100.00%	


MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	ACUMUL. %	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Dic	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 94,118.00	0.00%	0.00%	10.23%
Val N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 94,118.00	0.00%	0.00%	10.23%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 94,118.00	0.00%	0.00%	10.23%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 94,118.00	0.00%	0.00%	10.23%
TOTAL	S/. 94,118.00			10.23%	10.23%


Juan Francisco Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 40804305


Ing. Abraham H. Nuñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

2024

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

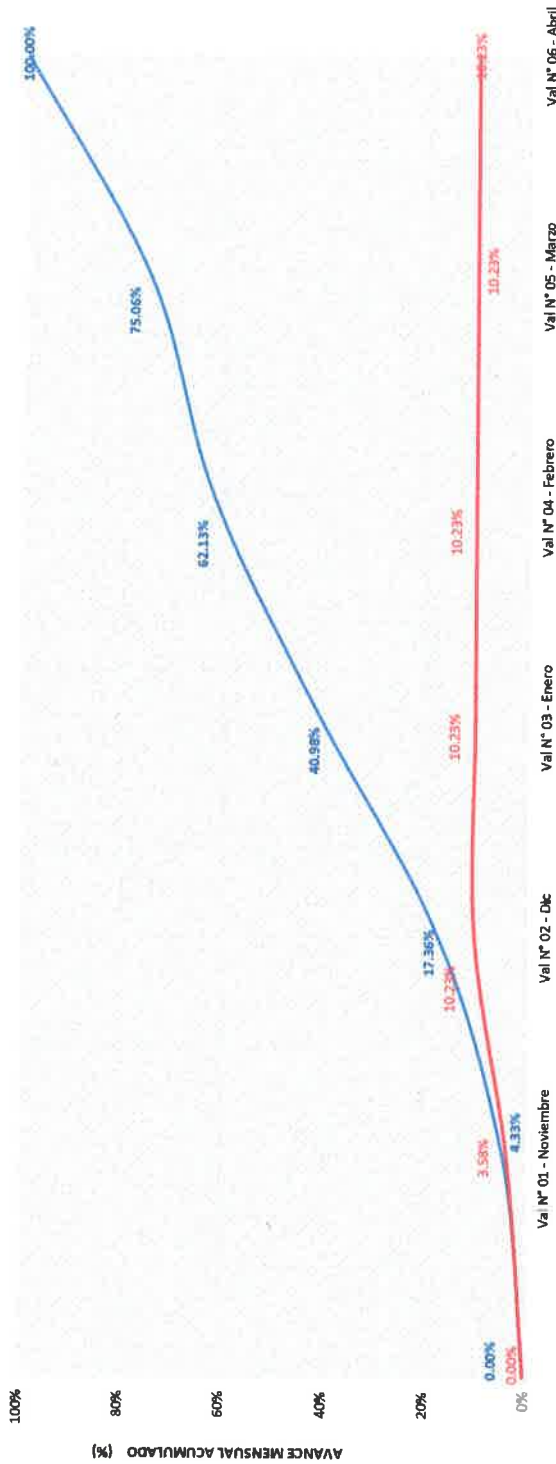


John Francis Juica Chacon
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 48804305


Ing. Abraham H. Navez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. TALLAPAMPA

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	14/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/04/2021	


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Vai N° 01 - Noviembre	S/. 39,825.42	S/. 39,825.42		4.33%	4.33%
Vai N° 02 - Diciembre	S/. 119,867.02	S/. 159,692.44		13.03%	17.36%
Vai N° 03 - Enero	S/. 217,323.34	S/. 377,015.78		23.62%	40.98%
Vai N° 04 - Febrero	S/. 194,664.83	S/. 571,680.61		21.16%	62.13%
Vai N° 05 - Marzo	S/. 118,981.00	S/. 690,661.61		12.93%	75.06%
Vai N° 06 - Abril	S/. 229,444.21	S/. 920,105.82		24.94%	100.00%
TOTAL	S/. 920,105.82			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Vai N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33		3.58%	3.58%
Vai N° 02 - Diciembre	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00		6.65%	10.23%
Vai N° 03 - Enero	S/. 0.00	S/. 94,118.00		0.00%	10.23%
Vai N° 04 - Febrero	S/. 0.00	S/. 94,118.00		0.00%	10.23%
Vai N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 94,118.00		0.00%	10.23%
Vai N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 94,118.00		0.00%	10.23%
TOTAL	S/. 94,118.00			10.23%	10.23%


John Francis Julica Chacon
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

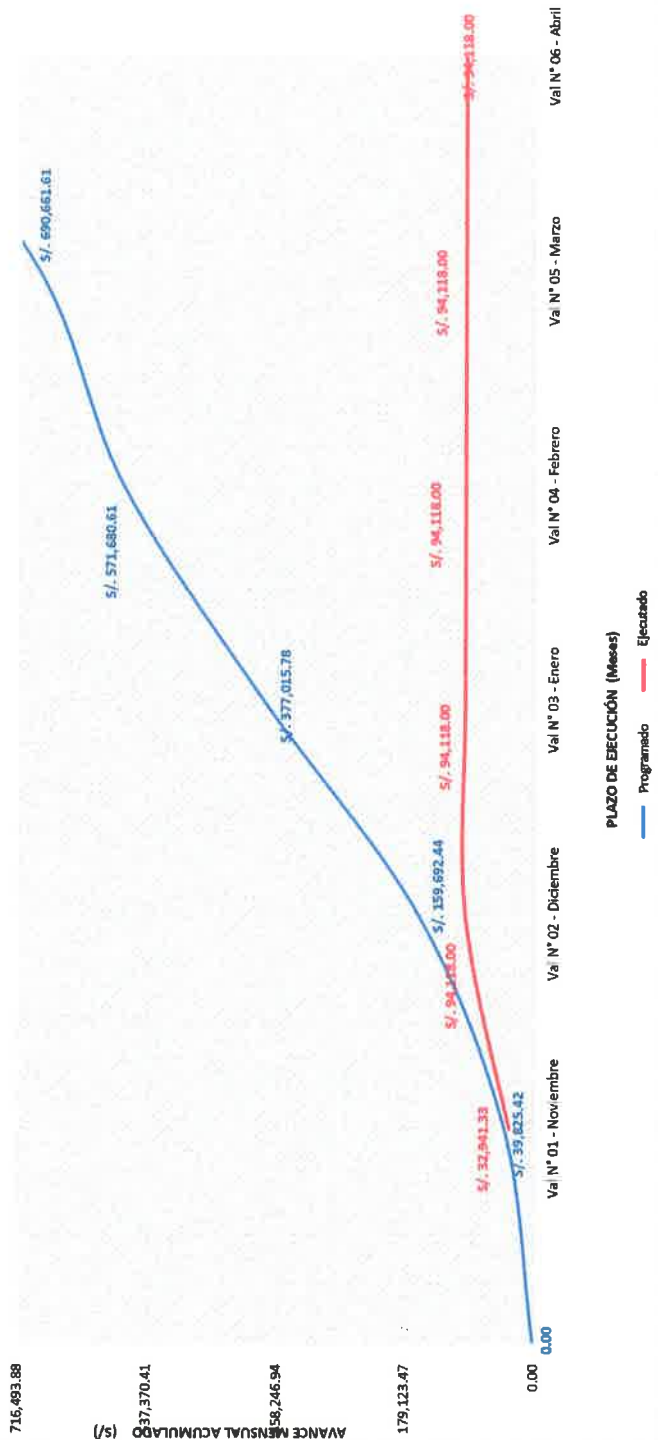

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 265708

John Francis Jilica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305
