



Cajamarca, 15 de Marzo del 2021

INFORME N° D000060-2021-GRC-SGSL-RCD

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE**
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : **ALCANZO INFORME DEL ESTADO INSTITUCIONAL DE LA OBRA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL – DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA" PARA ARCHIVO..**

Referencia : **PROVEIDO N° D000982-2021-GRC-SGSL (08Marzo2021)**

Fecha : **Cajamarca, 15 de Marzo de 2021**

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial y al mismo tiempo alcanzarle el informe mensual del supervisor de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN – DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL – DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA" luego de la revisión respectiva, donde se pudo observar que se encuentra conforme al contrato de supervisión de la obra en referencia, para que pue pueda ser archivado.

Así mismo se informa que la fecha máxima que tuvo el supervisor para ingresar este informe a la ENTIDAD fue el día 05/03/2021, sin embargo se ha ingresado el día 08/03/2021, por lo que se tendrá en cuenta para penalizar al supervisor, según lo estipulado en su contrato.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ROSA BEATRIZ CUBAS DE LA TORRE
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJÉN Y BELLAVISTA DE CAJÉN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA".

Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP° 54579, OSCE C6133

Cajamarca, 05 de marzo de 2021

CARTA N° 010 - 2021-C6133-AQA

Señores : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

Atención : Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Asunto : **PRESENTO INFORME DE SUPERVISIÓN - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 03, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11/02/2021 AL 28/02/2021.**

Referencia : a.- SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN- DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL- DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA"
b.- Contrato N° 006-2020-GR-CAJ-GGR

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi calidad de Supervisor de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN- DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL- DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA", con la finalidad de remitirle el Informe de Supervisión - Valorización de Obra N° 03, correspondiente al período 11/02/2021 al 28/02/2021.

ADJUNTO:

- 03 Archivadores (02 Originales + 1 CD + 01 Copia) – Correspondiente a la Supervisión.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO
CIP 54579
Supervisor de Obra

GRC GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	SGD EXPEDIENTE 2021-3885
08 MAR, 2021	
8:12 RECIBIDO	143AP +1cd F05105
TRAMITE DOCUMENTARIO	

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES	
PASE A:	Ing. Lord Pompeo Azañedo Alcántara
PARA:	Revisión Evolución e Informe
10 MAR 2021	
C.C. Archivo	

Ing° ALFREDO QUISPE ALFARO – CONSULTOR DE OBRA
RUC N° 10282269282

Av. Mariano cornejo N° 1447 – Urb. San Bernardo, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento Lima y
Av. Casuarinas N° 445, Urb. Jardín, distrito de Andrés Bello Cáceres, provincia de Huamanga - Ayacucho.
Teléfono CEL. N° 999016410

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
REG. 158
FECHA 08 MAR 2021
HORA 11:30

INFORME MENSUAL N° 03

Periodo del: 11/02/2021 al 28/02/2021

I. GENERALIDADES

Obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGIÓN CAJAMARCA"		
Localidades	CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN	Localidades	LA QUINUA Y EL PAJONAL
Distrito	SUCRE	Distrito	OXAMARCA
Provincia	CELENDIN		
Departamento	CAJAMARCA		
Región	CAJAMARCA		

A. DATOS GENERALES

1 Modalidad de Ejecución	POR CONTRATA	
2 Sistema de Contratación	SUMA ALZADA	
3 Monto del Valor Referencial:	S/ 8,277,025.89	Incluido IGV
4 Monto del Valor Contratado:	S/ 7,449,323.31	Incluido IGV
5 Contratista de Obra (ejecutor):	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
6 Domicilio Legal del Contratista	Jr. Pedro Novoa Rojas N°578, del distrito, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.	
7 Monto del Contrato de Obra:	S/ 7,449,323.31	Incluido IGV
Monto Adelanto Directo al Contratista:		
Fecha de pago del Adelanto Directo		
8 Plazo de Ejecución:		
- I.E No. 82524 CAJEN	170	Días Calendarios
- I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	213	Días Calendarios
- I.E No. 82422 LA QUINUA	255	Días Calendarios
- I.E No. 821096 PAJONAL	192	Días Calendarios
Fecha de Inicio de Obra:		
- I.E No. 82524 CAJEN	11/11/2020	
- I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	11/11/2020	
- I.E No. 82422 LA QUINUA	12/11/2020	
- I.E No. 821096 PAJONAL	12/11/2020	
Fecha de Término Contractual:		
- I.E No. 82524 CAJEN	29/04/2021	
- I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	11/06/2021	
- I.E No. 82422 LA QUINUA	24/07/2021	
- I.E No. 821096 PAJONAL	22/05/2021	
9 Suspensión N°01 del Plazo de Ejecución		
Inicio	15/12/2020	Cuestiones climatológicas de la zona
Fin	10/02/2021	
Reinicio de obra 1		
Reinicio de Obra	11/02/2021	
Vencimiento 1		
- I.E No. 82524 CAJEN	25/06/2021	
- I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	7/08/2021	


JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

- I.E No. 82422 LA QUINUA

19/19/2021

- I.E No. 821096 PAJONAL

18/07/2021

10 Fecha de Suscripción de Contrato Obra:

2/11/2020

11 Contrato de Obra:

N° 002-2020-GR.CAJ-GGR

12 Fecha de Entrega de Terreno:

- I.E No. 82524 CAJEN

10/11/2020

- I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN

10/11/2020

- I.E No. 82422 LA QUINUA

11/11/2020

- I.E No. 821096 PAJONAL

11/11/2020

13 Monto de los Desembolsos

NO APLICA

14 Fecha de Rendiciones de Cuentas

NO APLICA

15 Supervisor de Obra:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión

ING. JOE I. TRUJILLO PARRAGA

Contrato de Supervisión de Obra N°

006-2020-GR.CAJ-GGR

Fecha de Suscripción:

27/10/2020

Monto del Contrato de Supervisión:

S/. 349,728.75

Incluido IGV

16 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N°

C.F. N° 1021001 - 2020 /FG/CAJAMARCA

Monto:

S/. 744,932.33

Incluido IGV

Entidad:

FOGAPI

Vigencia:

18/07/2021

17 Carta Fianza de Adelanto Directo N°

Monto:

Incluido IGV

Entidad:

Vigencia:

18 Carta Fianza de Ad. de Materiales 01

Monto:

Incluido IGV

Entidad:

Vigencia:

19 Ampliaciones de Plazo:

R.D. N°

NO APLICA

Fecha:

NO APLICA

N° de Días

0.00

Desde:

NO APLICA

Hasta:

NO APLICA

Causal:

Falta formalizar la ampliación de plazo N°01, que se originó por estacionalidad climatológica, el cual esta aprobado mediante Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución de obra N°01. el mismo que se contabiliza desde el día 16 de diciembre del 2020 hasta el día 10 de febrero del 2021, que hacen un total de 57 días calendario.

20 Adicionales de Obra:

Adicional de Obra N° 01:

R.D. N°

NO APLICA

Fecha:

NO APLICA

Monto (Con IGV):

S/. 0.00

Incidencia Acumulada:

0.00%

Causal:

No existe ningún trámite o causal para adicionales de obra.

Joe Isaac Trujillo Parraga
JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650

Alfredo Quispe Alfaro
Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

21 Deductivo de Obra:

R.D. N°

NO APLICA

Fecha:

NO APLICA

Monto (Con IGV):

S/ 0.00

Incidencia Acumulada:

0.00%

Causal:

No existe ningún trámite o causal para deductivos de obra.

B. DESARROLLO DE LA OBRA**1 Proceso Constructivo y Labores de Supervisión****ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- El día 11 de febrero del 2021 en cumplimiento a la carta múltiple N°D000017 - 2021-GRC - SGSJ, el Jefe de Supervisión en compañía de los Ingenieros asistentes de supervisión, realizó el viaje a las Localidades de Cajén, Bellavista de Cajén, Pajonal y la Quinua, con fines de verificar la situación actual de la obra y las condiciones climáticas. En la localidad de Quinua y en la localidad de Cajén esta verificación se realizó en compañía de autoridades locales. Observándose que las condiciones climáticas son favorables para realizar los trabajos y la existencia de materiales y equipos en cada I.E. la supervisión da por reiniciado la ejecución de la obra a partir del día 11 de febrero del 2021, realizándose la anotación respectiva del Acta de reinicio en el cuaderno de obra que ha sido proporcionado por el Ingeniero Edgar Villanueva Rodríguez con CIP N° 174354, profesional adscrito al Consorcio Virgen de Guadalupe.
- Con carta N° 02 - 2021 - JIIP /JS, de fecha 12 de febrero del 2021, se comunica al representante Legal del Consorcio Virgen de Guadalupe el reinicio de obra a partir del día 11 de febrero 2021.
- El día viernes 12 de febrero del 2021, el contratista movilizó su personal profesional, técnico y equipos a cada I.E., así mismo procedió a regularizar el Acta de reinicio el Ingeniero Residente de obra.

La obra inicia con el plazo contractual los días 11 y 12 de Noviembre del 2020.

Se tiene avance ejecutado en el mes del **5.05%** y un acumulado de **9.22%**.**Actividades Ambientales y Asuntos más Resaltantes:**

Se coordina con el Ing. Residente de Obra y el Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, antes del inicio de labores, para la implementación del Plan de Seguridad y Salud (Equipos de protección personal), señalización temporal de Seguridad (cintas y letreros), capacitación temporal de Seguridad y Salud (charlas lectivas de inducción y de capacitación), recursos para respuestas ante emergencias en Seguridad y Salud durante el trabajo, implementación del Plan COVID-19.

2 Cuaderno de Obra

Los asientos del Cuaderno de Obra, se adjuntan en cada informe mensual.

3 Pruebas, Controles y Analisis

En el mes evaluado se realizó ensayos de a COMPRESION UNIAXIAL, cuyos resultados se adjunta en el anexo correspondiente.

4 Situación del Proyecto:

Discrepancias :

No

Alternativas:

No Aplica

Soluciones:

No Aplica


JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650

5 Modificación del Proyecto

No se manifiestan ningún tipo de observación que implique la modificación parcial o total del proyecto.

6 Controversias: Planteamiento de las Partes

No se registran controversias por ninguna de las partes interesadas en el proyecto.


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

II. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

A. DESCRIPCIÓN

Las actividades ejecutadas corresponden a:

Desde el 11 de Febrero a la fecha (Período valorizado), se ha realizado trabajos en:

1. I.E No. 82524 CAJEN:

- Excavación de zanjas para cimentación
- Mejoramiento con material de préstamo afirmado
- Escarificado y compactación de fondo de cimentación
- Eliminación de material excedente con carretilla
- Solado E= 4" mezcla 1:8 en zapatas
- Concreto Ciclopeo F'c= 140 kg./cm² + 30% P.G en cimentación
- Concreto F'C=210 KG./CM² en zapatas
- Acero f'y=4200kg./cm² en viga de cimentación
- Acero f'y=4200kg./cm² en sobrecimiento reforzado
- Acero f'y=4200kg./cm² en columnetas.
- Acero f'y=4200kg./cm² en columnas

2. I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN:

- Excavación de zanjas para cimentación
- Mejoramiento con material de préstamo afirmado
- Refine, nivelación y apisonado
- Escarificado y compactación de fondo de cimentación
- Solado E= 4" mezcla 1:8 en zapatas
- Concreto Ciclopeo F'c= 140 kg./cm² + 30% P.G en cimentación
- Concreto F'C=210 KG./CM² en zapatas
- Acero f'y=4200kg./cm² en viga de cimentación
- Acero f'y=4200kg./cm² en sobrecimiento reforzado
- Acero f'y=4200kg./cm² en columnetas.
- Acero f'y=4200kg./cm² en columnas

3. I.E No. 82422 LA QUINUA:

- Obras Provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud:
- Seguridad y Salud: equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud.
- Estructuras:
- Movimiento de tierras: excavación manual (explanaciones), excavación de zanjas para cimentación, relleno con material propio, mejoramiento con material de préstamo afirmado, escarificado y compactación de fondo de cimentación, acarreo interno material excedente (a mano usando carretilla), eliminación de material excedente con carretilla.
- Obras de concreto simple: solado en zapatas, concreto ciclópeo para cimientos.
- Obras de concreto armado: concreto en zapatas, acero en zapatas, concreto, encofrado y acero en vigas de cimentación, concreto, encofrado y acero en sobrecimiento reforzado, acero en columnetas, acero en columnas.
- Muros de contención:
- Movimiento de tierras: excavación de zanjas para cimentación, eliminación de material excedente manual.
- Losa deportiva:
- Movimiento de tierras: excavación manual, eliminación de material excedente.
- Flete terrestre: flete terrestre.

4. I.E No. 821096 PAJONAL

- Obras Provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud:
- Seguridad y Salud: equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud.
- Estructuras:
- Movimiento de tierras: excavación manual (explanaciones), excavación de zanjas para cimentación, relleno con material propio, mejoramiento con material de préstamo afirmado, escarificado y compactación de fondo de cimentación, eliminación de material excedente con carretilla.
- Obras de concreto simple: solado en zapatas, concreto ciclópeo para cimientos.
- Obras de concreto armado: concreto en zapatas, acero en zapatas, acero en columnas, acero en muros de corte.
- Flete terrestre: flete terrestre, flete rural.


JOEL ISAAC MUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

B. CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

El resumen valorizado de las partidas que se ejecutaron, son los siguientes:

El Avance en el presente mes es como sigue:

	CD	GG	UTILIDAD	IGV
1.- I.E No. 82524 CAJEN	42,309.86	2,523.99	634.65	8,868.45

2.-	I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	45,487.53	2,713.56	682.31	9,810.35
3.-	I.E No. 82422 LA QUINUA	129,093.63	7,701.08	1,936.40	26,575.73
4.-	I.E No. 821096 PAJONAL	58,440.79	3,486.29	876.61	12,120.38
		275,331.81	16,424.92	4,129.97	57,374.91

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL SANITARIO PARA EVITAR
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

S/. 22,862.83

El Avance Acumulado es:

		CD	GG	UTILIDAD	IGV
1.-	I.E No. 82524 CAJEN	90,605.80	5,405.09	1,359.09	19,105.33
2.-	I.E No. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN	101,643.77	6,063.56	1,524.66	21,684.43
3.-	I.E No. 82422 LA QUINUA	216,946.80	12,941.96	3,254.20	44,796.56
4.-	I.E No. 821096 PAJONAL	89,555.68	5,342.44	1,343.34	19,205.90
		498,752.05	29,753.05	7,481.29	104,792.22

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL SANITARIO PARA EVITAR
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

S/. 46,192.58

TOTAL MES:
TOTAL ACUMULADO:
AVANCE FISICO MES:
AVANCE FISICO ACUMUL.:

S/. 376,124.44

S/. 686,971.20

5.05%

9.22%

EN RESUMEN:

TOTAL MES:
TOTAL ACUMULADO:
AVANCE FISICO MES:
AVANCE FISICO ACUMUL.:

S/. 376,124.44

S/. 686,971.20

5.05%

9.22%

SE ADJUNTA LAS VALORIZACIONES RESPECTIVAS.

C. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECÍFICO

1 Avance Programado Vigente:	3.74%
2 Avance Ejecutado en el Mes:	5.05%
3 Avance Programado Acumulado al Mes:	10.61%
4 Avance Ejecutado Acumulado al Mes:	9.22%

Situación Actual de la Obra:

Normal:	☒ SI
Retrasada:	☐ NO
Adelantada:	☐ NO


JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650

La situación actual de la obra se considera Normal con un Avance Ejecutado Acumulado de 9.22%.

D. CONTROL DEL CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

A la fecha el Contratista a cargo de la ejecución de la obra, viene realizando las adquisiciones de los materiales requeridos.

III. CONTROL DE OBRA

A. Control de Campo:

El control de las actividades en campo, se va efectuando conforme a las funciones que le compete a esta Supervisión, y en conformidad a las especificaciones técnicas, metrados programados y cronograma respectivo aprobados.


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

B. Actividades ambientales que se ejecutarán desde el inicio de las actividades de obra según el cronograma del mismo:

Se ha coordinado con el Contratista a cargo de la obra, se implemente con la colocación de depósitos para desechos (cilindros o contenedores), la limpieza constante de la obra. Se viene realizando el control constante de los trabajos y su repercusión en el impacto ambiental de la zona.

C. Descripción de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra

Ninguna.

D. Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

Se adjunta en el anexo correspondiente

E. Recursos Utilizados Durante el Mes

Principales Materiales de Construcción:

En el mes evaluado se utilizó materiales de construcción como: cemento, arena gruesa, piedra chancada, piedra grande, varillas de acero de diversos diámetros, alambre, paneles de madera, tablas y otros, los mismos que se utilizan de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Mano de Obra Técnica:

01 Residente de Obra
04 Asistentes de Residente
04 Maestros de Obra

Mano de Obra Calificada:

Operadores de equipos, Operarios, oficiales y peones de la zona.

Las Maquinarias y Equipos empleados:

01 Retroexcavadora
01 Volquete

F. Control y Supervisión en la Prevención de Riesgos (Seguridad)

La supervisión y el contratista de la obra, vienen realizando las charlas en seguridad y salud, implementadas para todo el personal de obra; con la finalidad de evitar los riesgos y accidentes en la obra. Dichas labores vienen siendo desempeñadas por un asistente de SSOMA.

G. Control y Supervisión Ambiental

Se realiza el control constante y oportuno de los trabajos y su repercusión en el impacto ambiental de la zona, evitando inconvenientes en el desarrollo de las mismas.

H. Actividades Pendientes

NINGUNA

IV. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA

Estado Contable del Contrato de Obra:

1. Pago a cuenta al Contratista (Incluye IGV)

Pago Programado (Contrato de Obra)	S/. 7,449,323.31
Pago Valorización N° 01	S/. 210,263.49
Pago Valorización N° 02	S/. 100,583.24
Pago Valorización N° 03	S/. 376,124.44
Pago Valorización N° 04	
Pago Valorización N° 05	
Pago Valorización N° 06	
Pago Valorización N° 07	
Pago Valorización N° 08	
Pago Valorización N° 09	
Pago Valorización N° 10	
Pago Ejecutado Total	S/. 686,971.17
2. Número de Valorizaciones Tramitadas:	2


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579


JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650

3	Número de Valorizaciones Pagadas:	2	
4	Monto Bruto Valorizado en el Mes (Sin PMA):	S/. 0.00	Sin IGV
5	Reintegro Reajuste del Mes:	S/. 0.00	Sin IGV
6	Deducción por Adelanto Directo del Mes:	S/. 0.00	Sin IGV
7	Deducción por Adelanto de Materiales del Mes:	S/. 0.00	Sin IGV
8	Adelanto Directo Amortizado al Mes:	S/. 0.00	Sin IGV
9	Adelanto de Materiales Amortizado al Mes:	S/. 0.00	Sin IGV
10	Retención por Fiel Cumplimiento (10%)	S/. 0.00	Sin IGV
11	Control de Vigencia de cartas fianza	Ninguna	
12	Relación de Cartas Fianza	Ninguna	

Estado Contable de Supervisión:

1	Pago a cuenta al Supervisor (Incluye IGV)	
	Pago Valorización N° 01	S/. 32,231.43
	Pago Valorización N° 02	S/. 24,793.77
	Pago Valorización N° 03	S/. 29,752.52
	Pago Valorización N° 04	
	Pago Valorización N° 05	
	Pago Valorización N° 06	
	Pago Valorización N° 07	
	Pago Valorización N° 08	
	Pago Valorización N° 09	
	Pago Valorización N° 10	
	Pago Ejecutado Total	S/. 86,777.72
2	Número de Valorizaciones Tramitadas:	2
3	Número de Valorizaciones Pagadas:	2
4	Relación de Cartas Fianza	Ninguna
5	Control de Vigencia de cartas fianza	No Aplica

V. CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

Durante la presente ejecución de la obra, no se efectuó cambio alguno respecto a las partidas programadas en el Expediente Técnico aprobado. Si los hay se estará dando a conocer a la Entidad para su aprobación y autorización definitiva.


JOE ISAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54379

VI. RECOMENDACIONES

A. Comentarios del Supervisor

La Institucion Educativa Pajonal, es la obra con mas dificultades para el traslado de materiales, pues a falta de un acceso carrozable los materiales se trasladan por el camino de herradura utilizando asemitas lo cual no permite lograr un avance de acuerdo a la programacion.

B. Recomendaciones del Supervisor

1.- Se debe analizar la situacion de la Institucion Educativa de Pajonal, pues el tiempo considerado para la ejecucion va merecer una ampliacion por el dificil acceso que se tiene a la obra.
2.- Con las fuertes precipitaciones pluviales que viene ocurriendo en el lugar de la obra, se observa deslizamientos de tierra muy cercanos a la obra, que ponen en peligro su estabilidad de la estructura. Dicho evento se ha verificado con las autoridades el dia 3 de febrero. Se informara a la Entidad con un informe mas detallado.

Cajamarca, 05 de marzo del 2021


JOE IMAAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650
JEFE DE SUPERVISIÓN

Nombre: Ing° Joe I. Trujillo Parraga
N° Reg. Prof.: 47650
DNI : 25686625


Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA

Obra:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA"

Contratista:

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE


Supervisión Externa:

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión:

ING. JOE L. TRUJILLO PARRAGA

RESUMEN GENERAL DE OBRA

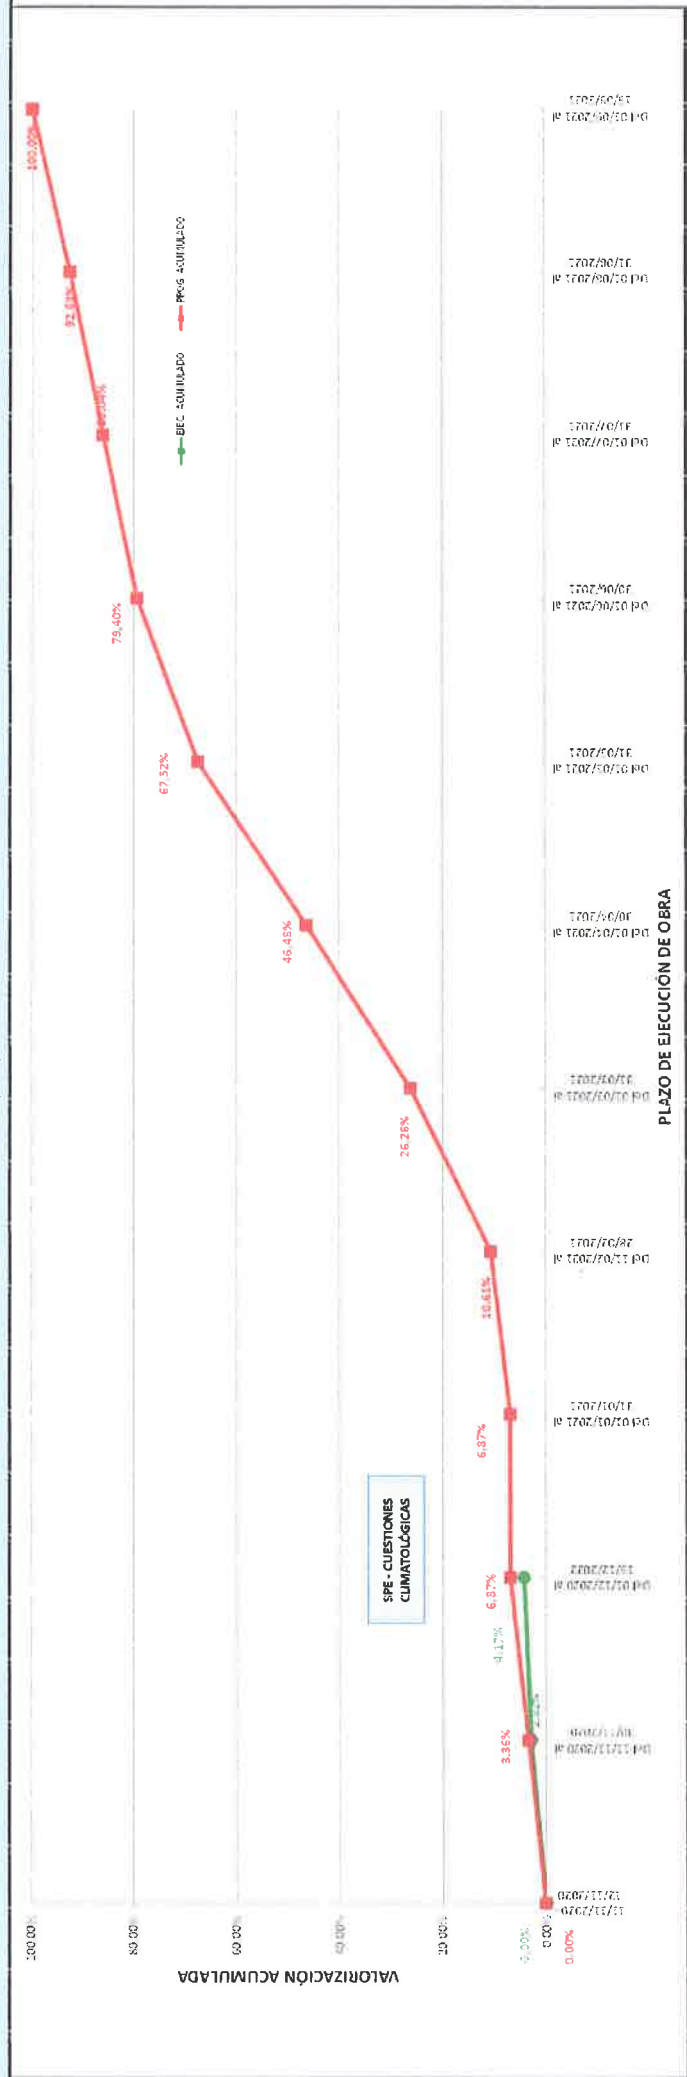

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SEPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES	DECIMO MES	UNDECIMO MES
Obra de Terreno	11/11/2020 - 12/11/2020	Del 01/12/2020 al 31/12/2020	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	Del 01/02/2021 al 31/02/2021	Del 01/03/2021 al 31/03/2021	Del 01/04/2021 al 30/04/2021	Del 01/05/2021 al 31/05/2021	Del 01/06/2021 al 30/06/2021	Del 01/07/2021 al 31/07/2021	Del 01/08/2021 al 31/08/2021	Del 01/09/2021 al 30/09/2021	Del 01/10/2021 al 31/10/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58	212,398.58
PROGRAMADO ACUMULADO	0	212,398.58	424,797.16	637,195.74	849,594.32	1,061,992.90	1,274,391.48	1,486,789.06	1,699,187.64	1,911,586.22	2,123,984.80	2,336,383.38
EJECUTADO MENSUAL	0	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40	178,199.40
EJECUTADO ACUMULADO	0	178,199.40	356,398.80	534,598.20	712,797.60	890,997.00	1,069,196.40	1,247,395.80	1,425,595.20	1,603,794.60	1,781,994.00	1,960,193.40
PROGRAMADO		3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%
PROGRAMADO MENS		3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%	3.36%
PRECIO ACUMULADO		0.00%	2.87%	5.23%	7.59%	9.95%	12.31%	14.67%	17.03%	19.39%	21.75%	24.11%
EJECUTADO		2.87%	5.74%	8.61%	11.48%	14.35%	17.22%	20.09%	22.96%	25.83%	28.70%	31.57%
EJECUTADO MENS		2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%	2.87%
EJEC. ACUMULADO		0.00%	2.87%	5.74%	8.61%	11.48%	14.35%	17.22%	20.09%	22.96%	25.83%	28.70%

- NOTAS:
1. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN INICIARON SU PLAZO CONTRATUAL EL 11/11/2020, MIENTRAS QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA QUINUA Y PAJONAL INICIARON EL 12/11/2020.
 2. LAS CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE REINICIARON EL DIA 11/02/2021.

Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. Nº 54579

JOE L. TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISION
CIP: 47650

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLA VISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA"

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOEL RUJILLO PARRAGA

LE No. 82524 CAJEN

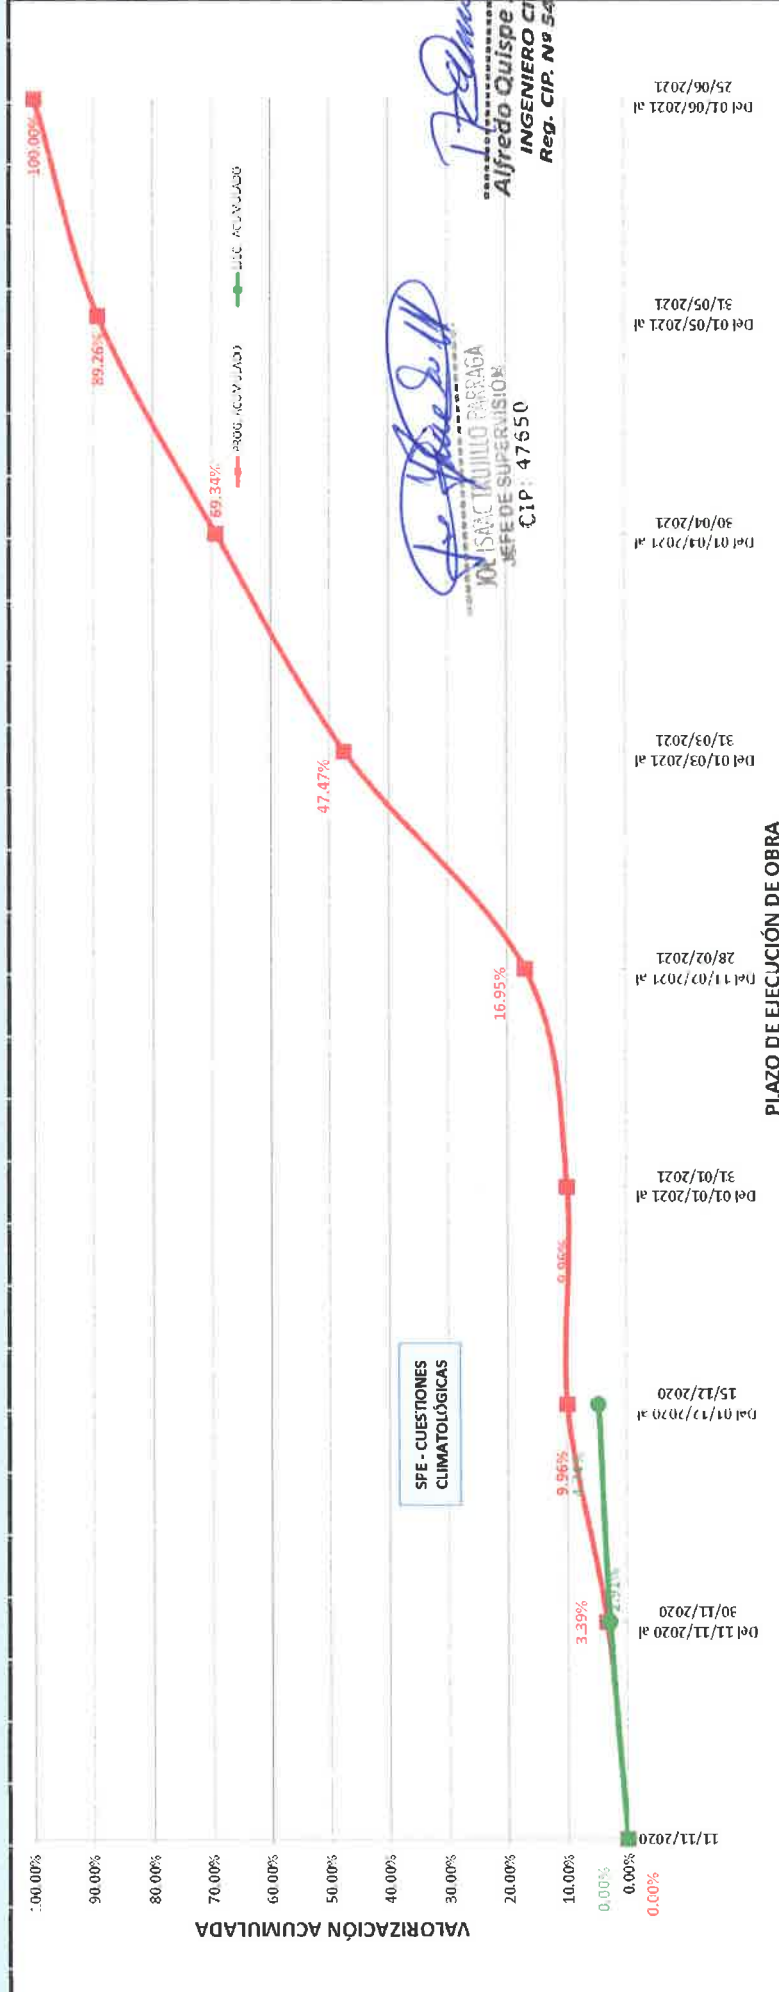

ING. ISAC TRUJILLO PARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47650

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SEPTIMO MES	OCTAVO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	Del 11/11/2020 al 30/11/2020	Del 01/12/2020 al 31/01/2021	Del 01/02/2021 al 31/03/2021	Del 01/04/2021 al 30/04/2021	Del 01/05/2021 al 31/05/2021	Del 01/06/2021 al 30/06/2021		
PROGRAMADO MENSUAL	0	SI 40,621.88	SI 78,675.46	SI 119,297.54	SI 203,218.24	SI 262,087.07	SI 238,772.35	SI 128,736.85	
PROGRAMADO ACUMULADO	0	SI 40,621.88	SI 119,297.54	SI 203,218.24	SI 406,436.48	SI 668,523.55	SI 907,295.90	SI 1,036,068.11	SI 1,164,804.96
EJECUTADO MENSUAL	0	SI 34,891.54	SI 21,980.02	SI 49,269.14	SI 106,140.70	SI 106,140.70	SI 106,140.70	SI 106,140.70	SI 106,140.70
EJECUTADO ACUMULADO	0	SI 34,891.54	SI 56,871.56	SI 78,851.58	SI 184,991.72	SI 291,132.42	SI 397,273.12	SI 503,413.82	SI 609,554.52
PROGRAMADO		% 3.39%	% 6.57%	% 9.96%	% 16.95%	% 30.12%	% 47.47%	% 89.26%	% 100.00%
EJECUTADO		% 2.91%	% 1.83%	% 0.00%	% 4.11%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%
EJECUTADO ACUMULADO		% 0.00%	% 4.74%	% 4.74%	% 8.85%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%	% 0.00%

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJNAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJA MARCA


Contralista: COORDINADOR VIRGENTE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISPE ALFARO

Ing. JOEL TIBULLIO FARRAGA

Jefe de Supervisión:

LE N.º. 82526 BELLAVISTA DE CAJEN

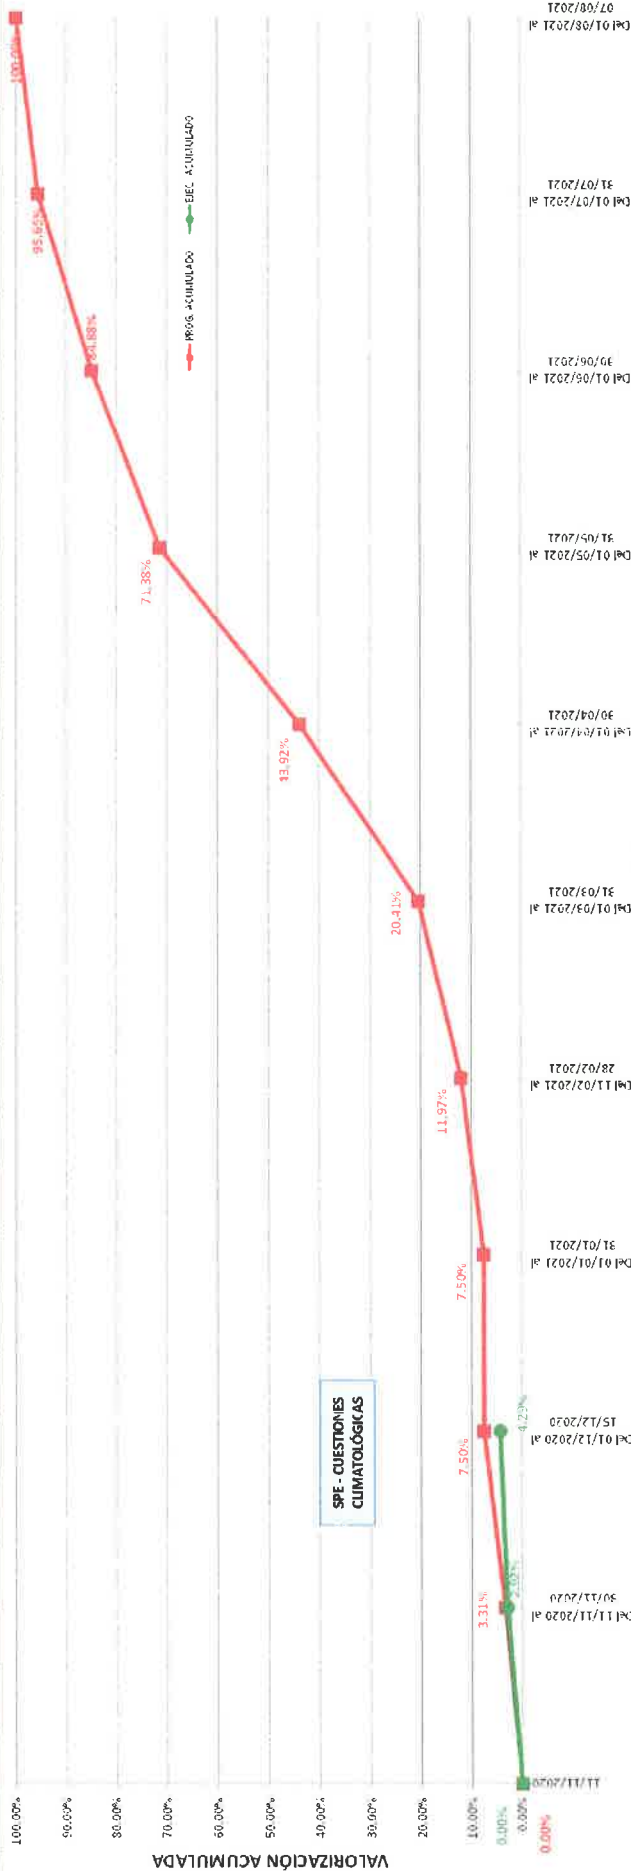

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SÉPTIMO MES	ACTIVO MES	NOVENO MES	DÉCIMO MES
Entrega de Terreno	11/11/2020	Del 01/11/2020 al 30/11/2020	Del 01/12/2020 al 31/12/2020	Del 01/01/2021 al 31/01/2021	Del 01/02/2021 al 28/02/2021	Del 01/03/2021 al 31/03/2021	Del 01/04/2021 al 30/04/2021	Del 01/05/2021 al 31/05/2021	Del 01/06/2021 al 30/06/2021	Del 01/07/2021 al 31/07/2021	Del 01/08/2021 al 31/08/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/	50,758.14 S/
PROGRAMADO ACUMULADO	0	50,758.14 S/	101,516.28 S/	152,274.42 S/	203,032.56 S/	253,790.70 S/	304,548.84 S/	355,306.98 S/	406,065.12 S/	456,823.26 S/	507,581.40 S/
EJECUTADO MENSUAL	0	44,558.18 S/	44,558.18 S/	21,110.92 S/	54,500.86 S/	133,776.21 S/	133,776.21 S/	1,096,166.75 S/	1,353,542.85 S/	1,608,887.04 S/	1,864,273.24 S/
EJECUTADO ACUMULADO	0	44,558.18 S/	89,116.36 S/	110,227.28 S/	164,728.14 S/	298,494.35 S/	432,270.56 S/	1,528,437.31 S/	2,881,980.16 S/	4,490,867.20 S/	6,355,140.44 S/
PROGRAMADO		3.31%	4.19%	0.00%	4.47%	8.44%	23.51%	43.92%	13.50%	11.77%	4.35%
PROGRAMADO ACUMULADO	0.00%	3.31%	7.50%	7.50%	11.97%	20.41%	43.92%	87.84%	101.34%	113.11%	117.46%
EJECUTADO		2.92%	1.31%	0.00%	3.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EJECUTADO ACUMULADO	0.00%	2.92%	4.23%	4.23%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%	7.78%

ING. ALFREDO QUISPE ALFARO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N.º 54579


ING. JOEL TIBULLIO FARRAGA
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP: 47550

Obra:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN, BELLA VISTA DE CAJEN, LA QUINUA Y PAJONA EN EL DISTRITO DE SUCRE, LA PROVINCIA DE CAYEN, REGION CAJAMARCA"		
Contratista:	CONSORCIO VIRS EN DE C/ ADALUPE		
Supervisión Externa:	ING. ALFREDO GU SPE ALFARO	Jefe de Supervisión:	ING. JOE L. TRULLI? PARRAGA

Supervisión Externa:

ING. JOÉ I. TRUJILLO PARRAGA

I.E No. 32422 Lf, QUINUA

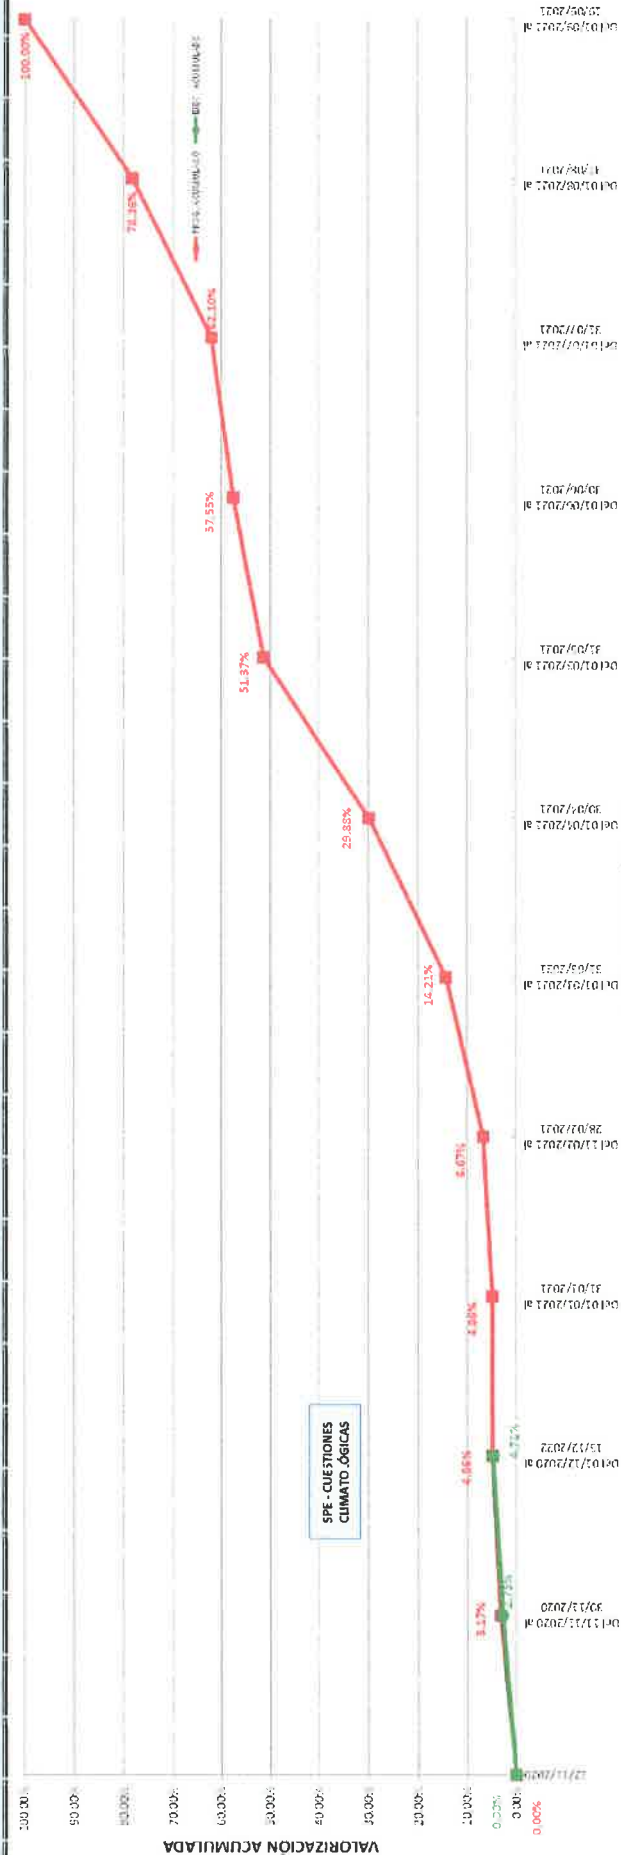

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

[illegible]

4/2/20

Alfredo Quispe Alfaro
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 54579

GRAFICO DEL CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO & EJECUTADO


Obras: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN Y BELLAVISTA DE CAJEN - DISTRITO DE SUJIRE, LA QUINUA Y PAJONAL EN EL DISTRITO DE OXAMARCA, DE LA PROVINCIA DE CELINDEN, REGION CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Supervisión Externa: ING. ALFREDO QUISEP ALFARO

Jefe de Supervisión: ING. JOEL TRUJILLO PARRAGA

IE No. 821096 PAJONAL

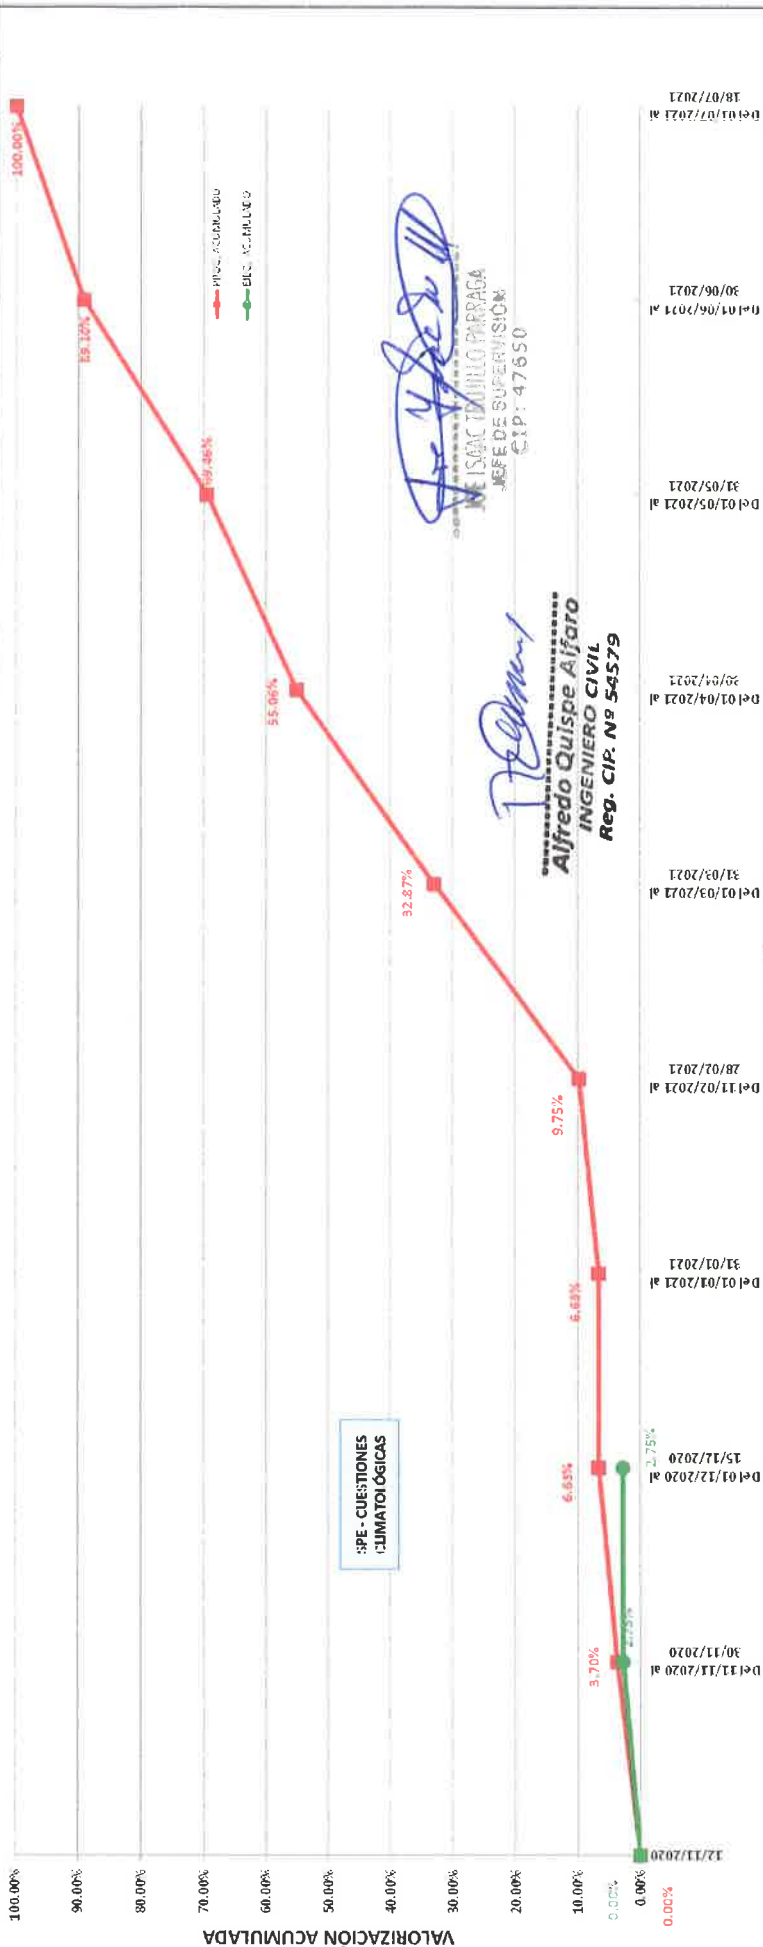

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

DESCRIPCION	INICIO	PRIMER MES	SEGUNDO MES	TERCER MES	CUARTO MES	QUINTO MES	SEXTO MES	SEPTIMO MES	OCTAVO MES	NOVENO MES
Ejecución de Termino	12/11/2020	Del 11/12/2020 al 30/12/2020	Del 01/01/2021 al 15/01/2021	Del 16/01/2021 al 31/01/2021	Del 01/02/2021 al 28/02/2021	Del 01/03/2021 al 31/03/2021	Del 01/04/2021 al 30/04/2021	Del 01/05/2021 al 31/05/2021	Del 01/06/2021 al 30/06/2021	Del 01/07/2021 al 15/07/2021
PROGRAMADO MENSUAL	0	52,814.99	41,820.37	41,820.37	44,508.38	330,319.94	317,182.56	205,802.84	230,770.75	155,894.59
PROGRAMADO ACUMULADO	0	52,814.99	94,635.06	136,455.06	180,963.44	511,283.38	828,465.94	1,034,268.78	1,265,039.53	1,420,934.12
EJECUTADO MENSUAL	0	39,363.37	39,363.37	39,363.37	67,335.47	106,639.44	106,639.44	106,639.44	106,639.44	106,639.44
EJECUTADO ACUMULADO	0	39,363.37	78,726.74	118,090.11	185,425.58	292,064.92	400,000.00	506,639.44	613,278.88	720,000.00
PROGRAMADO		3.71%	2.53%	0.00%	3.12%	22.12%	22.19%	14.40%	19.64%	10.90%
PROGRAMADO ACUMULADO	0.00%	3.71%	6.63%	6.63%	9.75%	31.87%	54.06%	68.46%	88.10%	100.00%
EJECUTADO		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EJECUTADO ACUMULADO	0.00%	2.75%	2.75%	2.75%	7.46%	29.21%	51.40%	65.80%	85.44%	100.00%
