



Cajamarca, 16 de Abril del 2021

INFORME N° D000159-2021-GRC-SGSL

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **SANDRA MELISSA GUTIERREZ CUBAS**
ESPECIALISTA - INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : INFORME RESPECTO AL INFORME MENSUAL N°04.

Referencia : PROVEIDO N° D000958-2021-GRC-SGSL (05Marzo2021)

Fecha : Cajamarca, 16 de Abril de 2021

Por medio del presente, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de referencia, emitido por el Representante Legal de la Supervisión Jhon Francis Julca Chacón, supervisor de la obra y proveído a su despacho, se remite el Informe Mensual N° 04, de Supervisión de Obra del mes de Febrero (18/02/2021 al 28/02/2021) de la Obra: "Instalación del Servicio Escolarizado Del Nivel Inicial en las Localidades de la Totorá en el Distrito de Calquis, el Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel - Región Cajamarca".

Es importante mencionar que no se dio trámite antes debido a mi aislamiento por Covid - 19 y además una revés reincorporada se realizó primero coordinaciones con el Nuevo Coordinador del Proyecto, quien no había tramitado este informe, por lo cual una vez informada se procede a revisar e informar a su persona.

I. Antecedentes

- Que mediante Carta N° 0113 - 2021 - C/JFJ de fecha 05 de Marzo del 2021 la supervisión alcanza su Informe Mensual N°04 a la entidad.
- Que con Informe N° 047 - 2021-AHNL/JSUP de fecha 04 de Marzo del 2021 Remite el Jefe de Supervisión el informe Mensual de la Supervisión Correspondiente de la Valorización de Obra del Mes de Febrero del 2021.

II. Análisis

De la revisión al Informe Mensual N° 04, solo se está revisando únicamente los documentos presentados, que se encuentran en el detalle 5.13 PRODUCTOS O ENTREGABLES - Informe Mensuales de las bases integradas que dio origen a la adjudicación de la buena pro y suscripción del contrato para la Supervisión de la ejecución de obra del indicado proyecto, quién es la única responsable del control metrados realmente ejecutados, certificados de control de calidad, así como el resumen de valorización presentada y otros documentos, por estar directamente presentes en la obra y contar el equipamiento estratégico y plantel de profesionales y/o técnicos y formar parte de sus funciones como Supervisión.

Cajamarca, 05 de marzo del 2021

CARTA N° 113 - 2021 - C/JFC

Señores: **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.**
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca.

Atención : **Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Presente.-

Asunto : **Se Presenta Informe Mensual N° 04 de Supervisión de Obra, del 18 al 28 de Febrero del 2021.**

Referencia :

- a) Informe N° 047-2021-AHNL/JSUP
- b) Contratación Del Servicio De Consultoría De Obra Para La Supervisión De Obra: **Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Totorá en el Distrito de Calquis, El Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel, Región de Cajamarca.**

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que, por medio de la presente y a través del **Informe N° 047-2021-AHNL/JSUP** del Jefe de Supervisión de Obra, se está alcanzando el **"Informe Mensual N° 04"**, de la obra de la referencia, la cual corresponde al periodo de ejecución: 18 al 28 de FEBRERO 2021; expresando además que la Supervisión aprueba y brinda conformidad al presente informe de obra.

Se adjunta:

- Informe N° 047-2021-AHNL/JSUP
- 03 CD (02 originales + 01 copia)

Sin otro particular y en espera a la atención que merezca la presente, expreso a Ud. mi respeto, consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

PASE A: *Ing. Santa Teresa Journet*

PARA: *Revisión, Ejecución e Informe*

e Informe

10-5-MAR-2021

FECHA: FIRMAS

C.c. Archivo.

Telf. (01) 4332317
Cel. 976 111717

Email: julca78@hotmail.com

Av. General Garzón # 613
/ Jesús María - LIMA



DATOS GENERALES DE LA OBRA

1 Obra	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, FN I A PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
2 Ubicación	
Departamento	CAJAMARCA
Provincia	SAN MIGUEL
Distrito	CALQUIS NIEPOS SAN MIGUEL
Localidad	LA TOTORA EL PALMITO TALLAPAMPA
3 Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
4 Fuente de Financiamiento	Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y P.
5 Tipo de proceso de Selección	LICITACION PUBLICA N° 004-2020-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA
6 Sistema de contratacion	A SUMA ALZADA
7 Valor referencial Total	S/. 3,893,864.72
7.1 Valor referencial - IE La Totorá	S/. 1,122,067.71
7.2 Valor referencial - IE Palmito	S/. 1,543,700.11
7.3 Valor referencial - IE Tallapampa	S/. 1,228,096.90
8 Monto del contrato Total, con IGV	S/. 3,436,780.60
8.1 Monto del contrato, con IGV - IE. La Totorá	S/. 1,008,496.79
8.2 Monto del contrato, con IGV - IE. Palmito	S/. 1,342,558.94
8.3 Monto del contrato, con IGV - IE. Tallapampa	S/. 1,085,724.87
9 Monto del contrato Total, sin IGV	S/. 2,912,525.93
9.1 Monto del contrato, sin IGV - La Totorá	S/. 854,658.30
9.2 Monto del contrato, sin IGV - Palmito	S/. 1,137,761.81
9.3 Monto del contrato, sin IGV - Tallapampa	S/. 920,105.82
10 Fecha base del Expediente Técnico	Dic. 2019
11 Plazo de ejecución según Bases de Licitación	
11.1 I.E. La Totorá	128 DIAS CALENDARIOS
11.2 I.E. Palmito	166 DIAS CALENDARIOS
11.3 I.E. Tallapampa	165 DIAS CALENDARIOS


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 40804305

420

12 Plazo de ejecución según Contrato	
12.1 I.E. La Totorá	128 DIAS CALENDARIOS
12.2 I.E. Palmito	166 DIAS CALENDARIOS
12.3 I.E. Tallapampa	165 DIAS CALENDARIOS
13 Número de contrato	004-2020-GRCAJ-GGR.
14 Contratista	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
15 Residente de Obra	ING. VICENTE SANCHEZ LA TORRE
16 Supervisor de Obra	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
17 Fecha de solicitud de Adelanto Directo	
Adelanto Directo N° 01, con IGV y fecha pago	S/. 0.00
Fecha de entrega del Adelanto Directo	
18 Fecha de solicitud de Adelanto de Materiales	
Adelantos para Materiales N° 01, con IGV y fecha	S/. 0.00
Fecha de entrega del Adelanto de Materiales	
19 Entrega del terreno	
I.E. La Totorá	12/11/2020
I.E. Palmito	12/11/2020
I.E. Tallapampa	13/11/2020
20 Inicio contractual del plazo de obra	
I.E. La Totorá	13/11/2020
I.E. Palmito	13/11/2020
I.E. Tallapampa	14/11/2020
21 Plazo para comienzo de trabajos programados	
I.E. La Totorá	13/11/2020
I.E. Palmito	13/11/2020
I.E. Tallapampa	14/11/2020
22 Suspension de Obra	19/01/2021
23 Reinicio de Obra	18/02/2021
22 Nuevo Término vigente programado de obra	
I.E. La Totorá	19/04/2021
I.E. Palmito	27/05/2021
I.E. Tallapampa	27/05/2021
23 Dias pendientes de Plazo Contractual	
I.E. La Totorá	51
I.E. Palmito	89
I.E. Tallapampa	89


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 40804305

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS

RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/05/2021	

MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (SIN IGV)				EJECUTADO (SIN IGV)				% EJEC. PROG.
		AVANCE MENSUAL	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE MENSUAL	PORCENTAJE ACUMULADO	
Val N° 01 - Noviembre	01	115,262.00	115,262.00	3.96%	3.96%	103,954.01	103,954.01	3.57%	3.57%	90.19%
Val N° 02 - Dic	02	446,393.24	561,655.24	15.33%	19.28%	287,073.68	391,027.69	9.86%	13.43%	69.62%
Val N° 03 - Enero	03	388,084.24	949,739.48	13.32%	32.61%	105,688.92	496,716.61	3.63%	17.05%	52.30%
Val N° 04 - Febrero	04	280,283.05	1,230,022.53	9.62%	42.23%	303,422.00	800,138.61	10.42%	27.47%	65.05%
Val N° 05 - Marzo	05	665,852.83	1,895,875.35	22.86%	65.09%	0.00	800,138.61	0.00%	27.47%	42.20%
Val N° 06 - Abril	06	622,419.67	2,518,295.02	21.37%	86.46%	0.00	800,138.61	0.00%	27.47%	31.77%
Val N° 07 - Abril	07	394,230.90	2,912,525.92	13.54%	100.00%	0.00	800,138.61	0.00%	27.47%	27.47%
TOTAL		2,912,525.92				800,138.61				

John Francis Jiliza Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FÍSICO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/05/2021	

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00		3.96%	3.96%
Val N° 02 - Dic	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24		15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 388,084.24	S/. 949,739.48		13.32%	32.61%
Val N° 04 - Febrero	S/. 280,283.05	S/. 1,230,022.53		9.62%	42.23%
Val N° 05 - Marzo	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.35		22.86%	65.09%
Val N° 06 - Abril	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.02		21.37%	86.46%
Val N° 07 - Mayo	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.92		13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.92			100.00%	


MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.01	S/. 103,954.01		3.57%	3.57%
Val N° 02 - Dic	S/. 287,073.68	S/. 391,027.69		9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 105,688.92	S/. 496,716.61		3.63%	17.05%
Val N° 04 - Febrero	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61		10.42%	27.47%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 07 - Mayo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
TOTAL	S/. 800,138.61			27.47%	27.47%


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Jirca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 CNI N° 40804305

24

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

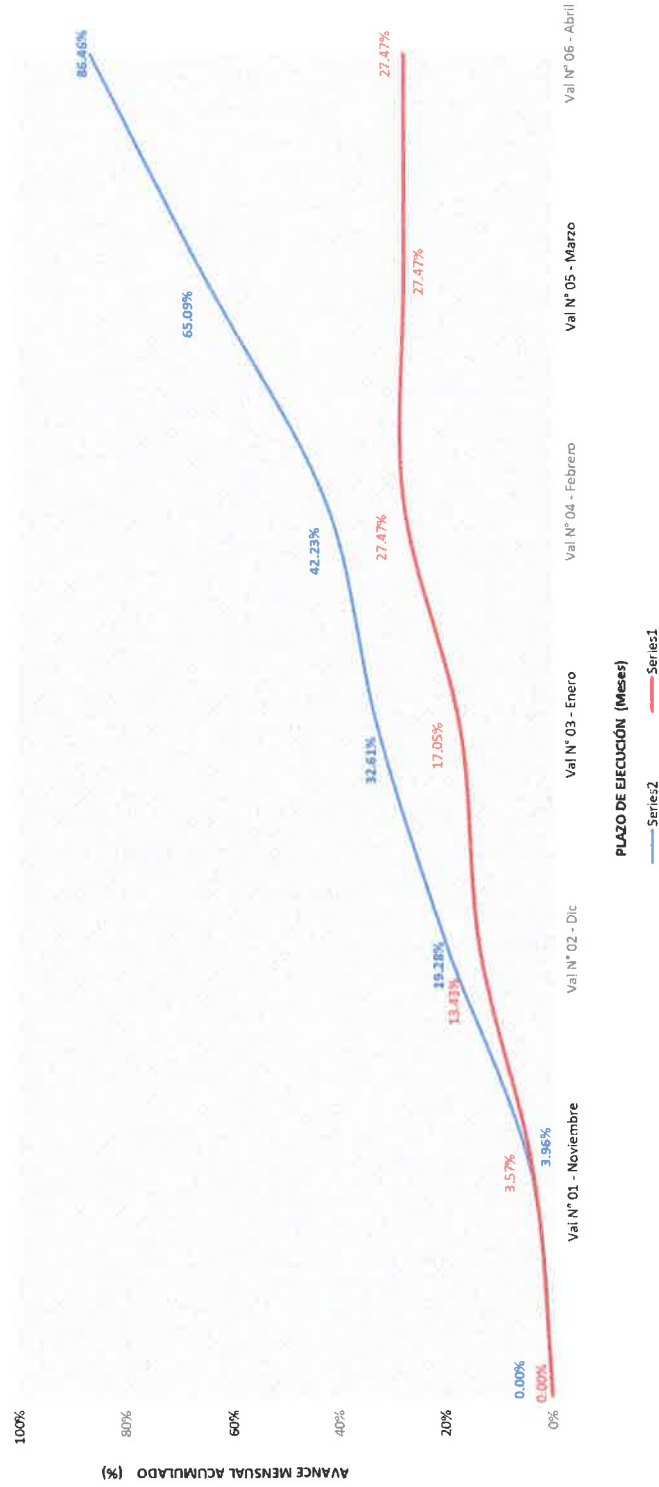

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

Johny Fandi's Juca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
CNI: N° 40804305

RESUMEN GENERAL

Valorización N° 04

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	27/05/2021

DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (S./IGV)	VALORIZACION			SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
A: VALORIZACION CONTRACTUAL					
VALORIZACION	S/. 2,912,525.92	S/. 496,716.61	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61	S/. 2,112,387.31
TOTAL (A)	S/. 2,912,525.92	S/. 496,716.61	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61	S/. 2,112,387.31
AVANCE EJECUTADO	100%	17.05%	10.42%	27.47%	72.53%
B: REAJUSTES					
Reajuste de Valorización 04 (Febrero 2021)	0.00	15,452.69	18,602.72	34,055.42	-S/. 34,055.42
TOTAL (B)	0.00	15,452.69	18,602.72	34,055.42	-34,055.42
C: DEDUCCIÓN					
Deducción por A.D (Nov. 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deducción por A.M (Nov. 2020)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)	S/. 2,912,525.92	S/. 512,169.30	S/. 322,024.72	S/. 834,194.03	S/. 2,078,331.89
D: AMORTIZACIONES					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL (D)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)	S/. 2,912,525.92	S/. 512,169.30	S/. 322,024.72	S/. 834,194.03	S/. 2,078,331.89
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA					
EN EFECTIVO (VN)	2,912,525.92	S/. 512,169.30	S/. 322,024.72	S/. 834,194.03	S/. 2,078,331.89
EN I.G.V. (18%*VN)	S/. 524,254.67	S/. 92,190.47	S/. 57,964.45	S/. 150,154.92	S/. 374,099.75
TOTAL OBRAS CIVILES (E)	S/. 3,436,780.58	S/. 604,359.78	S/. 379,989.17	S/. 984,348.95	S/. 2,452,431.64
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (E) S/.	S/. 3,436,780.58	S/. 604,359.78	S/. 379,989.17	S/. 984,348.95	S/. 2,452,431.64


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI N° 40804305

CONTROL DE VALORIZACIONES - RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/05/2021	

PERIODO VALORIZADO	VALORIZACIÓN N°	MONTO BRUTO	REAJUSTES	AMORT. ADELANTOS		DEDUCCIONES		VALORIZ. NETA S/IGV	IGV 18.00%	NETO A PAGAR	
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES				
Nov-20	01	103,954.01	3,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	107,109.23	19,279.66	126,388.89	
Dic-20	02	287,073.68	8,652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	295,725.92	53,230.66	348,956.58	
Ene-21	03	105,688.92	3,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	109,334.16	19,680.15	129,014.31	
Feb-21	04	303,422.00	18,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	322,024.72	57,964.45	379,989.17	
Mar-21	05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abr-21	06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
May-21	07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		800,138.61	34,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	834,194.03	150,154.92	984,348.95	

NOTA: PRECIOS SIN IGV


John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laurcano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	27/05/2021


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00		3.96%	3.96%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24		15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 388,084.24	S/. 949,739.48		13.32%	32.61%
Val N° 04 - Febrero	S/. 280,283.05	S/. 1,230,022.53		9.62%	42.23%
Val N° 05 - Marzo	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.35		22.86%	65.09%
Val N° 06 - Abril	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.02		21.37%	86.46%
Val N° 07 - Mayo	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.92		13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.92			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.01	S/. 103,954.01		3.57%	3.57%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 287,073.68	S/. 391,027.69		9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 105,688.92	S/. 496,716.61		3.63%	17.05%
Val N° 04 - Febrero	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61		10.42%	27.47%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 07 - Mayo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
TOTAL	S/. 800,138.61			27.47%	27.47%


Ing. Abraham H. Nuñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708


John Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40894305

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

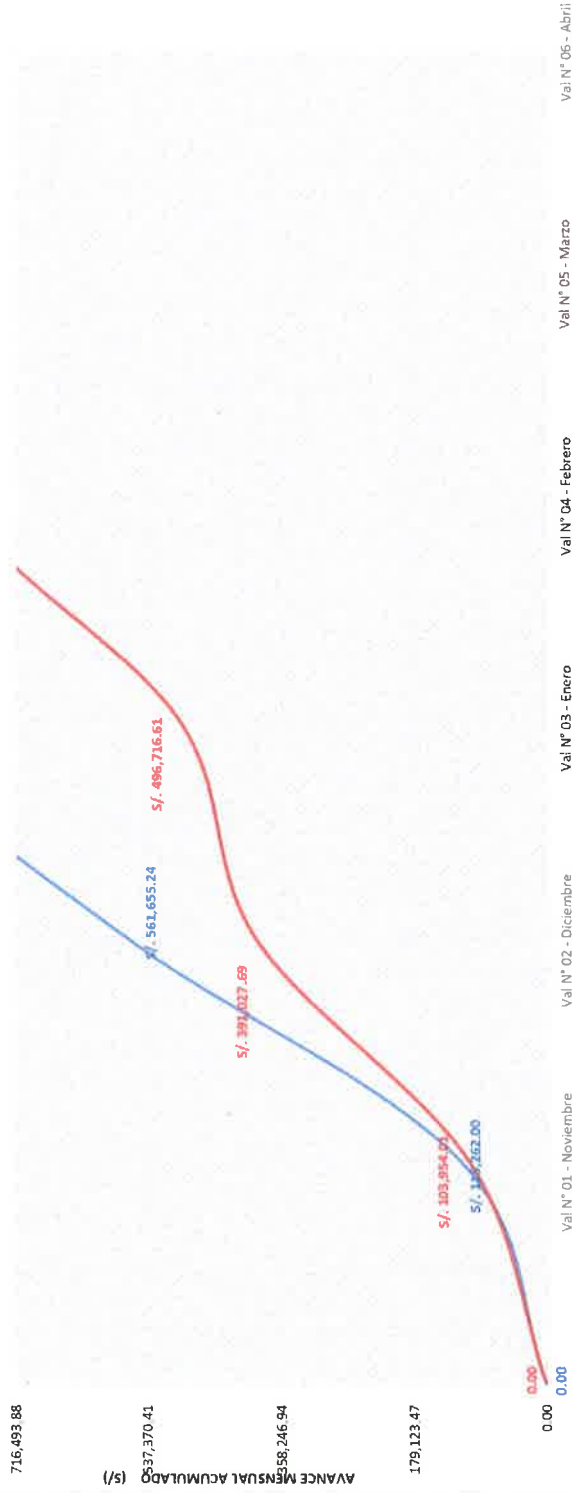

PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)

Series2 Series1

John Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FÍSICO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/05/2021	


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00		3.96%	3.96%
Val N° 02 - Dic	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24		15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 388,084.24	S/. 949,739.48		13.32%	32.61%
Val N° 04 - Febrero	S/. 280,283.05	S/. 1,230,022.53		9.62%	42.23%
Val N° 05 - Marzo	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.35		22.86%	65.09%
Val N° 06 - Abril	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.02		21.37%	86.46%
Val N° 07 - Mayo	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.92		13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.92			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.01	S/. 103,954.01		3.57%	3.57%
Val N° 02 - Dic	S/. 287,073.68	S/. 391,027.69		9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 105,688.92	S/. 496,716.61		3.63%	17.05%
Val N° 04 - Febrero	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61		10.42%	27.47%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 07 - Mayo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
TOTAL	S/. 800,138.61			27.47%	27.47%


JOHN FRANCIS JUICA CHACÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
 N° 40804305


Ing. Abraham H. Nuñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

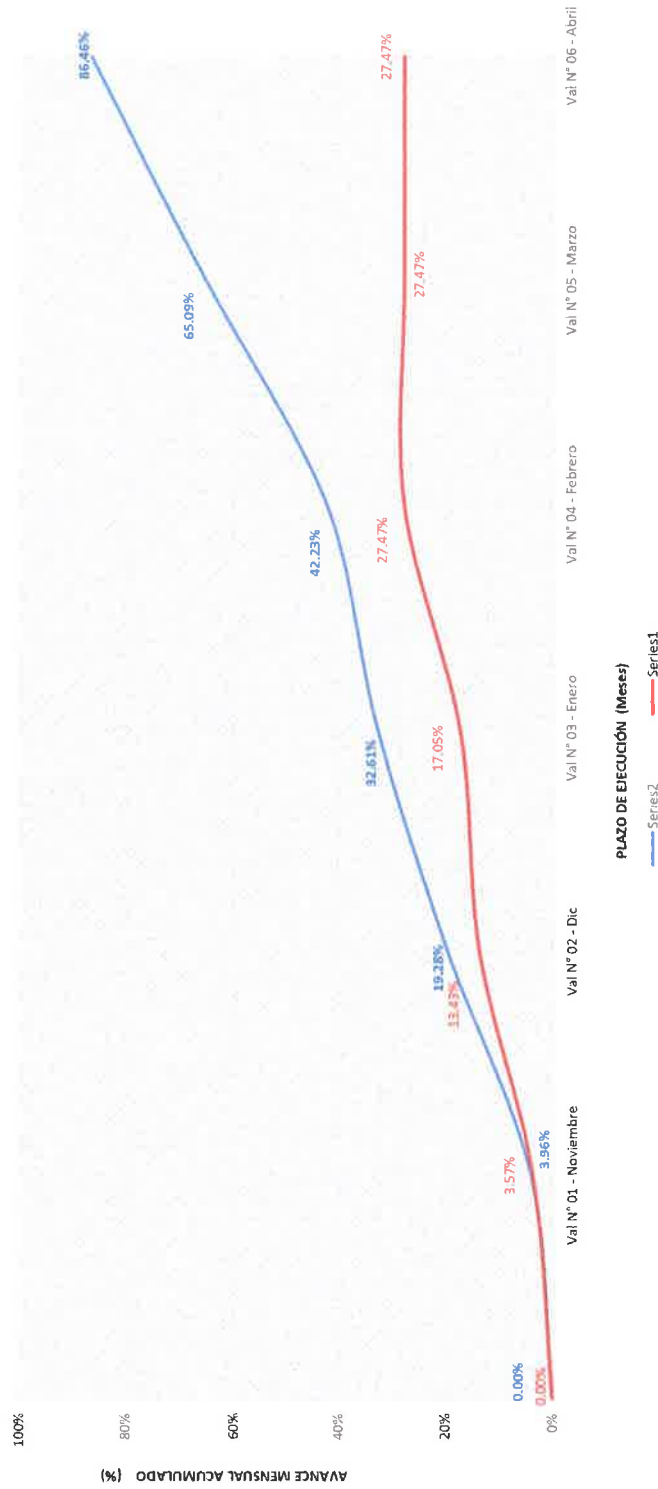


John Francis Juica Chacon
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO -RESUMEN

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRAJ-SGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	27/05/2021	


MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 115,262.00	S/. 115,262.00		3.96%	3.96%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 446,393.24	S/. 561,655.24		15.33%	19.28%
Val N° 03 - Enero	S/. 388,084.24	S/. 949,739.48		13.32%	32.61%
Val N° 04 - Febrero	S/. 280,283.05	S/. 1,230,022.53		9.62%	42.23%
Val N° 05 - Marzo	S/. 665,852.83	S/. 1,895,875.35		22.86%	65.09%
Val N° 06 - Abril	S/. 622,419.67	S/. 2,518,295.02		21.37%	86.46%
Val N° 07 - Mayo	S/. 394,230.90	S/. 2,912,525.92		13.54%	100.00%
TOTAL	S/. 2,912,525.92			100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.		PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 103,954.01	S/. 103,954.01		3.57%	3.57%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 287,073.68	S/. 391,027.69		9.86%	13.43%
Val N° 03 - Enero	S/. 105,688.92	S/. 496,716.61		3.63%	17.05%
Val N° 04 - Febrero	S/. 303,422.00	S/. 800,138.61		10.42%	27.47%
Val N° 05 - Marzo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 06 - Abril	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
Val N° 07 - Mayo	S/. 0.00	S/. 800,138.61		0.00%	27.47%
TOTAL	S/. 800,138.61			27.47%	27.47%


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708


 John Francis Juica Chacon
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI- N° 40804305

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

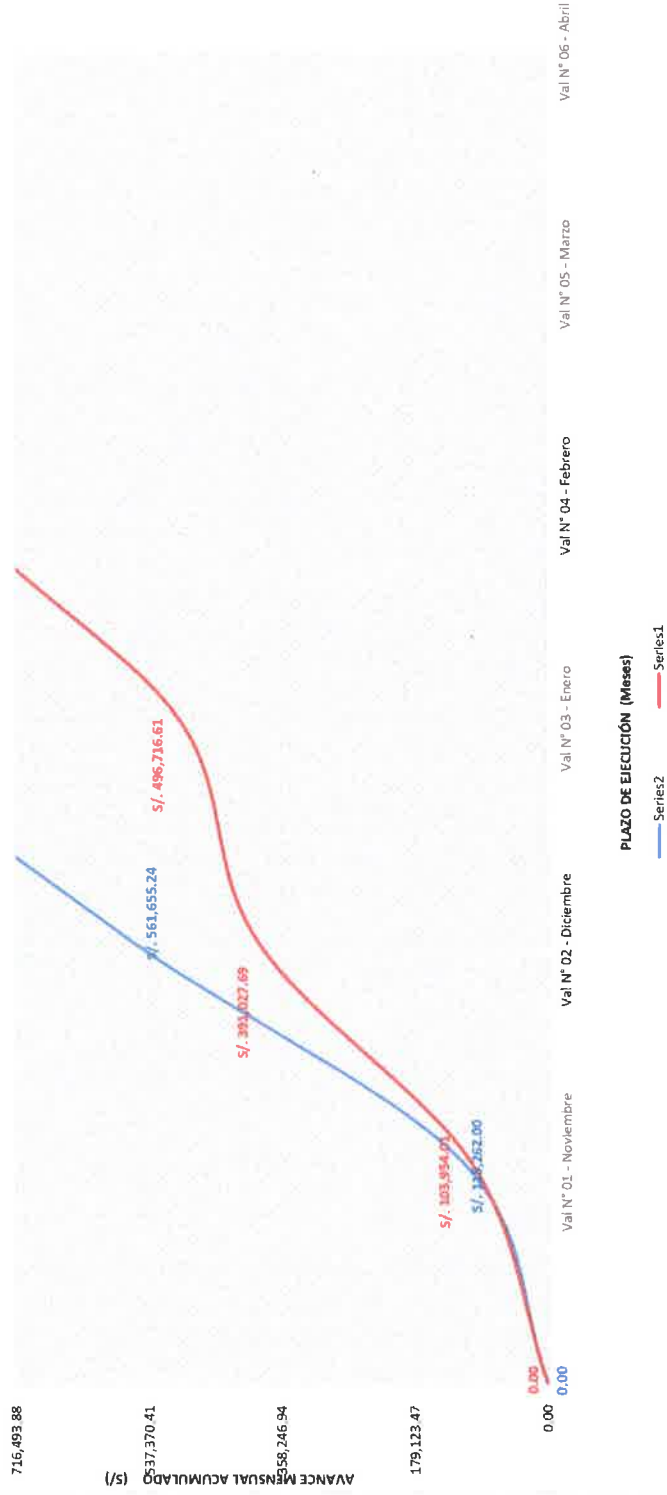

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305
