



Firmado digitalmente por VARGAS
SALAZAR Víctor Martín FAU
20453744168 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.06.2021 15:19:46 -05:00

Cajamarca, 16 de Junio del 2021

INFORME N° D000155-2021-GRC-SGSL-VVS

A : **LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA**
SUBGERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

De : **VICTOR MARTIN VARGAS SALAZAR**
INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

Asunto : SE ALCANZA EL INFORME MENSUAL N° 07 PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".

Referencia : INFORME N° D000215-2021-GRC-SGSL (10Junio2021)

Fecha : Cajamarca, 16 de Junio de 2021

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, a su vez para hacer de su conocimiento que en atención al documento de la referencia; en donde la Ingeniera Sandra Melissa Gutiérrez Cubas ha realizado la revisión del INFORME MENSUAL N° 07 de la supervisión del proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA", en tal sentido se sugiere se archive en el folder de obra.

Es cuanto informo a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
VICTOR MARTIN VARGAS SALAZAR
INGENIERO CIVIL
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES



Cajamarca, 04 de junio del 2021

CARTA N° 187 - 2021 - C/JFJ

Señores: **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.**
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda - Cajamarca.

Atención : **Ing. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCÁNTARA**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Presente.-

Asunto : **Se Presenta Informe Mensual N° 07 de Supervisión de Obra, del 01 al 31 de mayo del 2021.**

Referencia :

- a) Informe N° 098-2021-AHNL/JSUP
- b) Contratación Del Servicio De Consultoría De Obra Para La Supervisión De Obra: *Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Totora en el Distrito de Calquis, El Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel, Región de Cajamarca.*

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que, por medio de la presente y a través del **Informe N° 098-2021-AHNL/JSUP** del Jefe de Supervisión de Obra, se está alcanzando el **"Informe Mensual N° 07"**, de la obra de la referencia, la cual corresponde al periodo de ejecución: 01 al 31 de MAYO de 2021; expresando además que la Supervisión aprueba y brinda conformidad al presente informe de obra.

Se adjunta:

- Informe N° 098-2021-AHNL/JSUP
- 03 CD (02 originales + 01 copia)

Sin otro particular y en espera a la atención que merezca la presente, expreso a Ud. mi respeto, consideración y estima personal.

Atentamente,



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

C.c.

INFORME MENSUAL N° 07 - DE SUPERVISION DE OBRA

Obra: *"Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Totorá en el Distrito de Calquis, El Palmito en el Distrito de Niepos y Tallapampa en el Distrito de San Miguel, en la Provincia de San Miguel"*

Ubicación:

Departamento : Cajamarca
 Provincia : San Miguel
 Distritos : Calquis, Niepos, San Miguel.
 Localidades : Totorá - Calquis.
 El Palmito - Niepos.
 Tallapampa – San Miguel.

Contratista : CONSORCIO VIRGEN DE
 GUADALUPE

Financiamiento : Canon y Sobrecanon, regalías, renta de
 aduanas y P.

Licitación Pública : LICITACION PUBLICA N°004-2020-
 GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA

Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA

Presupuesto Base y fecha con IGV : S/. 3'818,645.11 (Diciembre 2019)

Presupuesto Base y fecha sin IGV : S/. 3'236,139.19 (Diciembre 2019)

Contrato N° y fecha : N° 004 – 2020 – GR.CAJ-GGR

Monto del Contrato con IGV : S/. 3'436,780.60

Monto del contrato sin IGV : S/. 2'912,525.93

Plazo de ejecución en d.c. :

- 128 d.c. I.E. La Totorá
- 166 d.c. I.E. Palmito
- 165 d.c. I.E. Tallapampa

Plazo de ejecución según Bases :

- 128 d.c. I.E. La Totorá
- 166 d.c. I.E. Palmito
- 165 d.c. I.E. Tallapampa


 John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


 Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

Ampliación de plazo N° 01 : Denegada

Ampliación de plazo N° 02	: Denegada
Ampliación de plazo N° 03	: Denegada
Adicional de obra N° 01, con IGV	: S/. 67,751.95
Adicional de obra N° 01, sin IGV	: S/. 57,416.91
Adicional de obra N° 02, con IGV	: S/. 33,837.64
Adicional de obra N° 02, sin IGV	: S/. 28,675.97
Deductivo de obra N°01, con IGV	: S/. 28,500.67
Deductivo de obra N°01, sin IGV	: S/. 24,153.11
Adelantos directos, con IGV	: No tramitado
Adelantos directos, sin IGV	: No tramitado
Adelanto de materiales con IGV	: No tramitado
Adelanto de materiales sin IGV	: No tramitado
Acta de Entrega de terreno	:
	12 de Noviembre del 2020 - I.E. La Totorá 12 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa
Inicio oficial del plazo	:
	13 de Noviembre del 2020 - I.E. La Totorá 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito 14 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa
Suspensión de obra N°01	: 19 de enero del 2021 al 17 de febrero del 2021
Termino original programado de obra	:
	20 de Marzo del 2021 - I.E. La Totorá 27 de Abril del 2021 - I.E. El Palmito 27 de Abril del 2021 - I.E. Tallapampa

John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

Termino reprogramado de obra :
 ■ 19 de Mayo del 2021 - I.E. La Totora
 ■ 27 de Junio del 2021 - I.E. El Palmito
 ■ 27 de Junio del 2021 - I.E. Tallapampa
Suspensión de obra N°02 : 22 de marzo al 20 de abril del 2021
Reinicio de obra : 21 de Abril del 2021
Termino real de obra : 27 de Junio del 2021
Acta de Recepción de Obra : Obra no concluida
Residente de Obra : Ing. Vicente Sánchez La Torre
Supervisor de Obra : Ing. Abraham Núñez Laureano

Avance del mes de mayo 2021 (01 al 31)

Programado : 32.31 %
Ejecutado : 5.44 %

Avance Acumulado del mes de mayo 2021 (01 al 31)

Programado : 77.11%
Ejecutado : 53.03%

Valorización del mes de

MAYO 2021 : S/. 186,875.57 (Incluye IGV)

Pago de Valorización Acumulada : S/. 1'905,985.19 (Incluye IGV)

Penalidad del mes de Noviembre : S/. 4,300.00 (Incluye IGV)

Penalidad del mes de Diciembre : S/. 189,200.00 (Incluye IGV)

Penalidad del mes de Enero 2021 : S/. 44,000.00 (Incluye IGV)

Penalidad del mes de Febrero 2021 : S/. 4,400.00 (Incluye IGV)

Penalidad del mes de Abril 2021 : S/. 2,200.00 (Incluye IGV)

Estado de la Obra : ATRASADA

John Francis Julca Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA vs CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.




Ing. Abraham H. Nuez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

I.E.I LA TOTORA


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


CURVA "S" FISICO - I.E.I. LA TOTORA

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	19/05/2021	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Dic	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.02%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.28	9.88%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 160,125.09	S/. 432,719.37	18.73%	50.63%
Val N° 06 - Abril	S/. 76,250.05	S/. 508,969.42	8.92%	59.55%
Val N° 07 - Mayo	S/. 345,688.88	S/. 854,658.30	40.45%	100.00%
TOTAL	S/. 854,658.30		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Dic	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.03%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.27	9.87%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 135,055.51	S/. 407,649.78	15.80%	47.70%
Val N° 06 - Abril	S/. 108,301.34	S/. 515,951.12	12.67%	60.37%
Val N° 07 - Mayo	S/. 66,532.96	S/. 582,484.08	7.78%	68.15%
TOTAL	S/. 582,484.08		68.15%	68.15%

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

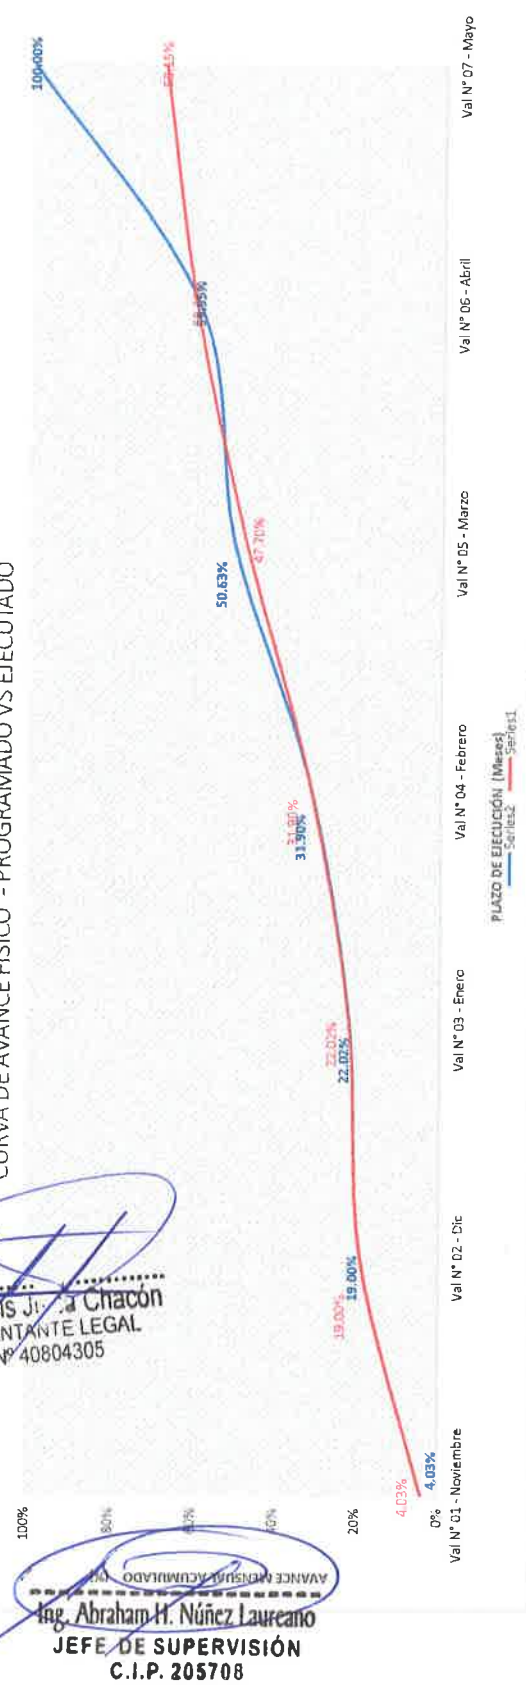

CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. La Totorá

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	19/05/2021	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.02%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.28	9.88%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 160,125.09	S/. 432,719.37	18.73%	50.63%
Val N° 06 - Abril	S/. 76,250.05	S/. 508,969.42	8.92%	59.55%
Val N° 07 - Mayo	S/. 345,658.88	S/. 854,658.30	40.45%	100.00%
TOTAL	S/. 854,658.30		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.03%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.27	9.87%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 135,055.51	S/. 407,649.78	15.80%	47.70%
Val N° 06 - Abril	S/. 108,301.34	S/. 515,951.12	12.67%	60.37%
Val N° 07 - Mayo	S/. 66,532.96	S/. 582,484.08	7.78%	68.15%
TOTAL	S/. 582,484.08		68.15%	68.15%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO



John Francis Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

JFJ
Consultor

John Francis JULCA CHACÓN

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

I.E.I EL PALMITO


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 305708


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


CURVA "S" FISICO - I.E.I. EL PALMITO

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA"	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	26/06/2021	

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)				
MES	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Dic	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 99,496.30	S/. 412,848.80	8.75%	36.29%
Val N° 06 - Abril	S/. 47,379.19	S/. 460,227.99	4.16%	40.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 334,656.23	S/. 794,884.22	29.41%	69.86%
Val N° 08 - Junio	S/. 342,877.59	S/. 1,137,761.81	30.14%	100.00%
TOTAL	S/. 1,137,761.81		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)				
MES	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	PORCENTAJES ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Dic	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 86,091.28	S/. 399,443.79	7.57%	35.11%
Val N° 06 - Abril	S/. 24,403.94	S/. 423,847.73	2.14%	37.25%
Val N° 07 - Mayo	S/. 39,080.40	S/. 462,928.13	3.43%	40.69%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 462,928.13	0.00%	40.69%
TOTAL	S/. 462,928.13		40.69%	40.69%

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

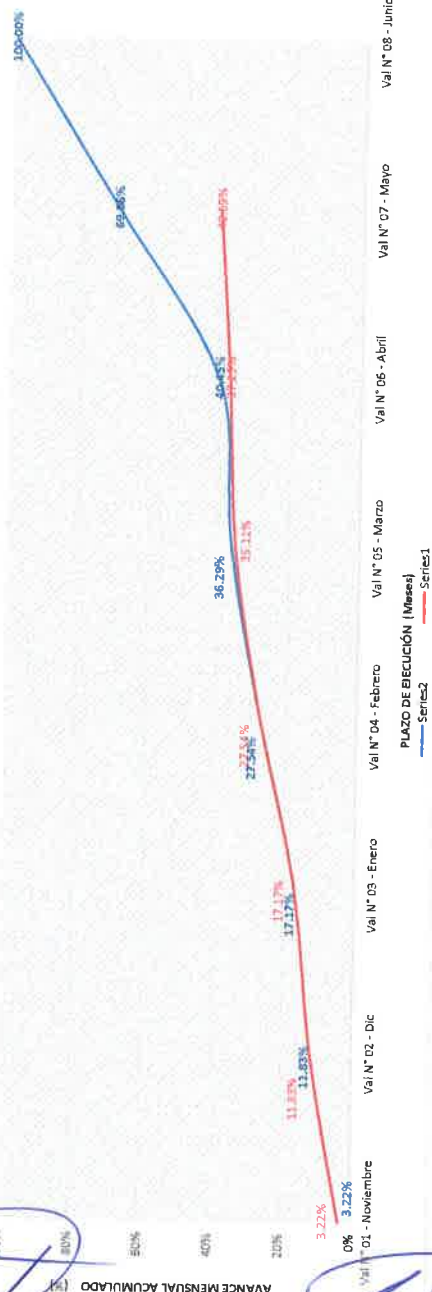

John Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

OBRA	
"INSTALACION DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NUÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	13/11/2020
TERMINO DE OBRA	26/05/2021

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 99,496.30	S/. 412,848.80	8.75%	36.29%
Val N° 06 - Abril	S/. 47,379.19	S/. 460,227.99	4.16%	40.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 334,656.23	S/. 794,884.22	29.41%	69.86%
Val N° 08 - Junio	S/. 342,877.59	S/. 1,137,761.81	30.14%	100.00%
TOTAL	S/. 1,137,761.81		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 96,091.28	S/. 398,443.79	7.57%	35.11%
Val N° 06 - Abril	S/. 24,403.94	S/. 423,847.73	2.14%	37.25%
Val N° 07 - Mayo	S/. 39,080.40	S/. 462,928.13	3.43%	40.69%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 462,928.13	0.00%	40.69%
TOTAL	S/. 462,928.13		40.69%	40.69%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

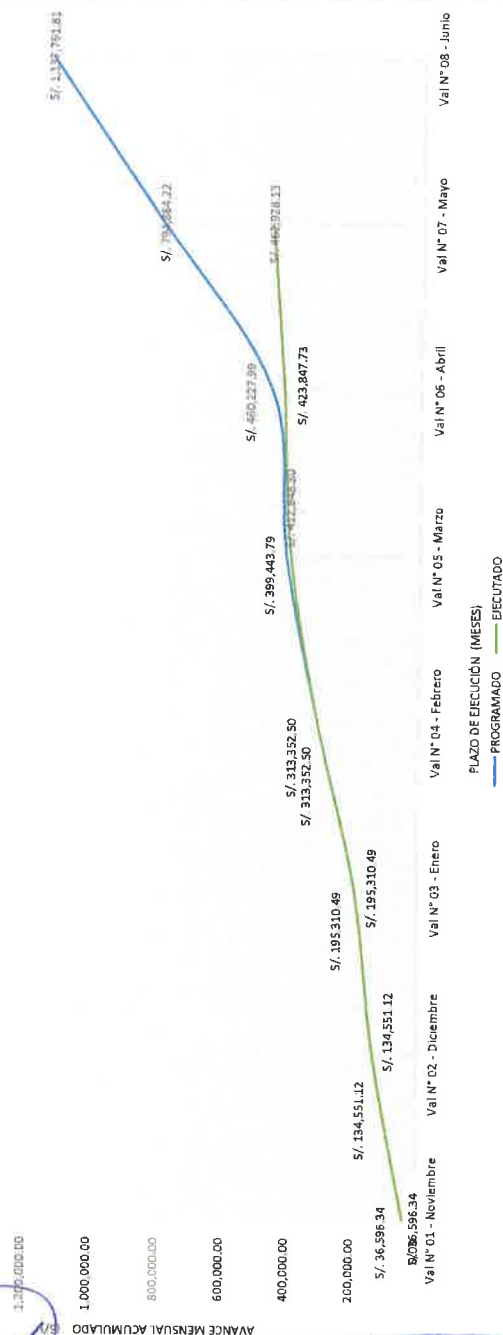

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: Nº 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

JFJ
Consultor

John Francis JULCA CHACÓN

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

I.E.I TALLAPAMPA


Ing. Abraham H. Núñez-Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA "S" FISICO - I.E.I. TALLAPAMPA	
OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAL-GGR.
INICIO DE OBRA	14/11/2020
TERMINO DE OBRA	26/06/2021

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)				
MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Dic	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.83	10.68%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 82,098.59	S/. 296,290.42	8.92%	32.20%
Val N° 06 - Abril	S/. 39,094.56	S/. 335,384.98	4.25%	36.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 280,787.47	S/. 596,172.45	28.34%	64.79%
Val N° 08 - Junio	S/. 323,933.37	S/. 920,105.82	35.21%	100.00%
TOTAL	S/. 920,105.82		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)				
MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Dic	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.84	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 180,596.15	S/. 394,787.99	19.63%	42.91%
Val N° 06 - Abril	S/. 51,473.28	S/. 446,261.27	5.59%	48.50%
Val N° 07 - Mayo	S/. 52,755.77	S/. 499,017.04	5.73%	54.23%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 499,017.04	0.00%	54.23%
TOTAL	S/. 499,017.04		54.23%	54.23%

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

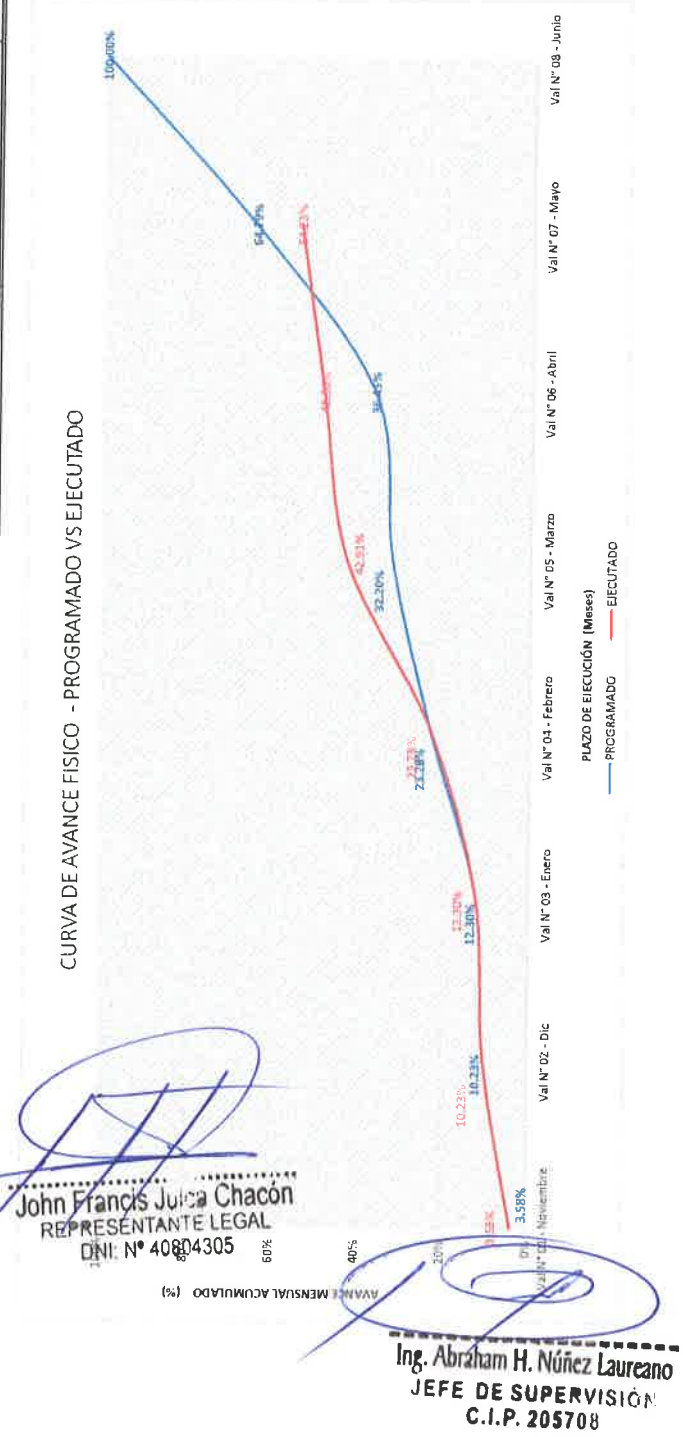


CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. TALLAPAMPA	
OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	14/11/2020
TERMINO DE OBRA	26/06/2021

MES	MONTO		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.84	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 180,596.15	S/. 394,787.99	19.63%	42.91%
Val N° 06 - Abril	S/. 51,473.28	S/. 446,261.27	5.59%	48.50%
Val N° 07 - Mayo	S/. 52,755.77	S/. 499,017.04	5.73%	54.23%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 499,017.04	0.00%	54.23%
TOTAL	S/. 499,017.04		54.23%	54.23%

MES	MONTO		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.83	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 82,098.59	S/. 296,290.42	8.92%	32.20%
Val N° 06 - Abril	S/. 39,094.56	S/. 335,384.98	4.25%	36.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 260,787.47	S/. 596,172.45	28.34%	64.79%
Val N° 08 - Junio	S/. 323,933.37	S/. 920,105.82	35.21%	100.00%
TOTAL	S/. 920,105.82		100.00%	

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

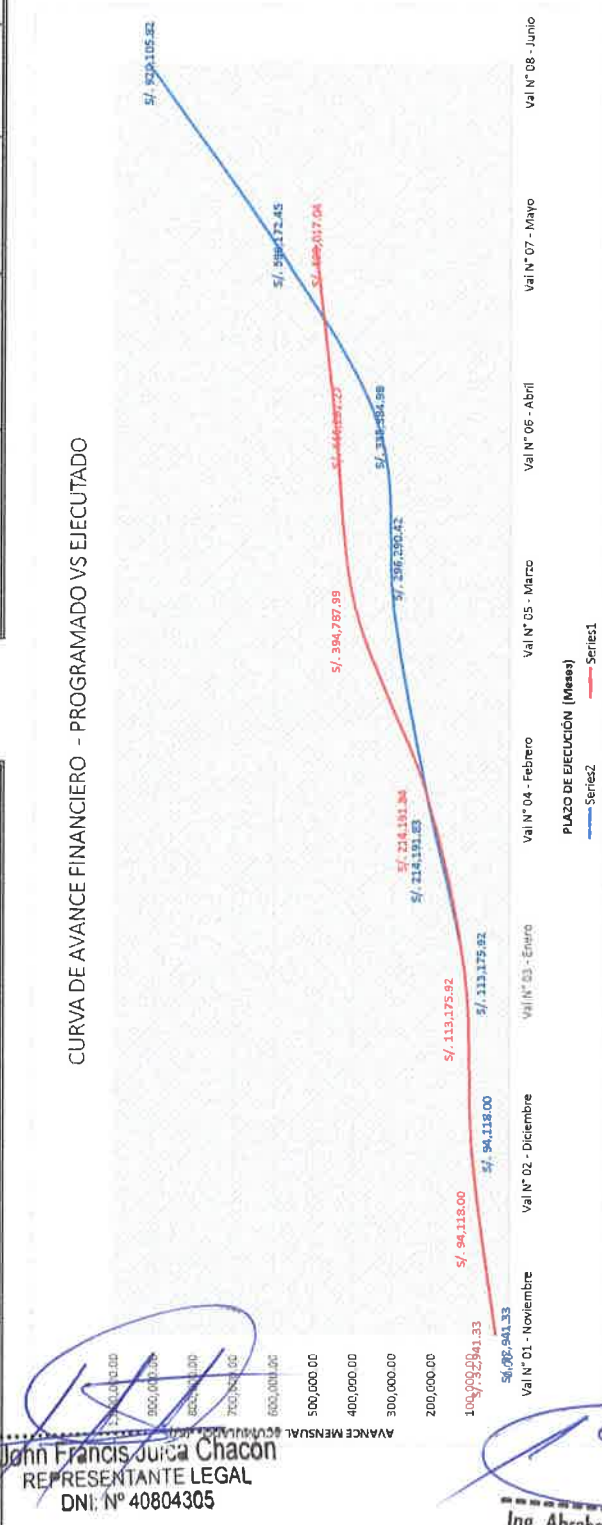

John Francis Juica Chacon
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.



Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista

- **AVANCE FISICO POR PARTIDAS.**

El avance físico realizado se detalla en la valorización.

- **ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA**

ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA FISICO VALORIZADO – EJECUTADO REALIZADA:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO: **77.11%**

- I.E.I. TOTORA: 100.00%.
- I.E.I. EL PALMITO: 69.86%.
- I.E.I. TALLAPAMPA: 64.79%

AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO: **53.03%**

- I.E.I. LA TOTORA: 68.15%
- I.E.I. EL PALMITO: 40.69%
- I.E.I. TALLAPAMPA: 54.23%

La obra, de acuerdo con el cronograma valorizado Acelerado de avance físico programado de obra se debería encontrar en un 77.11 % acumulado, sin embargo, el avance físico ejecutado se encuentra al 53.03% del avance de obra.

- **COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL AVANCE**

- La obra en el mes de mayo presentó un avance ejecutado de 5.44 % de acuerdo al presupuesto contratado.
- El avance físico programado en el mes de mayo fue de 32.31 %.
- En el mes de mayo hubo retraso por segunda vez, con respecto a la programación del calendario acelerado, por lo tanto, la obra se encuentra en atraso y se procederá según al art. 203.- Demoras injustificadas en la ejecución de la obra. "...dicho atraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra".


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

JFJ
Consultor

John Francis JULCA CHACÓN

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

I.E.I LA TOTORA

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

John Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA "S" FISICO - I.E.I. LA TOTORA

OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATISTA CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

SUPERVISOR ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO


CONTRATO 004-2020-GRCAJ-GGR.

INICIO DE OBRA 13/11/2020

TERMINO DE OBRA 19/05/2021

MES	MONITOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			MONITOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)		
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PORCENTAJES PARCIAL %	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PORCENTAJES PARCIAL %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%
Val N° 02 - Dic	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.02%	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.03%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.28	9.88%	S/. 84,364.08	S/. 272,594.27	22.02%
Val N° 05 - Marzo	S/. 160,125.09	S/. 432,719.37	18.73%	S/. 135,055.51	S/. 407,649.78	9.87%
Val N° 06 - Abril	S/. 76,250.05	S/. 508,969.42	8.92%	S/. 108,301.34	S/. 515,951.12	15.80%
Val N° 07 - Mayo	S/. 345,688.88	S/. 854,658.30	40.45%	S/. 565,532.96	S/. 582,484.08	12.67%
TOTAL	S/. 854,658.30		100.00%	S/. 582,484.08		68.15%

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

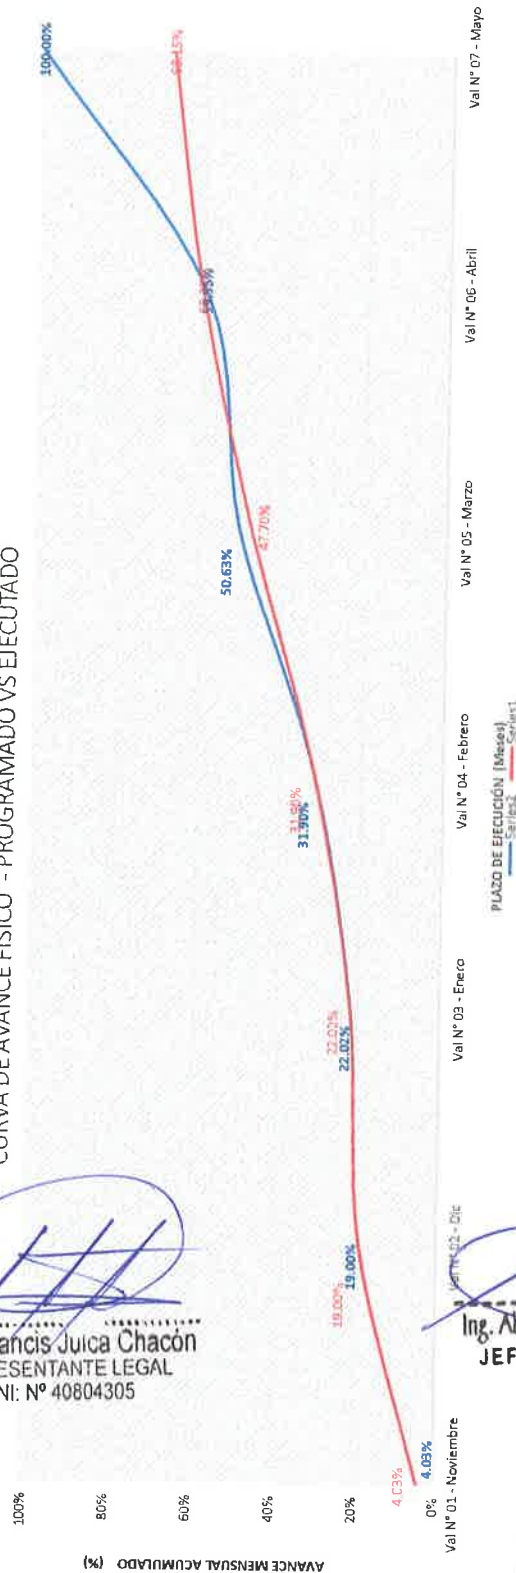

Ing. Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708


CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. La Totorá

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	19/05/2021	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.02%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.28	9.88%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 160,125.09	S/. 432,719.37	18.73%	50.63%
Val N° 06 - Abril	S/. 76,250.05	S/. 508,969.42	8.92%	59.55%
Val N° 07 - Mayo	S/. 345,688.88	S/. 854,658.30	40.45%	100.00%
TOTAL	S/. 854,658.30		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 34,416.33	S/. 34,416.33	4.03%	4.03%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 127,942.24	S/. 162,358.57	14.97%	19.00%
Val N° 03 - Enero	S/. 25,871.63	S/. 188,230.20	3.03%	22.02%
Val N° 04 - Febrero	S/. 84,364.08	S/. 272,594.27	9.87%	31.90%
Val N° 05 - Marzo	S/. 135,035.51	S/. 407,629.78	15.80%	47.70%
Val N° 06 - Abril	S/. 108,301.34	S/. 515,931.12	12.67%	60.37%
Val N° 07 - Mayo	S/. 66,532.96	S/. 582,464.08	7.78%	68.15%
TOTAL	S/. 582,464.08		68.15%	68.15%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

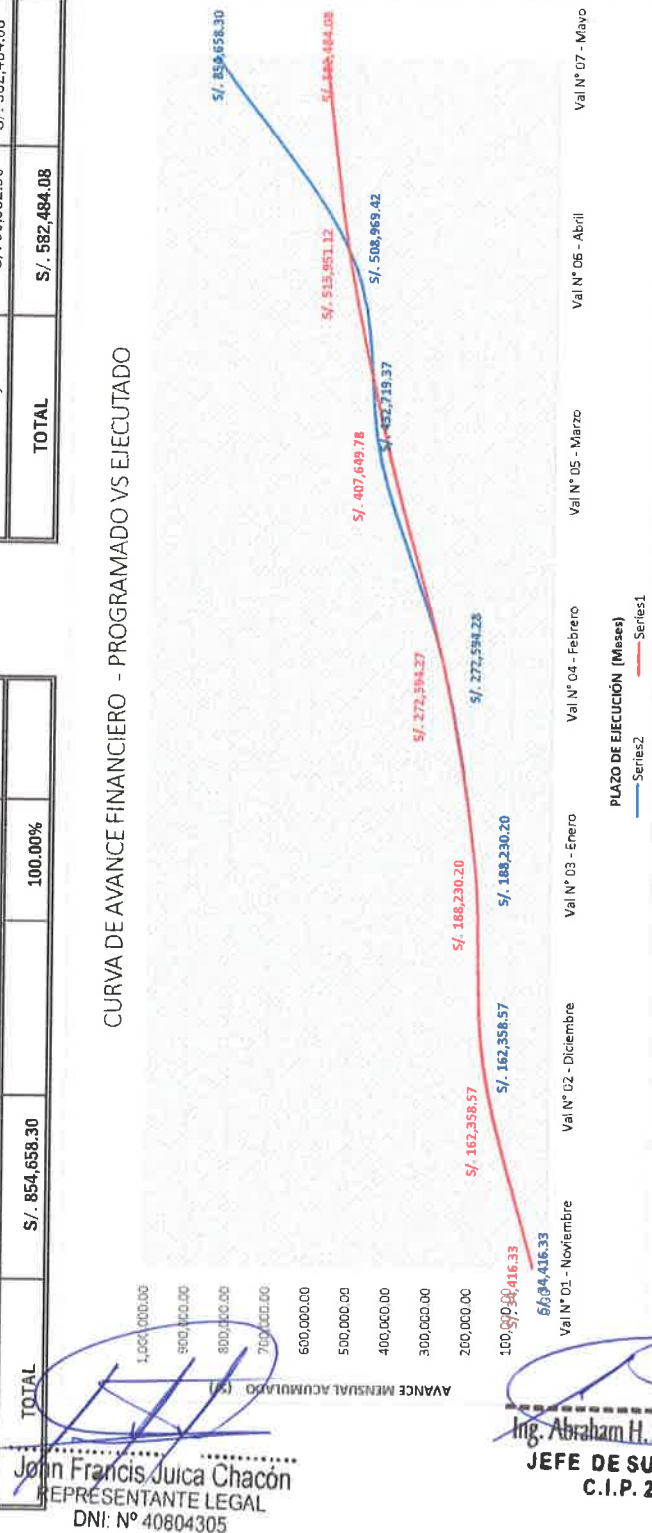

John Francis Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 205708

JFJ
Consultor

John Francis JULCA CHACÓN

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

I.E.I EL PALMITO


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205706


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


CURVA "S" FISICO - I.E.I. EL PALMITO

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGION CAJAMARCA"	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRC AJ-GGR	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	26/06/2021	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Dic	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 99,496.30	S/. 412,848.80	8.75%	36.29%
Val N° 06 - Abril	S/. 47,379.19	S/. 460,227.99	4.16%	40.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 334,656.23	S/. 794,884.22	29.41%	69.86%
Val N° 08 - Junio	S/. 342,877.59	S/. 1,137,761.81	30.14%	100.00%
TOTAL	S/. 1,137,761.81		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 36,596.34	S/. 36,596.34	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Dic	S/. 97,954.78	S/. 134,551.12	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/. 60,759.37	S/. 195,310.49	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/. 118,042.01	S/. 313,352.50	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/. 86,091.28	S/. 399,443.79	7.57%	35.11%
Val N° 06 - Abril	S/. 24,403.94	S/. 423,847.73	2.14%	37.25%
Val N° 07 - Mayo	S/. 39,080.40	S/. 462,928.13	3.43%	40.69%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 462,928.13	0.00%	40.69%
TOTAL	S/. 462,928.13		40.69%	40.69%

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

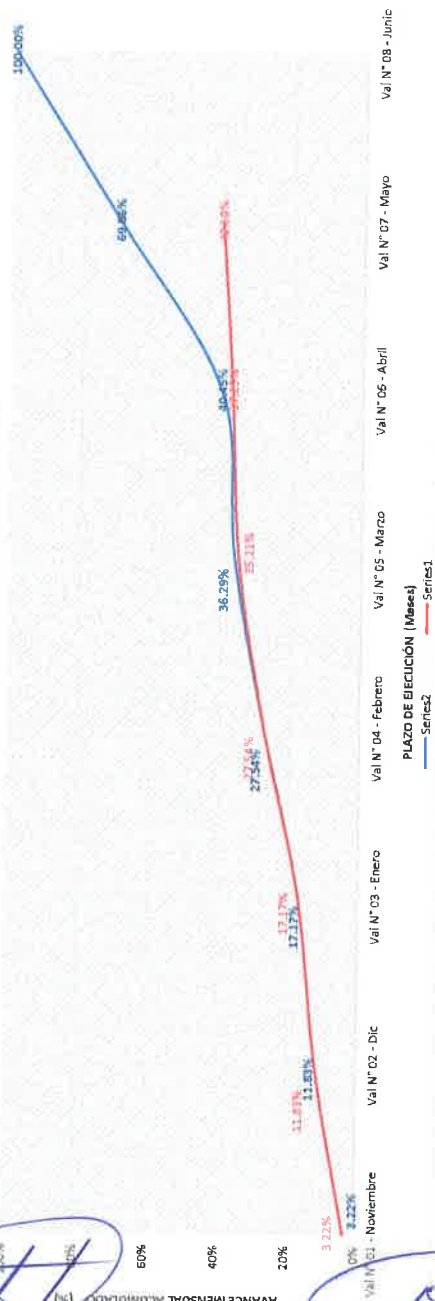

John Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708


CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. El Palmito

OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"	
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO	
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.	
INICIO DE OBRA	13/11/2020	
TERMINO DE OBRA	25/05/2021	

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	%	PARCIAL %	ACUMUL %
Val N° 01 - Noviembre	S/ 36,596.34	S/ 36,596.34	3.22%	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Diciembre	S/ 97,954.78	S/ 134,551.12	8.61%	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/ 60,759.37	S/ 195,310.49	5.34%	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/ 118,042.01	S/ 313,352.50	10.37%	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/ 99,496.20	S/ 412,848.80	8.75%	8.75%	36.29%
Val N° 06 - Abril	S/ 47,379.19	S/ 460,227.99	4.16%	4.16%	40.45%
Val N° 07 - Mayo	S/ 334,656.23	S/ 794,884.22	29.41%	29.41%	69.86%
Val N° 08 - Junio	S/ 342,877.59	S/ 1,137,761.81	30.14%	30.14%	100.00%
TOTAL	S/ 1,137,761.81		100.00%		

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (SIN IGV)			PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	%	PARCIAL %	ACUMUL %
Val N° 01 - Noviembre	S/ 36,596.34	S/ 36,596.34	3.22%	3.22%	3.22%
Val N° 02 - Diciembre	S/ 97,954.78	S/ 134,551.12	8.61%	8.61%	11.83%
Val N° 03 - Enero	S/ 60,759.37	S/ 195,310.49	5.34%	5.34%	17.17%
Val N° 04 - Febrero	S/ 118,042.01	S/ 313,352.50	10.37%	10.37%	27.54%
Val N° 05 - Marzo	S/ 96,091.28	S/ 399,443.79	7.57%	7.57%	35.11%
Val N° 06 - Abril	S/ 24,403.94	S/ 423,847.73	2.14%	2.14%	37.25%
Val N° 07 - Mayo	S/ 39,080.40	S/ 462,928.13	3.43%	3.43%	40.69%
Val N° 08 - Junio	S/ 0.00	S/ 462,928.13	0.00%	0.00%	40.69%
TOTAL	S/ 462,928.13		40.69%		40.69%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

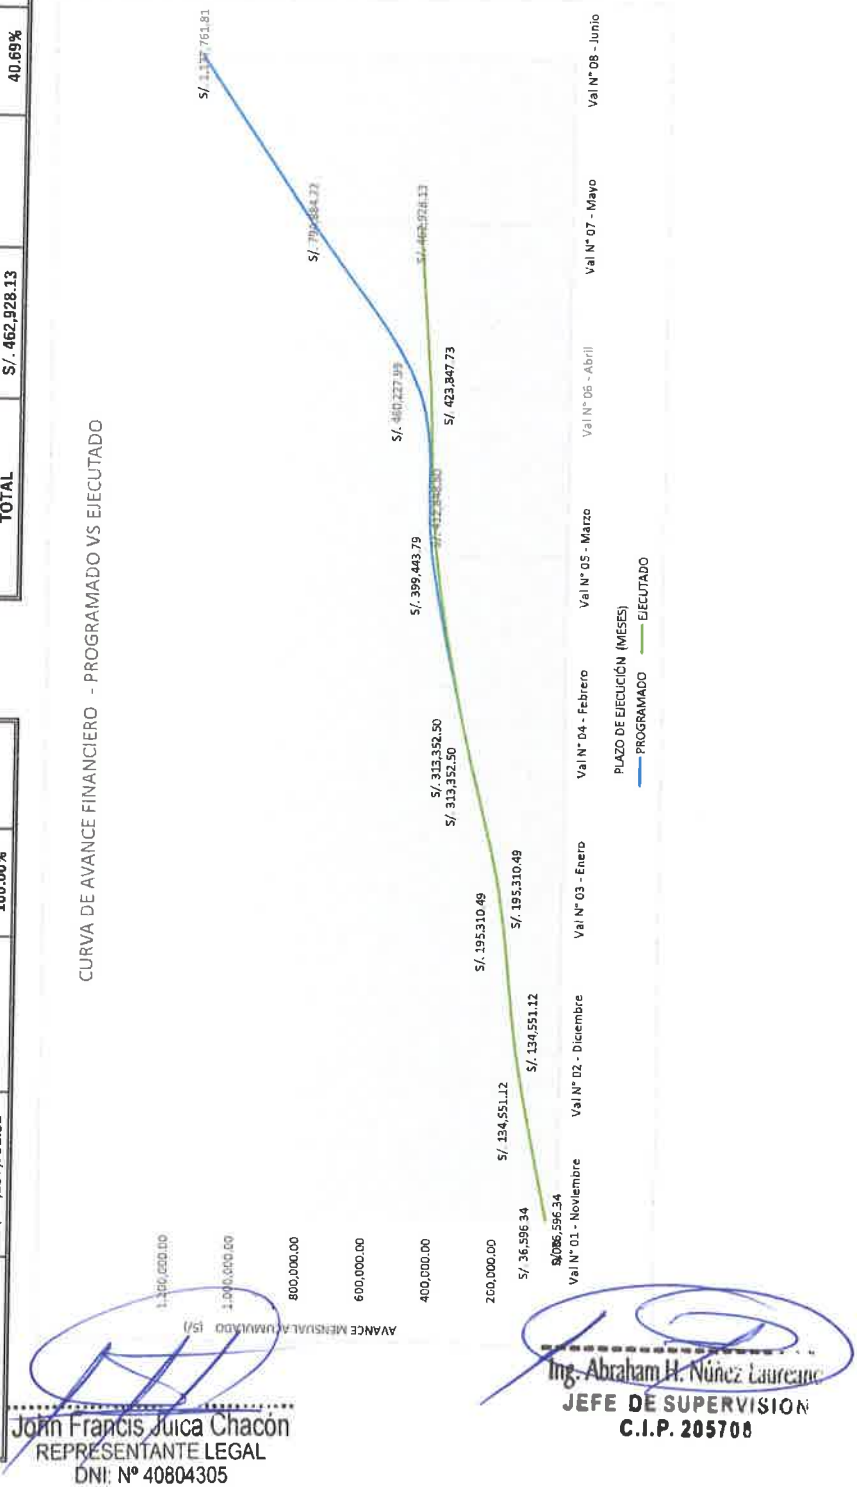

JFJ
Consultor

John Francis JULCA CHACÓN

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

I.E.I TALLAPAMPA


Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CURVA "S" FISICO - I.E.I. TALLAPAMPA	
OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	14/11/2020
TERMINO DE OBRA	26/05/2021

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/ 32,941.33	S/ 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Dic	S/ 61,176.67	S/ 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/ 19,057.92	S/ 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/ 101,015.91	S/ 214,191.84	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/ 180,596.15	S/ 394,787.99	19.63%	42.91%
Val N° 06 - Abril	S/ 51,473.28	S/ 446,261.27	5.59%	48.50%
Val N° 07 - Mayo	S/ 52,755.77	S/ 499,017.04	5.73%	54.23%
Val N° 08 - Junio	S/ 0.00	S/ 499,017.04	0.00%	54.23%
TOTAL	S/ 499,017.04		54.23%	54.23%

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/ 32,941.33	S/ 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Dic	S/ 61,176.57	S/ 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/ 19,057.92	S/ 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/ 101,015.91	S/ 214,191.83	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/ 82,098.59	S/ 296,290.42	8.92%	32.20%
Val N° 06 - Abril	S/ 39,094.56	S/ 335,384.98	4.25%	36.45%
Val N° 07 - Mayo	S/ 260,787.47	S/ 596,172.45	28.34%	64.79%
Val N° 08 - Junio	S/ 323,933.37	S/ 920,105.82	35.21%	100.00%
TOTAL	S/ 920,105.82		100.00%	

CURVA DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

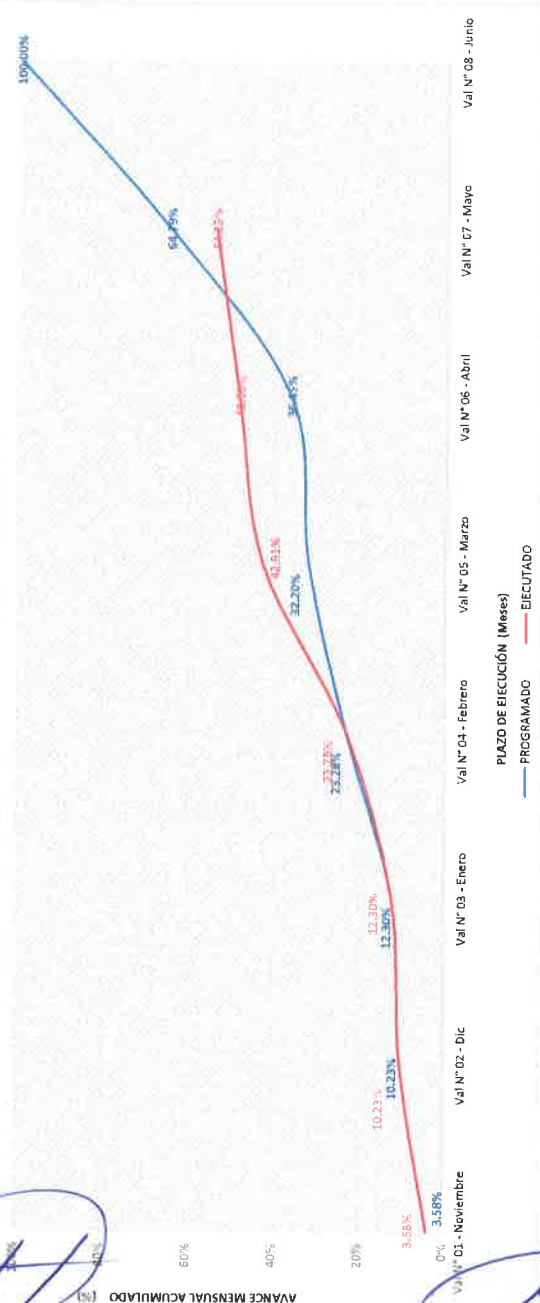

Ing. Francis Juica Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI N° 40804305

Ing. Abraham H. Núñez Laureano
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 205708

CURVA "S" FINANCIERO - I.E.I. TALLAPAMPA	
OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA".
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
SUPERVISOR	ING. ABRAHAM NÚÑEZ LAUREANO
CONTRATO	004-2020-GRCAJ-GGR.
INICIO DE OBRA	14/11/2020
TERMINO DE OBRA	26/06/2021

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.83	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 82,098.59	S/. 296,290.42	8.92%	32.20%
Val N° 06 - Abril	S/. 39,094.56	S/. 335,384.98	4.25%	36.45%
Val N° 07 - Mayo	S/. 260,787.47	S/. 596,172.45	28.34%	64.79%
Val N° 08 - Junio	S/. 323,933.37	S/. 920,105.82	35.21%	100.00%
TOTAL	S/. 920,105.82		100.00%	

MES	MONTOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Val N° 01 - Noviembre	S/. 32,941.33	S/. 32,941.33	3.58%	3.58%
Val N° 02 - Diciembre	S/. 61,176.67	S/. 94,118.00	6.65%	10.23%
Val N° 03 - Enero	S/. 19,057.92	S/. 113,175.92	2.07%	12.30%
Val N° 04 - Febrero	S/. 101,015.91	S/. 214,191.84	10.98%	23.28%
Val N° 05 - Marzo	S/. 180,596.15	S/. 394,787.99	19.63%	42.91%
Val N° 06 - Abril	S/. 51,473.28	S/. 446,261.27	5.59%	48.50%
Val N° 07 - Mayo	S/. 52,755.77	S/. 499,017.04	5.73%	54.23%
Val N° 08 - Junio	S/. 0.00	S/. 499,017.04	0.00%	54.23%
TOTAL	S/. 499,017.04		54.23%	54.23%

CURVA DE AVANCE FINANCIERO - PROGRAMADO VS EJECUTADO

