

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Celendín, 20 de diciembre del 2021

CARTA N°161-2021-CGLL/CO

Señores:

ING. LORD POMPEO AZAÑEDO ALCANTARA
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Pte.

Asunto : VALORIZACIÓN N° 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

Referencia

- a) INFORME N°63-2021-GORECA/SUP/LHCC
- b) CARTA N°0065-CCDMI-GRC-2021
- c) OBRA: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA”
- d) CONTRATO N°007-2021.GR.CAJ-GGR
- e) CONTRATO N°003-2020.GR.CAJ-GGR

Por medio de la presente permítame saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de la referencia a), sobre el informe de Valorización N° 14 del contrato principal correspondiente al periodo de DICIEMBRE del 2021, presentado extemporáneamente por el contratista mediante carta de la referencia b), las mismas que son similares a los cálculos presentados por la supervisión mediante carta de la referencia c) para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA”.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente


César Istidro Guanilo Llerena
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.R. Nº. 444

.....

ING. CESAR GUANILO LLERENA
CONSULTOR DE OBRAS

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	
--	---	---

INFORME N°063 -2021- GORECA/-SUP /LHCC

A : ING. VÍCTOR ANTONIO CENTA CUEVA
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE : ARQ. LEONARDO HAGLER CIERTO CALDERÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACIÓN N°14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021
 OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE
 EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN,
 REGIÓN CAJAMARCA"

REFERENCIA:

- a) Contrato de Obra: CONTRATO N°003-2020.GR.CAJ-GGR
- b) Contrato de Supervisión de Obra: CONTRATO N°007-2021.GR.CAJ-GGR
- c) CARTA N°0065-CCDMI-GRC-2021


 ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CAP 18325

FECHA : 20 de diciembre del 2021

Por el presente me dirijo a usted, a fin de informar que mediante el documento de la referencia c) el contratista **CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE I** solicita el pago de la **VALORIZACIÓN N° 14**, correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del 2021 de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA", ubicada en el distrito de Celendín, provincia de Celendín, y departamento de Cajamarca; por lo que para dicho efecto formulo los siguientes alcances.

1. DATOS GENERALES

DEL CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO N° FECHA DE CONTRATO OBRA UBICACIÓN DISTRITO PROVINCIAL DEPARTAMENTO CONTRATISTA	: LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-GR.CAJ PRIMERA CONVOCATORIA : 003-2020-GR.CAJ-GGR. : 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020 : "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA" : CELENDÍN : CELENDÍN : CAJAMARCA : CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE I
--	--

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos
 CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
--	--	---

SUPERVISIÓN	: CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SISTEMA DE EJECUCIÓN	: SUMA ALZADA
FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS
VALOR REFERENCIAL (C/IGV)	: S/ 7,541,283.95
VALOR DEL CONTRATO (C/IGV)	: S/ 6,787,155.57
ADICIONAL DE OBRA N°01 (C/IGV)	: S/ 606,510.36 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000189-2021-GRC-GGR
NETO	: S/ 338,886.42 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000277-2021-GRC-GGR
ADICIONAL DE OBRA N°02 (C/IGV)	: 0.90000
NETO	: S/ 7,732,552.35
FACTOR DE RELACIÓN	: 270 DÍAS CALENDARIOS
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE	: 09/11/2020
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL	: 20/11/2020
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO	: 16/08/2021
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	
FECHA DE VENCIMIENTO	: 43 días calendarios
CONTRACTUAL	: 43 días calendarios aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°D000117-2021-GRC-GRI
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL	: 45 días calendarios aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°D000182-2021-GRC-GRI
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	: 32 días calendarios aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°D000181-2021-GRC-GRI
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01	: 16/08/2021
FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE	
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL	: 14/12/2021
MONTO DE ADELANTO DIRECTO	: S/ 1,018,073.33
MONTO TOTAL DE ADELANTO DE MATERIALES	: S/ 1,696,788.89



.....
ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERÓN
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

DEL CONTRATO DE SUPERVISION

PROCESO DEL SERVICIO	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2020-GR.CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
SUPERVISIÓN	: CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATO N°	: 007-2021-GR.CAJ-GGR.
FECHA DE CONTRATO	: 16 DE ABRIL DEL 2021
MONTO DE CONTRATO VIGENTE DEL SUPERVISOR	: S/ 206,389.46 INC / IGV
ADICIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01 (C/IGV)	: S/ 37,525.36 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000222-2021-GRC-GGR
ADICIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°02 (C/IGV)	: S/ S/ 49,947.04 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000318-2021-GRC-GGR
INICIO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 17 DE ABRIL DEL 2021
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FIN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	: 28 DE OCTUBRE DEL 2021
SISTEMA DE EJECUCIÓN	: TARIFAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL	: 30 días - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000144-2021-GRC-GRI

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos

CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLLCONSULTOR:
CESAR GUANILO LLERENAOBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN
CAJAMARCA**2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO****METAS DEL PROYECTO.** - La meta total del presente proyecto consiste en:**Demolición:**

- Demolición de los Modulo C, y D

Construcción:

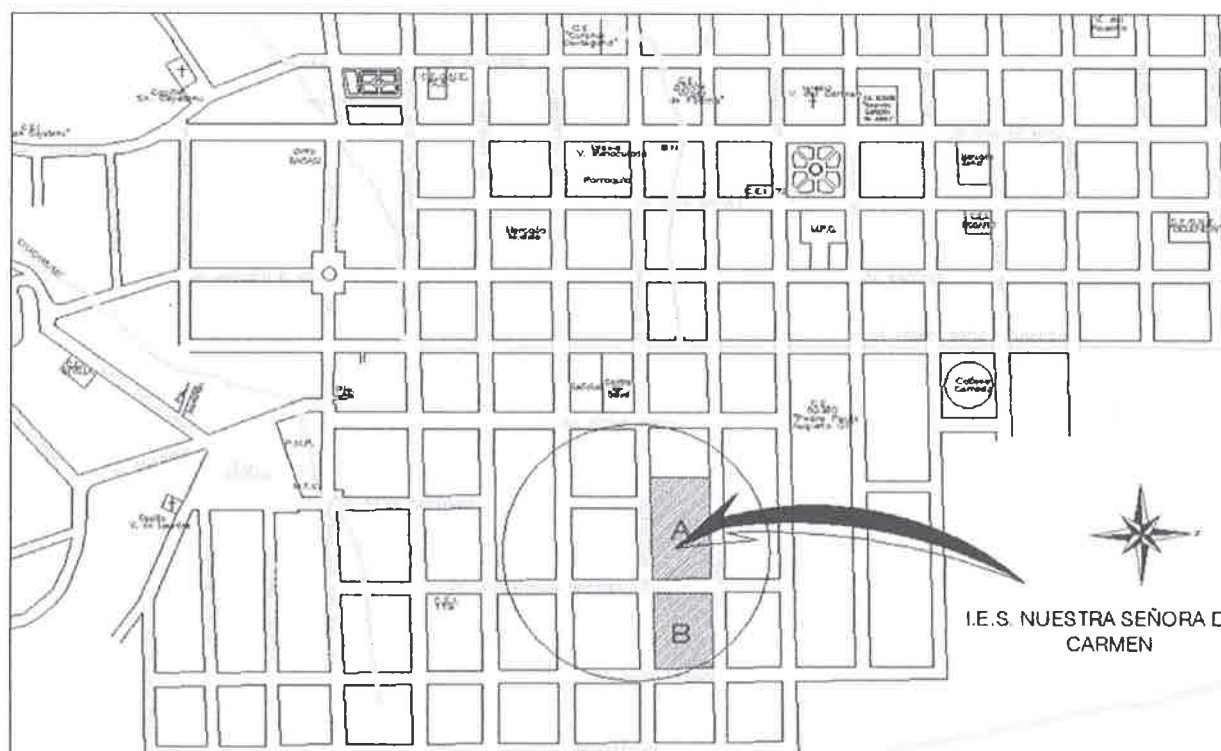
- Mejoramiento de los Módulos A, B y E
 - Construcción de Talleres en una Construcción de 02 Niveles
 - Construcción de Plataforma Deportiva Techada incluido un Atrio.
 - Construcción de 02 Graderíos de Concreto Armado.
- Mobiliario Escolar

2.1. LINDEROS Y DIMENSIONES

- Área según datos en campo del terreno B : 3,697.539 m²
- Perímetro del terreno según datos en campo B: 253.025 m
- Área según datos en campo del terreno A: 7051.181 m²
- Perímetro del terreno según datos en campo A: 399.884 m



ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

2.2. PLANO DE UBICACIÓN

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos

CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
---	---	---

2.3. VALOR CONTRATADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	165,536.70
02	ESTRUCTURAS	2,729,582.39
03	ARQUITECTURA	1,687,461.57
04	INSTALACIONES SANITARIAS	147,588.54
05	INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE VOZ Y DATA.	522,639.66
	COSTO DIRECTO DEL VALOR REFERENCIAL	5,252,808.86
	GASTOS GENERALES	288,904.79
	UTILIDAD	210,113.10
	SUB - TOTAL	5,751,826.75
	I.G.V. (18 %)	1,035,328.82
	TOTAL	6,787,155.57
	ADICIONAL DE OBRA N°01 NETO	606,510.36
	RES. GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000189-2021-GRC-GGR	
	ADICIONAL DE OBRA N° 02 NETO	338,886.42
	RES. GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000277-2021-GRC-GGR	
	NUEVO MONTO ACUMULADO	7,732,552.35

2.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento son recursos ordinarios

2.5. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada

2.6. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA


Se contabilizan 270 días calendarios (9 meses).

Ampliación de Plazo N° 01 por 43 días calendarios

Ampliación de Plazo N° 02 por 45 días calendarios

Ampliación de Plazo N° 03 por 32 días calendarios

Total 390 días calendarios.


.....
ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDE
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
--	---	---


ANTECEDENTES

a) Información del Proceso de Selección y Contrato

Como consecuencia del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2020-GR.CJ-PRIMERA CONVOCATORIA, convocado para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA", se otorgó la Buena Pro al contratista Consorcio CRUZ DE MOTUPE I, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma S/. 6,787,155.57 suscribiéndose el CONTRATO N°003-2020-GR.CAJ-GGR el día 02 de noviembre, el cual incluye las Bases Integradas.

b) Información de Resoluciones y Adendas suscritas modificando montos del contrato

A la fecha se emitieron las siguientes resoluciones:


ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN

b.1. Con fecha 15 de Julio mediante correo electrónico fue notificado mediante el Oficio N°D001343-2021-GRC-SG la RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000189-2021-GRC-GGR, mediante el cual la entidad aprueba: Artículo Primero aprobar la Prestación Adicional de obra N°01, Artículo Segundo Aprobar la prestación Deductivo Vinculante de Obra N°01, Artículo Tercero aprobar el Presupuesto Adicional Neto de obra N°01 por el monto de S/ 606,510.36 incluido IGV, por tanto, quedo subsanado el problema suscitado.

b.2. Mediante Resolución Gerencial Regional N°D000117-2021-GRC-GRI la entidad notifico declarar procedente La Ampliación de Plazo N°01, por 43 días.

b.3. La entidad mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D000222-2021-GRC-GGR, aprueba el Adicional N°01 de los servicios de supervisión.

b.4. Con fecha 02 de septiembre se aprueba el nuevo calendario de obra valorizada y cronograma de ejecución de obra (Diagrama GANTT y PERT -CPM) mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° D00138-2021-GRR-GR.

b.5. con fecha 30 de septiembre la entidad mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D000277-2021-GRC-GG aprobó:

Art. Primero: APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 02, siendo la causal deficiencias del expediente técnico; tal y como, se advierte del Informe del Expediente de Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N° 02, siendo el Presupuesto de la Prestación Adicional de Obra N° 02, el monto de S/ 470,290.43 incluido el IGV.

Art. Segundo: APROBAR la Prestación de Deductivo Vinculante n° 02 se advierte del Informe del Expediente de Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N° 02, siendo el Presupuesto de la Prestación de Deductivo Vinculante N° 02, el monto de S/ 131,404.01 incluido el IGV.

Art. Tercero: APROBAR el presupuesto Adicional neto de la obra contenida en el Expediente Adicional de Obra y Deductivo Vinculante N° 02, siendo el Presupuesto Adicional Neto de Obra, el monto de S/ 338,886.42 incluido el IGV, siendo la incidencia total del 4,99% del monto contratado.

b.6. Mediante Resolución Gerencial Regional N°D000182-2021-GRC-GRI la entidad notifico declarar procedente La Ampliación de Plazo N°02, por 45 días.

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
--	---	--

b.7. Mediante Resolución Gerencial Regional N°D000181-2021-GRC-GRI la entidad notifico declarar procedente La Ampliación de Plazo N°03, por 32 días.

c) **Documento del Contratista presentando la solicitud de pago de la Valorización**

Mediante CARTA N°0065-CCDMI-GRC-2021 del día 20 de diciembre del 2021, el Representante Legal del CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE I, presenta la solicitud de pago de la Valorización N°14 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA" la suma resultante de los cálculos es de S/. 215,172.09 (doscientos quince mil ciento setenta y dos con 09/100 soles) que corresponden a los trabajos ejecutados al mes de DICIEMBRE DEL 2021, la cual se deriva para su revisión y trámite administrativo.

d) **Otros que se considere necesario**

Esta supervisión CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA comienza sus actividades el 17 de abril del 2021 encontrando la obra avanzada al 31.68% acumulado al mes de marzo, a la fecha la anterior supervisión y la entidad aprobaron 5 valorizaciones.

ARQ. LEONARDO H. CIENTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

ANÁLISIS

- a) El Contratista presento los cálculos de la Valorización N° 14 correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2021, teniendo en consideración el Decreto de Urgencia N° 107-2021.

Artículo 2.- Autorización para realizar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obras

2.1. Autorízase a las entidades de los tres niveles de gobierno a acordar con los contratistas modificaciones relacionadas con la periodicidad del pago de las valorizaciones, correspondiente al mes de diciembre del 2021 en los contratos vigentes, de ejecución y supervisión de obras, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y que formen parte de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

2.2. La modificación de los contratos se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de contratación aplicable a cada contrato. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021.

- b) El Monto máximo a valorizar es de: S/. 215,172.09 (doscientos quince mil ciento setenta y dos con 09/100 soles)

- c) En el presente mes se ejecutaron las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	MET.	METRADO			% AVA.	SAL MET.
			BASE	ANT	ACT	ACUM		
01	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.02	MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS							
01.02.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	GLB	1.00	0.95	0.05	1.00	100%	
02	ESTRUCTURAS							
02.02	ESTRUCTURAS - COLISEO							
02.02.06.01.03	CONCRETO SIMPLE							
02.02.06.01.03.01	LOSA DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 E=15 CM	m2	583.25	337.80	245.45	583.25	100%	
02.02.06.01.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN SARDINEL DE PLATAFORMA	m3	7.84	3.25	4.59	7.84	100%	
02.02.06.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	56.80	31.00	25.80	56.80	100%	
02.02.06.01.04.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	583.25	337.80	245.45	583.25	100%	
02.02.06.02.03.01	LOSA DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=10CM	m2	406.75	206.65	200.10	406.75	100%	
02.02.06.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	134.50	75.48	59.02	134.50	100%	

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos

CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLLCONSULTOR:
CESAR GUANILO LLERENAOBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN
CAJAMARCA

A tu servicio con transparencia

02.02.06.02.04.01	CURADO DE OBRAS DE CONCRETO	m2	134.50	87.55	46.95	134.50	100%	
03	ARQUITECTURA							
03.01	ARQUITECTURA - TALLERES							
03.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
03.01.01.03	COLUMNETA DRYWALL	m2	30.10		30.10	30.10	100%	
03.01.06	JUNTAS DE DILATACION							
03.01.06.03	JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS E=1"	m	450.57	325.80	124.77	450.57	100%	
03.01.09	CARPINTERIA DE MADERA							
03.01.09.01	PUERTA DE CEDRO ENTABLERADA	m2	73.89	58.80	15.09	73.89	100%	
03.01.09.03	PUERTA DE MADERA DE CEDRO PARA MESAS DE CONCRETO	m2	37.53	28.58	8.95	37.53	100%	
03.01.11	CERRAJERIA							
03.01.11.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" EN PUERTA	und	100.00	48.00	52.00	100.00	100%	
03.01.11.02	CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA	und	25.00	12.00	13.00	25.00	100%	
03.01.11.03	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	25.00	12.00	13.00	25.00	100%	
03.01.13	PINTURA							
03.01.13.01	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIORES	m2	1,044.20	795.10	249.10	1,044.20	100%	
03.01.13.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIORES	m2	3,440.94	2,851.79	589.15	3,440.94	100%	
03.01.14	OTROS							
03.01.14.01	TAPAJUNTA EN PASADIZO DE CIRCULACIÓN	m	31.98		31.98	31.98	100%	
03.01.14.02	TAPAJUNTA EN VIGA Y MURO	m	115.02		115.02	115.02	100%	
03.01.15	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
03.01.15.01	PATIO, JARDINE Y RAMPAS							
03.01.15.01.02	OTROS							
03.01.15.01.02.02	SEMBRADO DE GRASS KIKUYO	m2	269.73	105.20	164.53	269.73	100%	
03.02	ARQUITECTURA - COLISEO							
03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
03.02.01.03	TABICERIA CON DRYWALL	m2	51.91		51.91	51.91	100%	
03.02.06	JUNTAS DE DILATACION							
03.02.06.02	JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS E=1"	m	28.74		28.74	28.74	100%	
03.02.09	CARPINTERIA DE MADERA							
03.02.09.02	MESA DE ATENCION EN COCINA DE MELAMINE	und	1.00	0.50	0.50	1.00	100%	
03.02.11	CERRAJERIA							
03.02.11.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 4"X4" EN PUERTA	und	32.00		32.00	32.00	100%	
03.02.11.02	CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA	und	8.00		8.00	8.00	100%	
03.02.11.03	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	8.00		8.00	8.00	100%	
03.02.12	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
03.02.12.01	VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO	p2	373.96		185.00	185.00	49%	188.96
03.02.13	PINTURA							
03.02.13.01	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIORES	m2	139.83	85.60	54.23	139.83	100%	
03.02.13.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIORES	m2	1,268.76	751.20	517.56	1,268.76	100%	
03.02.13.06	PINTURA EN MALLA OLIMPICA	m	89.00	42.50	46.50	89.00	100%	
03.02.15	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
03.02.15.01	PLATAFORMA DEPORTIVA							
03.02.15.01.01	JUNTAS							
03.02.15.01.01.01	SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN	m	120.00		120.00	120.00	100%	
03.02.15.01.01.02	SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION	m	140.00		140.00	140.00	100%	
03.02.15.02	PATIO, JARDINE Y RAMPAS							
03.02.15.02.01	CARPINTERIA METALICA							
03.02.15.02.01.02	PUERTA METALICA DE FIERRO P-11 (1.50X2.30 M)	und	1.00		1.00	1.00	100%	
03.02.15.02.01.03	PUERTA METALICA DE FIERRO P-12 (1.50X2.03 M)	und	1.00		1.00	1.00	100%	
03.02.15.02.01.04	BARANDA DE ESCALERAS	m	5.13		5.13	5.13	100%	
03.02.15.02.02	JUNTAS							
03.02.15.02.02.01	SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN	m	265.52		125.60	125.60	47%	139.92
03.02.15.02.03	OTROS							
03.02.15.02.03.01	BRUÑAS EN RAMPA	m	368.94	185.80	183.14	368.94	100%	
03.02.15.02.03.02	SEMBRADO DE GRASS KIKUYO	m2	12.83		12.83	12.83	100%	
03.03	ARQUITECTURA - ATRIO							
03.03.06	JUNTAS DE DILATACION							
03.03.06.02	JUNTA DE DILATACIÓN EN VEREDAS E=1"	m	9.90		9.90	9.90	100%	
03.03.09	CARPINTERIA DE MADERA							

ARG. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos

CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLLCONSULTOR:
CESAR GUANILO LLERENAOBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN
CAJAMARCA

03.03.09.01	PUERTA DE CEDRO ENTABLERADA	m2	16.34		16.34	16.34	100%	
03.03.09.03	BANCA DE MADERA	m2	3.22		3.22	3.22	100%	
03.03.10	CARPINTERIA METALICA							
03.03.10.06	BARANDA DE ESCALERAS	m	10.94		10.94	10.94	100%	
03.03.10.07	CANTONERA DE 47mm x 27mm x 6m	m	36.40		36.40	36.40	100%	
03.03.11	CERRAJERIA							
03.03.11.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 4"x4" EN PUERTA	und	24.00		24.00	24.00	100%	
03.03.11.02	CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA	und	6.00		6.00	6.00	100%	
03.03.11.03	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	6.00		6.00	6.00	100%	
03.03.12	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
03.03.12.01	VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO	p2	347.48		182.00	182.00	52%	165.48
03.03.13	PINTURA							
03.03.13.01	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIORES	m2	336.25	220.60	115.65	336.25	100%	
03.03.13.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIORES	m2	851.88	625.60	226.28	851.88	100%	
03.04	ARQUITECTURA - MEJORAMIENTO							
03.04.02	PISOS Y PAVIMENTOS							
03.04.02.01	PISO DE CONCRETO E=2", PULIDO SIN COLOREAR	m2	173.32	52.80	120.52	173.32	100%	
03.04.02.03	PISO DE MADERA MACHIMBRADA DE 5"x1"	m2	722.19	578.64	143.55	722.19	100%	
03.04.02.04	VEREDA E=4" DE CONCRETO, F'c=140 KG/CM2	m2	335.05	321.30	13.75	335.05	100%	
03.04.04	CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS							
03.04.04.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICA H=0.10 M	m	48.63	28.65	19.98	48.63	100%	
03.04.04.02	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4"x3"	m	407.85	225.80	182.05	407.85	100%	
03.04.04.03	ZOCALO DE CERAMICA	m2	23.66	23.66	-11.03	12.63	53%	11.03
03.04.06	CARPINTERIA DE MADERA							
03.04.06.01	PUERTA DE CEDRO ENTABLERADA	m2	76.69	38.20	0.29	38.49	50%	38.20
03.04.08	CERRAJERIA							
03.04.08.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 4"x4" EN PUERTA	und	152.00	76.00	76.00	152.00	100%	
03.04.08.02	BISAGRA CAPUCHINA DE 3"x3" EN PUERTA	und	81.00		81.00	81.00	100%	
03.04.08.03	CERRADURA DE DOS GOLPES EN PUERTA	und	38.00	19.00	19.00	38.00	100%	
03.04.08.04	MANIJA DE BRONCE DE 4"	und	27.00		27.00	27.00	100%	
03.04.08.05	CERROJO DE PUERTA DE BAÑOS	und	27.00		27.00	27.00	100%	
03.04.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES							
03.04.09.01	VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO	p2	2,489.42		673.15	673.15	27%	1,816.27
03.04.10	PINTURA							
03.04.10.01	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIORES	m2	2,130.74	1,706.40	-483.44	1,222.96	57%	907.78
03.04.10.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIORES	m2	1,789.33	1,475.80	-312.05	1,163.75	65%	625.58
04	INSTALACIONES SANITARIAS							
04.01	INSTALACIONES SANITARIAS - TALLERES							
04.01.01.06	LAVADERO DE 01 POZA DE ACERO INOXIDABLE	und	6.00	6.00		6.00	100%	
04.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA							
04.01.02.01.07	GRIFO PARA RIEGO DE 1/2"	und	2.00		2.00	2.00	100%	
04.01.02.02	ABASTECIMIENTO ALMACENAMIENTO EQUIPAMIENTO							
04.01.02.02.02	ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO DE 5.50M3 Y CISTERNA DE 12 M3	GLB	1.00		1.00	1.00	100%	
04.01.03	SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL							
04.01.03.07	PLANCHA DE METAL 3/32"	m2	10.35		10.35	10.35	100%	
04.01.03.08	REJILLA PARA CANAL DE EVACUACION DE AGUA DE LLUVIA A=0.48	m	152.00	85.60	66.40	152.00	100%	
04.02	INSTALACIONES SANITARIAS - COLISEO							
04.02.03	SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL							
04.02.03.01	TUBERIA DE BAJADA PVC 4"	m	66.40	18.00	24.20	42.20	64%	24.20
04.03	INSTALACIONES SANITARIAS - ATRIO							
05	INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE VOZ Y DATA.							
05.01	INSTALACIONES ELECTRICAS - TALLERES							
05.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ESTABILIZADORES DE TENSION							
05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TG TRIFASICO	und	1.00		1.00	1.00	100%	
05.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONTACTORES							
05.01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X6 mm2	m	364.94	125.00	239.94	364.94	100%	
05.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDAS PARA TOMACORRIENTES (INCL. AUT. SERVIDORES ELECTRICOS)							

ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal | Etapa – Los Olivos

CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLLCONSULTOR:
CESAR GUANILO LLERENAOBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN
CAJAMARCA

A tu servicio con transparencia

05.01.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE - SCHUKO+TRES EN LINEA) DE 16A, 2P+T 250V PARA PISO	und	14.00	5.00	9.00	14.00	100%	
05.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
05.01.11.01	ARTEFACTO (LUMINARIA) INTERIOR C/02 LAMP. FLUORESCENTES 2X36W, CON REJILLA Y PANTALLA REFLECTIVA PARA ADOSAR	und	60.00		60.00	60.00	100%	
05.01.11.02	ARTEFACTO (LUMINARIA) INTERIOR C/02 LAMP. FLUORESCENTES 2X36W, CON REJILLA Y PANTALLA REFLECTIVA PARA SUSPENDER	und	60.00		60.00	60.00	100%	
05.01.11.03	LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO IP65 DE C/01 LAMPARA FLUORESCENTE DE 1x36W PARA ADOSAR	und	34.00		34.00	34.00	100%	
05.01.11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR C/ LAMPARAS AHORRADORAS 2x22W, PARA ADOSAR EN PARE	und	3.00		3.00	3.00	100%	
05.01.11.05	ARTEFACTO (LUMINARIA) INTERIOR TIPO AHORRADOR 1X22W	und	7.00		7.00	7.00	100%	
05.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA							
05.01.14	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INUNDACIONES							
05.01.14.07	CAJAS DE PASO RECTANGULAR DE FºGº DE 100x100x50mm	und	47.00	37.00	10.00	47.00	100%	
05.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y RED DE DATOS							
05.01.15.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP LIBRE DE HALOGENOS, 550MHZ CAT 5E	m	516.76	256.60	75.00	331.60	64%	185.16
05.02	INSTALACIONES ELECTRICAS - COLESEO							
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES							
05.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X2.5mm2	m	971.89	385.00	586.89	971.89	100%	
05.02.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X4mm2	m	673.20	225.00	448.20	673.20	100%	
05.02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X6 mm2	m	127.82	52.00	75.82	127.82	100%	
05.02.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 16mm2	m	5.06	3.00	2.06	5.06	100%	
05.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC SAP							
05.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (ELECTRICIDAD) D=20mm Y ACCESORIOS	m	530.00	455.00	75.00	530.00	100%	
05.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (ELECTRICIDAD) D=40mm Y ACCESORIOS	m	58.10	25.00	33.10	58.10	100%	
05.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDAS DE CENTROS DE LUZ (INCL. ACCESORIOS ELECTRICOS)							
05.02.06.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA REFLECTORES DE 400W	pto	12.00		12.00	12.00	100%	
05.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
05.02.11.01	ARTEFACTO (LUMINARIA) INTERIOR C/02 LAMP. FLUORESCENTES 2X36W, CON REJILLA Y PANTALLA REFLECTIVA PARA ADOSAR	und	4.00		4.00	4.00	100%	
05.02.11.02	LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO IP65 DE C/01 LAMPARA FLUORESCENTE DE 1x36W PARA ADOSAR	und	3.00		3.00	3.00	100%	
05.02.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR C/ LAMPARAS AHORRADORAS 2x22W, PARA ADOSAR EN PARE	und	13.00		13.00	13.00	100%	
05.02.11.04	ARTEFACTO (LUMINARIA) INTERIOR 22w	und	31.00		31.00	31.00	100%	
05.03	INSTALACIONES ELECTRICAS - MEJORAMIENTO							
05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES							
05.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X2.5mm2	m	2,321.87	1,626.87	695.00	2,321.87	100%	
05.03.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X4mm2	m	1,638.06	1,200.86	437.20	1,638.06	100%	
05.03.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X6 mm2	m	425.64	125.00	300.64	425.64	100%	
05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDAS PARA TOMACORRIENTES (INCL. ACCESORIOS ELECTRICOS)							
05.03.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE ORQUILLA REDONDA DE 16/10A, 2P+T 250V MOD AyB	und	54.00	24.00	30.00	54.00	100%	
05.03.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE ORQUILLA REDONDA DE 16/10A, 2P+T 250V MOD C	und	22.00	9.00	13.00	22.00	100%	
05.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
05.03.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO (LUMINAR) INT.C/2 LAMP. FLUORESCENTE 2x36W, C/REJILLA, PANTALLA REFLECT. PARA ADOSAR	und	65.00		65.00	65.00	100%	
05.03.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO (LUMINAR) INT.C/2 LAMP. FLUORESCENTE 2x36W, C/REJILLA, PANTALLA REFLECT. SUSPENDIDA	und	26.00		26.00	26.00	100%	
05.03.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO IP65 C/01 LAMPARA FLUORESCENTE DE 1x36W	und	38.00		38.00	38.00	100%	
05.03.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR C/ LAMPARAS AHORRADORAS 2x22W, PARA ADOSAR EN PARE	und	20.00		20.00	20.00	100%	
05.03.09.05	LUMINARIA TIPO AHORRADOR PARA ADOSAR 1X22W	und	7.00		7.00	7.00	100%	
05.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
05.03.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	und	14.00		7.00	7.00	50%	7.00
05.04	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION							
05.04.01	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION	GLB	1.00	0.65	-0.65			1.00

ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos
CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
--	---	---

d) Del Cálculo de la Valorización, Reajustes, Deducciones y Retenciones

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN N° 14
DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual		
1.0.1	Valorización Contractual	182,349.23	
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	0.00	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	0.00	
	TOTAL MONTO BRUTO (A)		182,349.23
2.0.0	<u>DESCUENTOS</u>		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
	TOTAL DESCUENTOS (B)		0.00
	TOTAL NETO (A-B)		182,349.23
	I.G.V.	18.00%	32,822.86
	TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 215,172.09

ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
CAP 16325

CGLL CONSULTOR: CESAR GUANILO LLERENA	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA	 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA A tu servicio con transparencia
--	--	---

CONCLUSIONES

Es la parte concluyente del informe, debiéndose precisar que se ha comprobado:

- El contratista presento la valorización N° 14 acogiéndose a las condiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 107-2021, cuyos cálculos fueron verificadas por la supervisión.
- En este periodo la obra se encuentra atrasada con respecto al nuevo calendario de obra aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° D00200-2021-GRR-GR, teniendo un avance de 3.17% durante el mes y 93.48% acumulado, debiendo de tener a la fecha un avance acumulado programado de 100%, así mismo se debe de tener en consideración que la obra se encuentra suspendida por eventos no atribuibles a ninguna de las partes.
- Se han realizado los cálculos correspondientes a los reajustes, amortizaciones, reintegros y deductivos de acuerdo a la normativa vigente.
- El Monto de la valorización a cancelar es de: S/. 215,172.09 (doscientos quince mil ciento setenta y dos con 09/100 soles)
- Esta supervisión da conformidad a la valorización presentada.


RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar el pago solicitado corresponde a los trabajos ejecutados de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA", en los plazos estipulados en el contrato.
- Se recomienda a la Entidad tener en cuenta para el pago para esta valorización, de acuerdo a lo establecido *Decreto de Urgencia N° 107-2021. Artículo 2.2. La modificación de los contratos se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de contratación aplicable a cada contrato. Dicha modificación debe incluir el procedimiento para realizar la valorización y el pago, este último debe realizarse hasta el 31 de diciembre de 2021.*

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites consiguientes.

Atentamente.

SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERON
JEFE DE SUPERVISIÓN
.....CAP.16325.....

ARQ. LEONARDO HAGLER CIERTO CALDERÓN
C.A.P. N° 16325

ANEXOS:

- PANEL FOTOGRÁFICO
- CARTA N°0065-CCDMI-GRC-2021

Dirección: Calle Huanchay 4877 – 2° Piso, Urb. Parque del Naranjal I Etapa – Los Olivos
CEL. 983330783

MAIL: arq.leonardocierto@gmail.com

LAMINA N°01:



COMENTARIOS:

PARTIDA EJECUTADA :

- CULMINACIÓN DE PARTIDA DE VACIADOS DE LOSAS CON CONCRETO $f'c = 140\text{Kg/cm}^2$, EN PATIO UBICADO EN TALLERES.
- LA FECHA LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS EN EL MODULO DE TALLERES SE ENCUENTRAN CULMINADOS.

LAMINA N°02:



COMENTARIOS:

PARTIDA EJECUTADA :

- CULMINACION DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN COLISEO.



 ARQ. LEONARDO H. CIERTO CALDERÓN
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CAP 16325

LAMINA N°03:



COMENTARIOS:

PARTIDA EJECUTADA :

- CULMINACION DE LAS GRADERIAS DE CONCRETO $f'c = 175\text{Kg/cm}^2$ EN COLISEO.
- MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE PARA VACIADO DE PLATAFORMA DEPORTIVA.
