

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cajamarca, 27 de octubre de 2022

CARTA N° 021-2022-CSA&A/EPCP-RC

Señores : Ing. Doris Azucena Jiménez Sánchez
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones

Atención : Ing. Ing. Pablo Andree Alarcón Bravo
Coordinador de Obra

Asunto : **Alcanza Subsanación de Observaciones del INFORME MENSUAL N° 1 de Supervisión de Obra**

Referencia : Carta N° D455-2022-GR.CAJ-GRI/SGSL

Presente.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigimos a usted, a nombre de mi representada **CONSORCIO SUPERVISOR A&A**, con RUC N° 20609917181, con domicilio en Jr. Tres Reyes N° 208 - Urb. Sarita - Cajamarca, con la finalidad de saludarlo cordialmente y su vez hacerle llegar al **INFORME MENSUAL N° 1 DE SUPERVISIÓN** de la Obra: **“Remodelación De Obras Exteriores; Adquisición De Equipo De Laboratorio; En El (La) Instituto De Educación Superior Pedagógico Público Arístides Merino Merino En La Localidad Celendín, Distrito De Celendín, Provincia Celendín, Departamento Cajamarca”**, con las observaciones subsanadas según el documento de referencia, correspondiente al periodo del **27-09-2022 al 30-09-2022**.

Se hace llegar la misma a su Despacho, para continuar con el trámite correspondiente.

Sin otro en particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISORA & A

Edwin Paul Chávez Perales
Representante Común

*Recibido
Miravalles 02/11/2022*

GRG GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA MESA DE PARTES **MAD**
SEDE REGIONAL

Exp. N° **000775-2022-063058**
CARTA N° 21-2022

Clave : **80KFWU** Folios : **100**
Fecha : 27/10/2022 03:27 p.m.

<https://gorecaj.pe/madconsulta>
100 Folios + 2 Files + 3 CDs



Se Adjunta:

- 03 CD de Informe Mensual N° 1
- 02 File en Original de Informe Mensual N° 1
- 01 File en Copia de Informe Mensual N° 1

C.c. - Archivo

 Jirón. Tres Reyes N° 208 - Urb. Sarita - Cajamarca

 consorciosupervisor.gerencia@gmail.com

 937573204

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones
REG. 1315 FOLIOS 3/100
FECHA 27 OCT 2022 3:00
HORA 3:45 FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATO N° 045-2022-GRCAJ-GGR.

A.S. 021-2022-GR.CAJ – PRIMERA CONVOCATORIA

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA N° 01
– SETIEMBRE 2022 –**

OBRA:

“REMODELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO ARÍSTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Celendín, 30 de Setiembre del 2022.

CONSORCIO SUPERVISOR A & A

ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A & A

Edwin Paúl Chávez Perales
Representante Común

CAPITULO I. GENERALIDADES:

1.1. DATOS GENERALES DE OBRA:

OBRA: "REMODELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO ARÍSTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA":

UBICACIÓN: LOCALIDAD : Celendín
DISTRITO : Celendín
PROVINCIA : Celendín
DEPARTAMENTO : Cajamarca

FINANCIA : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

DEL CONTRATISTA:

- SISTEMA DE CONTRATACION : A Suma Alzada.
- METODO DE CONTRATACION : Adjudicación Simplificada N° 005-2022-GR.CAJ-Primera Convocatoria.
- MONTO REFERENCIAL (con I.G.V.) : S/. 2'057,685.64 (Marzo del 2022).
- EMPRESA EJECUTORA : S&J Contratistas Generales S.R.L.
- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° : 035-2022-GRCAJ-GGR.
- MONTO OFERTADO (con I.G.V.) : S/. 1'851,517.08.
- MONTO CONTRATADO (con I.G.V.) : S/. 1'851,517.08.
- MONTO CONTRATADO (sin I.G.V.) : S/. 1'569,421.25.
- FECHA DE FIRMA CONTRATO OBRA : 18 Agosto 2022.
- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO : Contratista presentó Carta fianza.
- DURACION : 90 días calendarios.
- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 14 Setiembre 2022.
- FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 Setiembre 2022.
- FECHA CONTRACTUAL DE TÉRMINO OBRA : 13 Diciembre 2022.
- DIAS DE SUSPENSION DE PLAZO : 12 días calendarios.
- FECHA INICIO SUSPENSION PLAZO EJECUCION : 15 Setiembre 2022.
- FECHA DE TÉRMINO SUSPENSION DE PLAZO : 26 Setiembre 2022.
- FECHA DE REINICIO DE OBRA : 27 Setiembre 2022.
- NUEVA FECHA DE TÉRMINO OBRA : 25 Diciembre 2022.
- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : -
- NUEVA FECHA CONTRACTUAL DE TÉRMINO OBRA: 25 Diciembre 2022.
- SITUACION DE LA OBRA : EN EJECUCION
- RESIDENTE DE OBRA : Ing. Nilton Celso Vásquez Hernández.

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 495.70

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Edwin Raúl Chávez Perales
Edwin Raúl Chávez Perales
Representante Común

DEL SUPERVISOR:

- SISTEMA DE CONTRATACION : De Tarifa.
- METODO DE CONTRATACION : Adjudicación Simplificada N° 021-2022-GR.CAJ-Primera Convocatoria.
- MONTO SUPERVISION Y LIQUIDACION (con I.G.V.): S/. 57,615.20 (marzo del 2022).
- EMPRESA CONSULTORA SUPERVISION : Consorcio Supervisor A&A.
- CONTRATO DE SUPERVISION N° : 045-2022-GRCAJ-GGR.
- MONTO OFERTADO (con I.G.V.) : S/. 51,114.60.
- MONTO CONTRATADO (con I.G.V.) : S/. 51,114.60.
- MONTO CONTRATADO (sin I.G.V.) : S/. 41,913.97.
- FECHA DE FIRMA CONTRATO OBRA : 12 Setiembre 2022.
- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO : Se acoge a Retención del 10% del Monto del Contrato Original.

- PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION : 90 días calendarios.
- PLAZO DE LIQUIDACION DE OBRA : 15 días calendarios.
- INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 14 Setiembre 2022.
- TERMINO PLAZO CONTRACTUAL : 13 Diciembre 2022.
- DIAS DE SUSPENSION DE PLAZO : 12 días calendarios.
- FECHA INICIO SUSPENSION PLAZO EJECUCION : 15 Setiembre 2022.
- FECHA DE TÉRMINO SUSPENSION DE PLAZO : 26 Setiembre 2022.
- FECHA DE REINICIO DE OBRA : 27 Setiembre 2022.
- NUEVA FECHA DE TÉRMINO OBRA : 25 Diciembre 2022.
- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 :-
- NUEVA FECHA CONTRACTUAL DE TÉRMINO OBRA : 25 Diciembre 2022.
- NUEVO INICIO PLAZO CONTRACTUAL SUPERV.: 27 Setiembre 2022.
- NUEVO TERMINO PLAZO CONTRACTUAL SUPERV.: 25 Diciembre 2022.
- SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Jorge Luis Silva Araujo.

1.2. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO:

LOCALIDAD : Celendín.
DISTRITO : Celendín
PROVINCIA : Celendín
DEPARTAMENTO : Cajamarca

Existe compatibilidad del terreno con la obra; siendo esta ubicada y limitada dentro del área que pertenece al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Arístides Merino Merino; es decir, por todos los lados limita con el área perteneciente a dicha Institución. El proyecto cuenta con el saneamiento físico legal de los terrenos donde se ubican las estructuras, asegurando de antemano su ejecución sin ningún problema.

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP- 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A & A
Edwin Paul Chávez Perales
Edwin Paul Chávez Perales
Representante Común

1.3. DESCRIPCION RESUMINADA DEL PROYECTO Y ZONIFICACION DEL PROYECTO:

El Proyecto: "REMODELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO ARÍSTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA CELENDÍN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", contempla los siguientes componentes:

- **Techos:** Comprende la instalación de cerchas de acero estructural, cobertura de teja andina, sistemas de drenaje, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias.
- **Baños:** Comprende la inclusión de baños adicionales, cuyo sistema estructural será albañilería confinada con elementos de concreto armado, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias.
- **Losas Deportivas:** Comprende la demolición de dos losas deportivas existentes en mal estado y reconstrucción de dos losas deportivas y graderíos.
- **Mobiliario y Equipamiento:** Comprende todo el mobiliario y equipamiento para funcionamiento adecuado del Instituto.

Las zonas definidas son:

METAS DEL PROYECTO:

- **BATERIA DE BAÑOS:** Se construirá una nueva batería de baños con un área de 72 m². En los baños se encontrará la siguiente distribución: 04 inodoros, 04 urinarios y 05 lavaderos para varones; 04 inodoros y 07 lavaderos para mujeres; 01 inodoro y 01 lavadero para discapacitados.
- **LOSAS DEPORTIVAS:** Se reconstruirán 2,169.80 m². de losas de concreto. Se realizará el vaciado de 69.65 m². de concreto para tribunas en losas. Se realizará el pintado de 369.31 m. lineales para demarcación en losas deportivas.
- **DRENAJE:** Se realizará la reparación y reconstrucción de 324.56 m. lineales de cunetas. Se realizará la instalación de 206.60 m. lineales de canaletas para lluvia en techos. Se colocarán 95.68 m. de montantes para lluvia.
- **TECHOS:** Se instalarán 1,495.49 m². de cobertura con teja andina. Se instalarán 783.55 m². de falso cielorraso con baldosas. Se instalarán 19,564.32 kg. de acero en cerchas metálicas.
- **INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se plantea instalación de 12 puntos y 12 luminarias en la nueva batería de baños. Se plantea la instalación de un sub tablero de distribución

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jes Silva
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRAS
CIP. 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A & A
Edwin Paul Chávez Perales
Edwin Paul Chávez Perales
Representante Común

TD7 en la nueva batería de baños. Se plantea una prueba eléctrica al final de los trabajos en la nueva batería de baños. Se plantea instalación de 86 puntos y 86 luminarias en los módulos existentes. Se plantea la instalación de un tablero general y 04 sub tableros de distribución en los módulos existentes. Se plantea una prueba eléctrica al final de los trabajos. Se plantea un mejoramiento del pozo a tierra.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

- **El mobiliario y equipamiento en el laboratorio de ciencias** es: 30 taburetes; 03 armarios horizontales para pared; 02 vitrinas para reactivos y materiales; 01 armario vertical; 01 computadora para docente; 01 proyector multimedia y 01 Ecran.
- **El mobiliario y equipamiento en el laboratorio de computación N° 1** es: 01 computadora para docente; 01 pizarra digital; 01 impresora multifuncional; 10 computadoras de escritorio; 10 escritorios para computadoras; 25 sillas para muebles de computadora; 01 escritorio para docente; 01 silla giratoria para docente y 01 armario.
- **El mobiliario y equipamiento en el laboratorio de computación N° 2** es: 01 proyector multimedia; 01 computadora para docente; 15 computadoras de escritorio; 01 pizarra digital; 01 impresora multifuncional; 01 escritorio para docente; 01 silla giratoria para docente; 15 escritorios para computadoras; 30 sillas para muebles de computadora y 01 armario.
- **El mobiliario y equipamiento en el auditorio** es: 120 sillas de metal negro y 02 armarios.

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

2.1. Control de Avance Físico

2.1.1. Cronograma de ejecución de Obra

Con fecha 15 de setiembre de 2022 de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y de la otra parte tanto la empresa contratista como la empresa supervisora acuerdan la suspensión de plazo hasta el 26 de setiembre de 2022, según las actas suscritas:

- ACTA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA firmado con fecha 15/09/2022 por el CONSORCIO SUPERVISOR A&A.
- ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA firmado con fecha 15/09/2022 por la S&J CONTRATISTAS GENERALES SRL.

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Edwin Paul Chávez Perales
Edwin Paul Chávez Perales
Percapetrol, S.A.S.

Asimismo, con fecha 27 de setiembre de 2022 se firma el ACTA DE REINICIO DE OBRA, por parte de la empresa contratista el Ing. Nilton Celso Vásquez Hernández con DNI N° 40800382, con CIP N° 102564 y por parte de la empresa supervisora el Ing. Jorge Luis Silva Araujo con DNI N° 27041050, con CIP N° 49570, dando conformidad al REINICIO DE OBRA.

Con fecha 30 de setiembre del 2022, según Carta N° 010-2022-GRC/S&J, la empresa contratista S&J CONTRATISTAS GENERALES SRL alcanza el CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO DE REINICIO DE OBRA N° 1 para la ejecución de obra: "Remodelación De Obras Exteriores; Adquisición De Equipo De Laboratorio; En El (La) Instituto De Educación Superior Pedagógico Público Arístides Merino Merino En La Localidad Celendín, Distrito De Celendín, Provincia Celendín, Departamento Cajamarca".

CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADO A REINICIO DE OBRA N° 01

DESCRIPCION	PARCIAL S/	MESES DE EJECUCION							
		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
AVANCE PROGRAMADO POR MES	1,569,421.25	19,042.37		516,542.95		463,273.52		570,562.41	
% MENSUAL PROGRAMADO POR MES			1.21%		32.91%		29.52%		36.35%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	1,569,421.25	19,042.37		535,585.32		998,858.84		1,569,421.25	
% PROGRAMADO ACUMULADO			1.21%		34.13%		63.65%		100.00%

2.1.2. Descripción de trabajos realizados en el periodo

Esta supervisión se ha encargado de verificar que los trabajos realizados por el contratista en el periodo del 27 al 30 de setiembre de 2022 estén de acuerdo al cronograma presentado por el contratista y que cumplan con todos los protocolos establecidos para la ejecución de los mismos; los trabajos realizados son tal como se describen a continuación:

CONSORCIO SUPERVISOR A&A

 INC.

CONSORCIO SUPERVISOR A & A

 Edwin Paul Chávez Perales
 Representante Común

01. ESTRUCTURAS

01.01 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01 CARTEL DE OBRA

01.02 PLAN DE CONTINGENCIA

01.02.01 TRASLADO TEMPORAL DE MUEBLES DE ZONAS INTERVENIDAS

01.03 SALUD Y PROTECCION PERSONAL

01.03.01 GESTIÓN DE SALUD - IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS COVID-19

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

01.04 LOSAS DE CONCRETO

01.04.01 TRABAJOS PELIMINARES

01.04.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

01.04.01.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

01.04.01.03 ELIMINACIÓN DE DESMONTE

01.04.01.04 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

01.04.01.05 TRAZO Y REPLANTEO

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE

01.04.02.05 ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

01.05 BATERIA DE BAÑOS

01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A & A
Edwin Paul Chávez Perales
Edwin Paul Chávez Perales
Representante Común

SILVA ARAUJO, JORGE LUIS

INGENIERO CIVIL

REGISTRO CIP N° 49570

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO	AVANCE			SALDOS
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
				METRADO	METRADO	METRADO %	
01	ESTRUCTURAS						
01.01	OBRAS PRELIMINARES						
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1.00	1.00	100.00%	
01.02	PLAN DE CONTINGENCIA						
01.02.01	TRASLADO TEMPORAL DE MUEBLES DE ZONAS INTERVENIDAS	glb	1.00	1.00	1.00	100.00%	
01.03	SALUD Y PROTECCION PERSONAL						
01.03.01	GESTIÓN DE SALUD - IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS COVID-19	glb	1.00	0.15	0.15	15.00%	
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00	0.15	0.15	15.00%	
01.04	LOSAS DE CONCRETO						
01.04.01	TRABAJOS PELIMINARES						
01.04.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	0.15	0.15	15.00%	
01.04.01.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	379.55	108.00	108.00	28.46%	
01.04.01.03	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	496.93	135.00	135.00	27.17%	
01.04.01.04	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	2,162.87	720.00	720.00	33.29%	
01.04.01.05	TRAZO Y REPLANTEO	m2	2,162.87	720.00	720.00	33.29%	
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.04.02.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA HASTA SUBRASANTE	m3	1,193.05	298.26	298.26	25.00%	
01.04.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	1,652.26	371.26	371.26	22.47%	
01.05	BATERÍA DE BAÑOS						
01.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	116.22	116.22	116.22	100.00%	
01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	116.22	58.11	58.11	50.00%	

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Edwin Paul Chávez Perales

92

2.1.3. Porcentaje de Avance Real Del Periodo Y Porcentaje De Avance Acumulado

AVANCE FISICO PROGRAMADO VS REAL

AVANCE FISICO:

Se tiene un avance físico programado de 1.21 % y un avance físico ejecutado de 1.66 %, se puede apreciar en los siguientes cuadros:

OBRA	AVANCE PROGRAMADO ACTUALIZADO		AVANCE REAL		ESTADO DE OBRA
	ACTUAL %	ACUMULADO %	ACTUAL %	ACUMULADO %	
“REMODELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO ARÍSTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”	1.22%	1.22%	1.66%	1.66%	Adelantada

El avance ejecutado durante el periodo que se informa, del 27 al 30 de setiembre de 2022, es del 1.66% y el avance programado para el mismo periodo es de 1.21%. Obteniendo al 30/09/2022, un avance ejecutado acumulado de 1.66%, la misma que se encuentra adelantada en un 0.45% de lo programado. Por lo que, se trata de una obra adelantada.

En el grafico siguiente, se muestra la Curva de Avance Físico Programado VS Avance físico real, con valores acumulados del presente período: Del 27 al 30 de setiembre del 2022:

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Edwin Paul Chávez Perales
Edwin Paul Chávez Perales
Representante Común

SILVA ARAUJO, JORGE LUIS
 INGENIERO CIVIL
 REGISTRO CIP N° 49570

ANEXO (DI)

ADJUDICACION: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-CR-CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

CONTRATA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION: LOCALIDAD: CELENDIN - DISTRITO: CELENDIN - PROVINCIA: CELENDIN - REGION: CAJAMARCA


EJECUTA: S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL

RESIDENTE: ING. NILTON CELSO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

SUPERVISA: CONSORCIO SUPERVISOR A&A

SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO

CONTRATO: N° 035-2022 - GRCAJ - GGR. (18/08/2022)

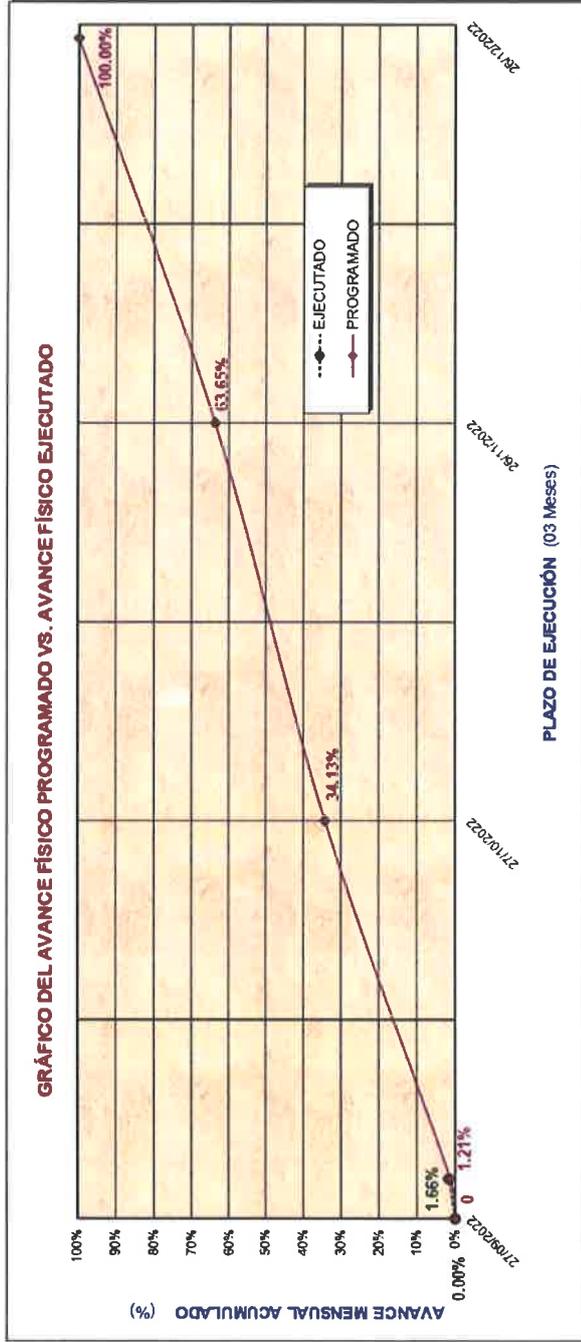

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
 Ing. Jorge Luis Silva Araujo
 Supervisor

CONSORCIO SUPERVISOR A & A
 Edwin Paul Chávez Perales
 Representante Común

MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
27-Set-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-22	19,042.37	19,042.37	1.21%	1.21%
27-Oct-22	516,542.95	535,585.32	32.91%	34.13%
26-Nov-22	463,273.52	998,858.84	29.52%	63.65%
25-Dic-22	570,562.41	1,569,421.25	36.35%	100.00%
TOTAL	1,569,421.25		100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
27-Set-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-22	26,040.70	26,040.70	1.66%	1.66%
27-Oct-22				
26-Nov-22				
25-Dic-22				
TOTAL	26,040.70		1.66%	

90

SILVA ARAUJO, JORGE LUIS
 INGENIERO CIVIL
 REGISTRO CIP N° 49570

CURVA "S"

ADJUDICACION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CR-CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES, ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MIERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

CONTRATA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UBICACION: LOCALIDAD: CELENDIN - DISTRITO: CELENDIN - PROVINCIA: CELENDIN - REGION: CAJAMARCA

EJECUTA: S & I CONTRATISTAS GENERALES SRL


RESIDENTE: ING. MILTON CELSO YÁSQUEZ HERNÁNDEZ

SUPERVISA: CONSORCIO SUPERVISOR A&A

SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO

CONTRATO: N° 035-2022 - GRCAJ - GGR. (18/08/2022)

GRÁFICO DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. AVANCE FÍSICO EJECUTADO

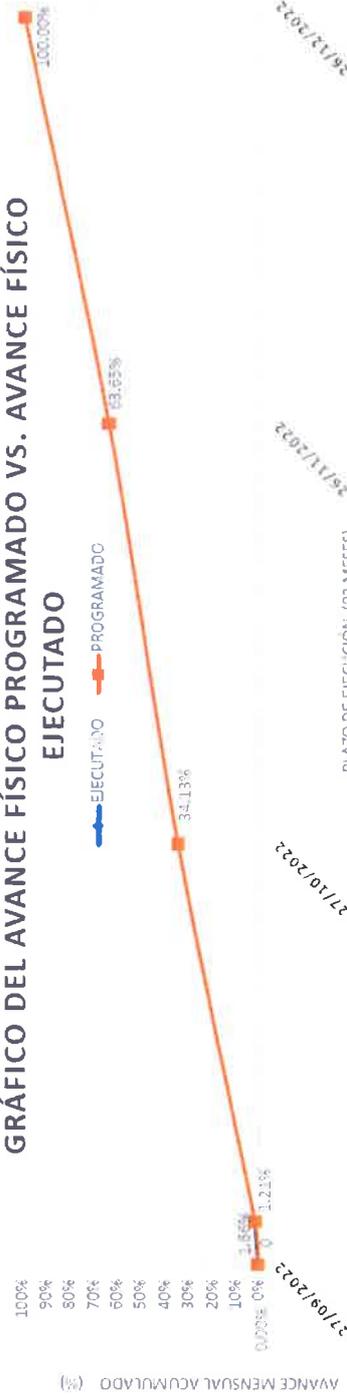

CRONOGRAMA ACTUALIZADO A FECHA DEL REINICIO DE PLAZO CONTRACTUAL				
	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	26/12/2022
MONTO PROGRAMADO SIN IGV	19,042.37	516,542.95	463,273.52	570,562.41
AVAN. MENSUAL PROGRAM. (%)	1.21%	32.91%	29.52%	36.35%
MONTO ACUM. PROGRAM	19,042.37	535,585.32	998,858.84	1,569,421.25
AVAN. MENS. ACUMULADO (%)	1.21%	34.13%	63.65%	100.00%
TOTAL VALORIZADO S/IGV	26,040.70			
AVANCE MENSUAL VALORIZ. (%)	1.66%			
AVAN. ACUM. VALORIZADO	26,040.70			
AVAN. ACUM. VALORIZADO (%)	1.66%			

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
 ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A & A
 Edwin Paul Chávez Perales
 Representante Común

AVANCE FINANCIERO:

Se tiene un avance financiero programado de S/ 19,042.37 y un avance financiero ejecutado de S/ 26,040.70; montos sin IGV. Se puede apreciar en los siguientes cuadros:

OBRA	AVANCE PROGRAMADO ACTUALIZADO		AVANCE REAL		ESTADO DE OBRA
	ACTUAL S/	ACUMULADO S/	ACTUAL S/	ACUMULADO S/	
"REMODELACIÓN DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO ARÍSTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDÍN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	19,042.37	19,042.37	26,040.70	26,040.70	Adelantada

El avance ejecutado durante el periodo que se informa, del 27 al 30 de setiembre de 2022, es del S/ 26,040.70 y el avance programado para el mismo periodo es de S/ 19,042.37. Obteniendo al 30/09/2022, un avance ejecutado acumulado de S/ 26,040.70 la misma que se encuentra adelantada en un S/ 6,998.33 de lo programado. Por lo que, se trata de una obra adelantada.


En el grafico siguiente, se muestra la Curva de Avance Financiero Programado VS Avance Financiero Ejecutado, con valores acumulados del presente período: Del 27 al 30 de setiembre del 2022:

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Jorge Luis Silva Araujo
ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
Edwin Raúl Chávez Perales
Edwin Raúl Chávez Perales
Representante Común

ANEXO (E)

ADJUDICACION: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-CR-CAJ-PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA: REMODELACION DE OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO ARISTIDES MERINO MERINO EN LA LOCALIDAD DE CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.
 CONTRATISTA: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 UBICACION: LOCALIDAD: CELENDIN - DISTRITO: CELENDIN - PROVINCIA: CELENDIN - REGION: CAJAMARCA
 EJECUTA: S & J CONTRATISTAS GENERALES SRL
 RESIDENTE: ING. NILTON CELSO YÁÑEZ HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR A&A
 SUPERVISOR: ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
 CONTRATO: N° 035-2022 - GRCAJ - GCR. (18/08/2022)

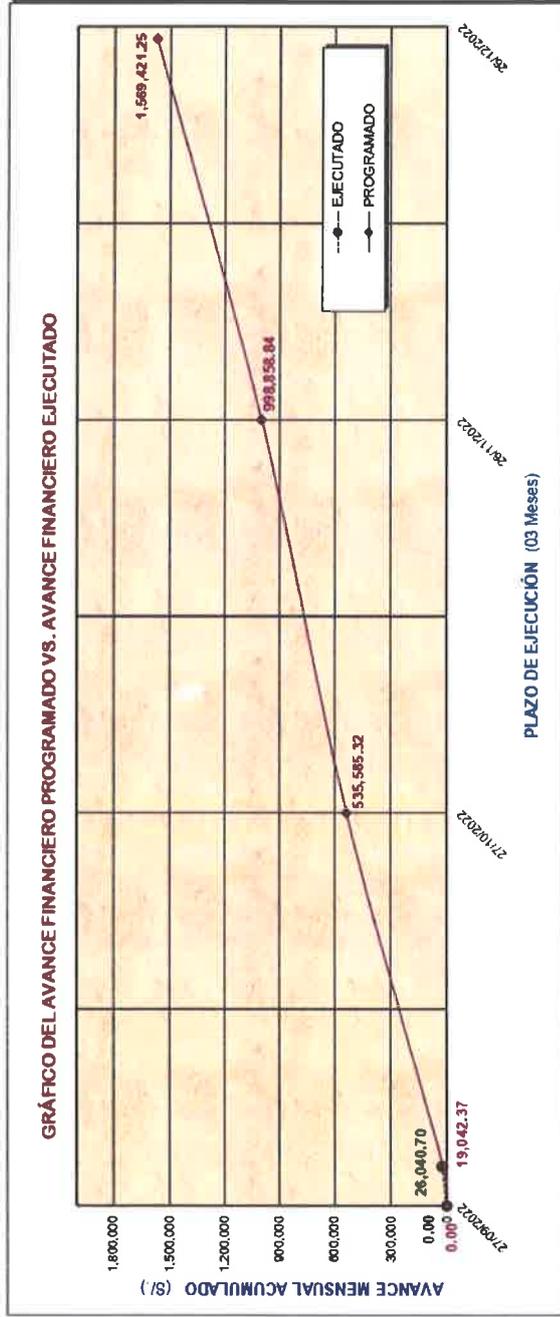

PLAZO DE EJECUCIÓN (03 Meses)

MES	MONTOS (S./100)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %
27-Set-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-22	26.040.70	26.040.70	1.66%	1.66%
27-Oct-22				
26-Nov-22				
25-Dic-22				
TOTAL	26.040.70	26.040.70	1.66%	1.66%

PLAZO DE EJECUCIÓN (03 Meses)

MES	MONTOS (S./100)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL S/.	PARCIAL %	ACUMUL %
27-Set-22	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30-Set-22	19.042.37	19.042.37	1.21%	1.21%
27-Oct-22	516.542.95	535.585.32	32.91%	34.13%
26-Nov-22	463.273.52	998.858.84	29.52%	63.65%
25-Dic-22	570.562.41	1.569.421.25	36.35%	100.00%
TOTAL	1.569.421.25	1.569.421.25	100.00%	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
 ING. JORGE LUIS SILVA ARAUJO
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 49570

CONSORCIO SUPERVISOR A&A
 Edwin Paul Chávez Perales
 Representante Gracía

88
