

Cajamarca, 05 de junio del 2023

CARTA N° 104 - 2023 - C/JFJ

Señor : **Ing. Herman David VELASQUEZ CABRERA**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GR.CAJ

Presente.-

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME MENSUAL N° 08 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
Periodo 03 al 31 de Mayo 2023

REFERENCIA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA.

INFORME N° 05 - 2023 - JS/GALLM

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez en atención a los documentos de la referencia, por medio de la presente y a través del **Informe N°05-2023-JS/GALLM** del Jefe de Supervisión de Obra, se entrega el **"INFORME MENSUAL N° 08 DE SUPERVISIÓN DE OBRA"**, de la obra de la referencia, la cual corresponde al periodo de ejecución: 03 al 31 de MAYO 2023; expresando además que la Supervisión aprueba y brinda conformidad a la presente valorización de obra.

Se adjunta:

- Informe N° 05 - 2023 - JS/GALLM
- 01 CD

Sin otro particular y en espera a la atención que merezca la presente, expreso a Ud. mi respeto, consideración y estima personal.

Atentamente,



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

C.c.
Archivo.

INFORME N° 05-2023-JS/GALLM.

A : **John Francis Julca Chacón**
Representante Legal.
Supervisión de obra

DE : **Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON**
Jefe de Supervisión de Obra.

ASUNTO : **SE ALCANZA INFORME MENSUAL N° 08 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.**
(PERIODO 03 AL 31 DE MAYO).

REFERENCIA: a) OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA"

FECHA : Cajamarca, 05 de Junio del 2023.

Por la presente me dirijo a Usted, a fin de informar que, a través de la presente se "Alcanza el Informe Mensual N° 08 de Supervisión de obra", concerniente al periodo de 03 al 31 de Mayo del 2023.

La Supervisión APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD AL PRESENTE INFORME MENSUAL N° 08 DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

Se adjunta:

- Informe Mensual N° 08 de Supervisión de Obra

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines respectivos.

Atentamente,

Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN

C.I.P. 44585

Ing. Gilmer Alberto Llique Mondragón
Jefe de Supervisión de Obra

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

CONTENIDO

1. INFORME MENSUAL N°08 – Mes de Mayo.2023 (DATOS GENERALES).
2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA vs CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE.
3. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
4. PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLUCIONES ADAPTADAS.
5. DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS QUE INCURRAN EN EL CONTRATISTA Y QUE GENEREN DAÑO A LA OBRA O TERCEROS.
6. RESUMEN DE VOLUMEN POR PARTIDAS TRABAJADAS Y RENDIMIENTOS PROMEDIOS ALCANZADOS POR EL CONTRATISTA.
7. LISTA DE INFORMACIÓN DE CONTROLES TOPOGRÁFICOS DE AVANCE DE OBRA EN EJECUCIÓN.
8. PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROLES DE CALIDAD DEL MATERIAL A UTILIZAR EN OBRA.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
CvI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

9. RESUMEN DE TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL MES SIGUIENTE Y CONTROL DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DEL MES ANTERIOR.

10. RESUMEN DEL ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA.

11. ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y RECURSOS EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO.

12. NOTAS TRANSCENDENTES DEL CUADERNO DE OBRA.

13. DOCUMENTACIÓN CURSADA.

14. REUNIONES TÉCNICAS.

15. ANEXOS.

A. PANEL FOTOGRÁFICO

B. CURVA S

C. CUADERNO DE OBRA

D. CUADERNO DE AUTOCONTROL


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
CvI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

1. INFORME MENSUAL N°08
DATOS GENERALES


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
D.O.I. N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

INFORME MENSUAL N° 08 - DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA TOTORA EN EL DISTRITO DE CALQUIS, EL PALMITO EN EL DISTRITO DE NIEPOS Y TALLAPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - REGIÓN CAJAMARCA"

Ubicación :

Departamento : Cajamarca

Provincia : San Miguel

Distrito : Calquis

: Niepos

: San Miguel

A. Geográfica

: 1

Contratista

: CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

Financiamiento

: Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y P.

Licitación Pública

: Licitación Publica N°004-2020-GR.CAJ

Primera Convocatoria

Sistema de Contratación

: A SUMA ALZADA

Presupuesto Base y fecha con IGV

: S/. 3'818,645.11 (Diciembre 2019)

Presupuesto Base y fecha sin IGV

: S/. 3'236,139.19 (Diciembre 2019)

Contrato N° y fecha

: N° 004 – 2020 – GR.CAJ-GGR

Monto del Contrato con IGV


: S/. 3'436,780.60

Monto del contrato sin IGV

: S/. 2'912,525.93

Plazo de ejecución en d.c.

:



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
C.V. N° 40804305

- 128 d.c. I.E. La Totora
- 166 d.c. I.E. Palmito
- 165 d.c. I.E. Tallapampa

Plazo de ejecución según Bases

:

- 128 d.c. I.E. La Totora
- 166 d.c. I.E. Palmito


Ing. Gilmer A. Uique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

▪ 165 d.c. I.E. Tallapampa

Ampliación de plazo N° 01 : Denegada
Ampliación de plazo N° 02 : Denegada
Ampliación de plazo N° 03 : Denegada
Adicional de obra N° 01, con IGV : S/. 67,751.95
Adicional de obra N° 01, sin IGV : S/. 57,416.91

Adicional de obra N° 02, con IGV : S/. 33,837.64
Adicional de obra N° 02, sin IGV : S/. 28,675.97

Deductivo de obra N°01, con IGV : S/. 28,500.67
Deductivo de obra N°01, sin IGV : S/. 24,153.11

Adelantos Directo, con IGV : No Solicitado por Contratista
Adelanto de materiales con IGV : No Solicitado por Contratista

Acta de Posesión de la zona de obras :

- 12 de Noviembre del 2020 - I.E. La Titora
- 12 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito
- 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa

Inicio oficial del plazo :

- 13 de Noviembre del 2020 - I.E. La Titora
- 13 de Noviembre del 2020 - I.E. Palmito
- 14 de Noviembre del 2020 - I.E. Tallapampa

Suspensión de obra N°01 : 19 de enero del 2021 al 17 de febrero del 2021



Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
Cnit. N° 40804305

Termino original programado de obra :
▪ 20 de Marzo del 2021 - I.E. La Totora
▪ 27 de Abril del 2021 - I.E. El Palmito
▪ 27 de Abril del 2021 - I.E. Tallapampa

Termino reprogramado de obra :
▪ 19 de Abril del 2021 - I.E. La Totora
▪ 27 de Mayo del 2021 - I.E. El Palmito
▪ 27 de Mayo del 2021 - I.E. Tallapampa

Suspensión de obra N°02 : 22 de marzo del 2021 al 20 de abril del 2021

Reinicio de obra : 21 de Abril del 2021


Termino Programado de las obras :
▪ 19 de Mayo del 2021 - I.E. La Totora
▪ 26 de Junio del 2021 - I.E. El Palmito
▪ 26 de Junio del 2021 - I.E. Tallapampa

Acta de constatación física : Obra en ejecución

Acta de Recepción de Obra : Obra no concluida

Residente de Obra : Ing. Jhony Michel paredes Contreras

Jefe de Supervisión de Obra: **Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON**
(Desde el 03.Mayo.2023).


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. N° 40804305

Ing. Abraham Núñez Laureano
(Hasta el 26.Junio.2021)


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

Suspensión / Paralización de obra : 08 de Junio del 2021
(Por parte del Contratista Ejecutor de obra)

Acta de Conciliación de obra : 10 de Abril del 2023

(N° 001-2023, entre Entidad GRC.CAJ. y Contratista ejecutor de obra)

Fecha De Reinicio De Obra : 03 de Mayo del 2023



John Francis JULCA CHACÓN

280

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

Nuevas fechas programadas de Termino de obra:

- 16 de Julio del 2023 - I.E. La Tatora
- 03 de Agosto del 2023 - I.E. El Palmito
- 03 de Agosto del 2023 - I.E. Tallapampa


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

**2. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA vs
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
VIGENTE.**


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

PROCESO: Licitación Pública N° 004-2020-GR.Caj-Primera Convocatoria MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A SUMA ALZADA
 OBRA : *Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las localidades de La Tolosa en el Distrito de Cal VALOR REFERENCIAL : 128, 166, 165 Días Calendario
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (GR.Caj) VALOR REFERENCIAL : Incl. IGV: S/ 3,818,645.11
 UBICACIÓN : CALQUIIS - NIEPOS - SAN MIGUEL MONTO CONTRATADO : Incl. IGV: S/ 3,436,780.60
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE - FACTURACION RUC 20529696918 FECHA BASE : DICIEMBRE - 2019
 JEFE DE SUPERV : Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON FACTOR DE RELACIÓN : 0.90000

MONTO DEL CONTRATO : S/. 3,436,780.60 Incl/IGV
 MONTO DEL CONTRATO : S/. 2,912,525.93 Sin/IGV

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS								
(TENIENDO EN CUENTA EL CALENDARIO ACTUALIZADO POR CARTA N° D176-2023-GR.CAJ/GRI)								
RESUMEN:								
MES	VALORIZACIÓN N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJECJ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
13/11/2020								
30/11/2020	Val 1	103,954.00	103,954.00	3.57%	103,954.00	103,954.00	3.57%	100.00%
31/12/2020	Val 2	287,073.69	391,027.69	13.43%	287,073.69	391,027.69	13.43%	100.00%
18/01/2021	Val 3	105,688.92	496,716.61	17.06%	105,688.92	496,716.61	17.06%	100.00%
17/02/2021	Suspension	0.00	496,716.61	17.06%		496,716.61	17.06%	100.00%
28/02/2021	Val 4	303,422.00	800,138.61	27.48%	303,422.00	800,138.61	27.48%	100.00%
21/03/2021	Val 5	401,742.94	1,201,881.55	41.27%	401,742.94	1,201,881.55	41.27%	100.00%
20/04/2021	Suspension	0.00	1,201,881.55	41.27%	0.00	1,201,881.55	41.27%	100.00%
30/04/2021	Val 6	184,178.56	1,386,060.11	47.59%	184,178.56	1,386,060.11	47.59%	100.00%
31/05/2021	Val 7	158,369.13	1,544,429.24	53.03%	158,369.13	1,360,250.68	53.03%	100.00%
02/05/2023	Suspension	0.00	1,544,429.24	53.03%	0.00	1,386,060.11	53.03%	100.00%
31/05/2023	Val 8	218,915.61	1,763,344.85	60.55%	675,030.99	2,035,281.67	76.21%	125.86%
30/06/2023	Val 9	503,652.99	2,266,997.84	77.84%				
31/07/2023	Val 10	577,545.77	2,844,543.61	97.67%				
03/08/2023	Val 11	67,982.32	2,912,525.93	100.00%				
TOTAL		2,912,525.93			2,219,460.23			

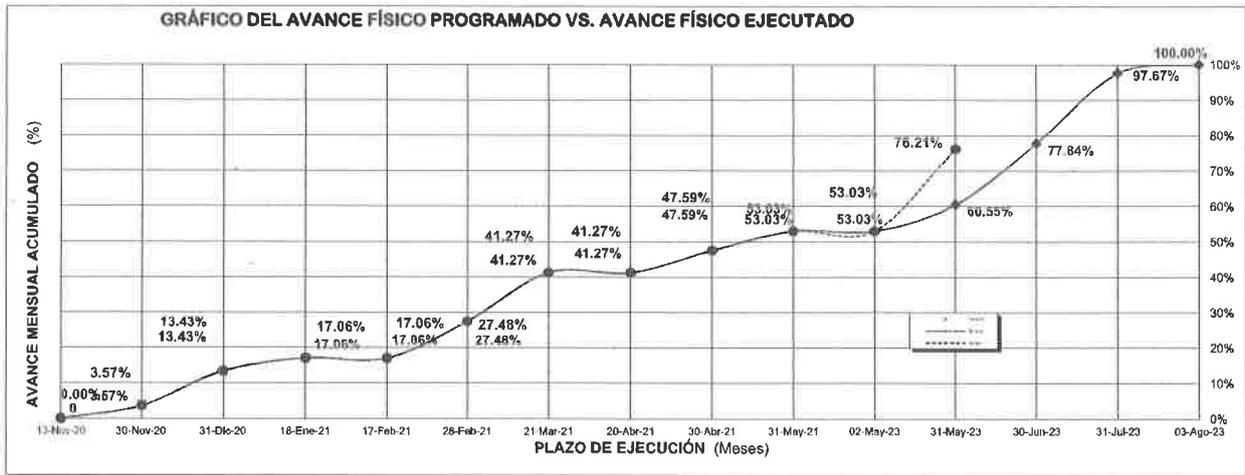

 John Francis Juica Chacon
 REPRESENTANTE LEGAL
 DNI: N° 40804305


 Ing. Gilmer A. Llique Mondragon
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 44585

ADJUDICACIÓN : Licitación Pública N° 004-2020-GR.Caj-Primera Convocatoria
 PROYECTO : "Instalación del Servicio Escolarizado del Nivel Inicial en las localidades de La Tolora en el Distrito de Calquis, El Palmito en
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (GR.Caj)
 UBICACIÓN : CALQUIS - NIEPOS - SAN MIGUEL
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE - FACTURACION RUC 20529698918
 SUPERVISOR : Ing. Gilmer Alberto LLIQUE MONDRAGON

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 128, 166, 165 Días Calendario
 VALOR REFERENCIAL : Incl. IGV: S/. 3,818,645.11
 MONTO CONTRATADO : Incl. IGV: S/. 3,436,780.60
 FECHA BASE : DICIEMBRE - 2019
 FACTOR DE RELACIÓN : 0.90000

RESUMEN



MES	MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS			
	MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Nov-20	103,954.00	103,954.00	3.57%	3.57%
Dic-20	287,073.69	391,027.69	9.86%	13.43%
Ene-21	105,688.92	496,716.61	3.63%	17.06%
Feb-21	0.00	496,716.61	0.00%	17.06%
Feb-21	303,422.00	800,138.61	10.42%	27.48%
Mar-21	401,742.94	1,201,881.55	13.79%	41.27%
Abr-21	0.00	1,201,881.55	0.00%	41.27%
Abr-21	184,178.56	1,386,060.11	6.32%	47.59%
May-21	158,369.13	1,544,429.24	5.44%	53.03%
May-23	0.00	1,544,429.24	0.00%	53.03%
May-23	218,915.61	1,763,344.85	7.52%	60.55%
Jun-23	503,652.99	2,266,997.84	17.29%	77.84%
Jul-23	577,645.77	2,844,643.61	19.83%	97.67%
Ago-23	67,982.32	2,912,625.93	2.33%	100.00%
TOTAL	2,912,625.93		100.00%	

MES	MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS			
	MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Nov-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Nov-20	103,954.00	103,954.00	3.57%	3.57%
Dic-20	287,073.69	391,027.69	9.86%	13.43%
Ene-21	105,688.92	496,716.61	3.63%	17.06%
Feb-21	0.00	496,716.61	0.00%	17.06%
Feb-21	303,422.00	800,138.61	10.42%	27.48%
Mar-21	401,742.94	1,201,881.55	13.79%	41.27%
Abr-21	0.00	1,201,881.55	0.00%	41.27%
Abr-21	184,178.56	1,386,060.11	6.32%	47.59%
May-21	158,369.13	1,544,429.24	5.44%	53.03%
May-23	0.00	1,544,429.24	0.00%	53.03%
May-23	675,030.99	2,219,460.23	23.18%	76.21%
Jun-23				
Jul-23				
Ago-23				
TOTAL	2,219,460.23		76.21%	


 John Francis Juica Chacón
 REPRESENTANTE LEGAL
 CNI: N° 40804305


 Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 C.I.P. 44585

**3. ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.**


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista

- **AVANCE FÍSICO POR PARTIDAS.**

El avance físico realizado se detalla en la valorización.

- **ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA**

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO: 60.55%

- I.E.I. TOTORA: 73.62%.
- I.E.I. EL PALMITO: 47.49%.
- I.E.I. TALLAPAMPA: 64.54%

AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO:

76.21%

- I.E.I. LA TOTORA: 81.88%
- I.E.I. EL PALMITO: 69.39%
- I.E.I. TALLAPAMPA: 79.36%


Ing. Gilmer A. Llique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

La obra, de acuerdo con el cronograma valorizado vigente de avance físico programado de obra se debería encontrar en un 60.55 % acumulado, sin embargo, el avance físico ejecutado se encuentra al 76.21% del avance de obra, por lo tanto, la ejecución de la obra se encuentra en condición ADELANTADA, de acuerdo a su programación de obra, con una relación (AEA/APA) de 125.86%, por lo que NO está en condición de presentar un calendario acelerado de obra.

- **COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL AVANCE**

- La Entidad GR.Caj. mediante CARTA N° D110-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 11.Abril.2023, nos hizo llegar el ACTA DE CONCILIACIÓN N° 001-2023, formalizado entre la Entidad GR.Cajamarca y el Contratista ejecutor Consorcio Virgen de Guadalupe.
- El día 03.Mayo.2023, se dio el reinicio del plazo de ejecución de obra, para continuar y culminar con la ejecución de la obra en su conjunto.
- La Entidad GR.Caj. mediante CARTA N° D176-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 31.Mayo.2023, ha aprobado los Cronogramas Actualizados de obra.
- El avance físico programado en el mes de mayo.2023 fue de 7.52% y el acumulado de 60.55%.
- El contratista ejecutor NO ha solicitado ningún tipo de adelantos.


John Francis Julca Chacon
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Problemas surgidos durante la ejecución de la obra y soluciones adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del cronograma de ejecución de obras.

La Entidad GR.Caj. mediante CARTA N° D110-2023-GR.CAJ/GRI de fecha 11.Abril.2023, nos hizo llegar el ACTA DE CONCILIACIÓN N° 001-2023, formalizado entre la Entidad GR.Cajamarca y el Contratista ejecutor Consorcio Virgen de Guadalupe.

I.E.I. TOTORA:

- Se evidencia poco personal de trabajo por parte del contratista, por lo tanto, la supervisión recomienda aumentar la cuadrilla, para poder cumplir con los trabajos programados contractuales del presente mes.
- No se encontraron problemas durante la ejecución de la obra.

I.E.I. EL PALMITO:

- Para que la obra no se retrase, se optó el uso de aditivo acelerante de concreto, en una dosificación de 250 ml por bolsa de cemento.
- Se solucionó la presencia de filtraciones subterráneas, con drenaje, a través de tubo de PVC 4", colindante a la escuela vecina.
- No se encontraron más problemas durante la ejecución de la obra.

I.E. I. TALLAPAMPA:

- Se ejecutaron los trabajos del Adicional 01 y Deductivo Vinculante 01.
- Se evidencia poco personal de trabajo por parte del contratista, por lo tanto, la supervisión recomienda aumentar la cuadrilla, para poder cumplir con los trabajos programados contractuales del presente mes.
- No se encontraron problemas durante la ejecución de la obra.


John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305


Ing. Gilmer A. Uique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585

**5. DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O
NEGLIGENCIAS QUE INCURRAN EN EL
CONTRATISTA Y QUE GENEREN DAÑOS A LA
OBRA O TERCEROS.**



John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305



Ing. Gilmer A. Lique Mondragón
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.I.P. 44585



John Francis JULCA CHACÓN

271

Supervisor de Obra

R.U.C. 10408043056

No aplica.

John Francis Julca Chacón
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: N° 40804305

Cal. 976 111717

R.P.M. #841109

Email: jjulca78@hotmail.com

Av. General Garzón # 613

/ Jesús María - LIMA
