



“CONSORCIO SUPERVISOR JV”

352

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cajamarca, 13 de Mayo del 2024.

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – SEDE CENTRAL

ATENCIÓN:

Ing. EDGAR ESTEBAN MEJÍA DUCLOS,

SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

ASUNTO:

ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 02 - CORRESPONDIENTE (01 de Abril del 2024 al 30 de Abril del 2024)

REFERENCIA:

- a) CARTA N° 009-2024-RAJ/SO
- b) CARTA N° 011-CC/FAFT-CAJ/2024
- c) INFORME N° 009/CC/REPG-CAJ/2024
- d) CARTA N° 017-2024-SDPS/RC
- e) CARTA N° D219-2024-GR.CAJ-GR/ISGL
- f) INFORME N° D49-2024-GR.CAJ-GR/ISGL
- g) CARTA N° 016-2024-SDPS/RC
- h) CARTA N° 008-2024-RAJ/SO
- i) CARTA N° 010-CC/FAFT-CAJ/2024
- j) INFORME N° 008-CC/REPG-CAJ/2024
- k) CONTRATO DE SUPERVISIÓN N° 17-2024-GR.CAJ-GGR
- l) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 15-2024-GR.CAJ-GGR
- m) Supervisión de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, CUI: 2585496

De nuestra consideración.

Mediante la presente para hacerles llegar un cordial saludo y ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 02 - CORRESPONDIENTE (01 de Abril del 2024 al 30 de Abril del 2024), de la obra: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CUI: 2585496; en donde el CONSORCIO CAJAMARCA mediante CARTA N° 011-CC/FAFT-CAJ/2024 cumple en levantar las observaciones planteadas por la entidad y a la vez el Supervisor de Obra subsana sus observaciones y emite su conformidad mediante INFORME N° 009/CC/REPG-CAJ/2024, del levantamiento de observaciones a la Valorización N° 02 de obra; por lo que alcanza para el trámite correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresar las muestras de mi consideración y sincera estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SILVA
DNI: 7654016
REPRESENTANTE COMUN

RUC DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV: 20612204951
Telefono: 912 487 327 , correo: samuelperez310615@gmail.com

Francisco Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70784766

CONSORCIO CAJAMARCA

CONSORCIO CAJAMARCA
Romando Eloy Pérez Góngora
CIP: 133038

SUPERVISOR DE OBRA

CIP: 131027

INGENIERO CIVIL

Rolando Anaya Poma Vilcamayo

CONSORCIO SUPERVISOR, IV
SAMUEL DAVO PÉREZ SILVA
DNI: 7090018
REPRESENTANTE COMÚN

1. INFORME DE CONFORMIDAD MENSUAL DEL SUPERVISOR

INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA - DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

Proyecto: IOARR- Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585456

CONSORCIO
CAJAMARCA



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Cajamarca, 10 de Mayo del 2024

CARTA N° 009-2024 - RAJ/SO

SR. SAMUEL DAVID PEREZ SILVA

REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR JV

ASUNTO
Presente

REFERENCIA


- : ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL CONTRATISTA DEL PERIODO (01.04.2024 - 30.04.2024)**
- a. Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496**
- b. CARTA N° 011-CC/FAFT-CAJ/2024**

De mi consideración:

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle y al mismo tiempo, alcanzarle el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL CONTRATISTA DEL PERIODO (01.04.2024 - 30.04.2024), de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496, dando la conformidad y aprobación de la supervisión, por lo que se recomienda el trámite de valorización respectivo al CONSORCIO CAJAMARCA.


Esperando la atención a la presente me suscribo a Ud.

Atentamente,


Rolando Anyaypoma Juicamoro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

Recibido
10-05-2024

**GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA**

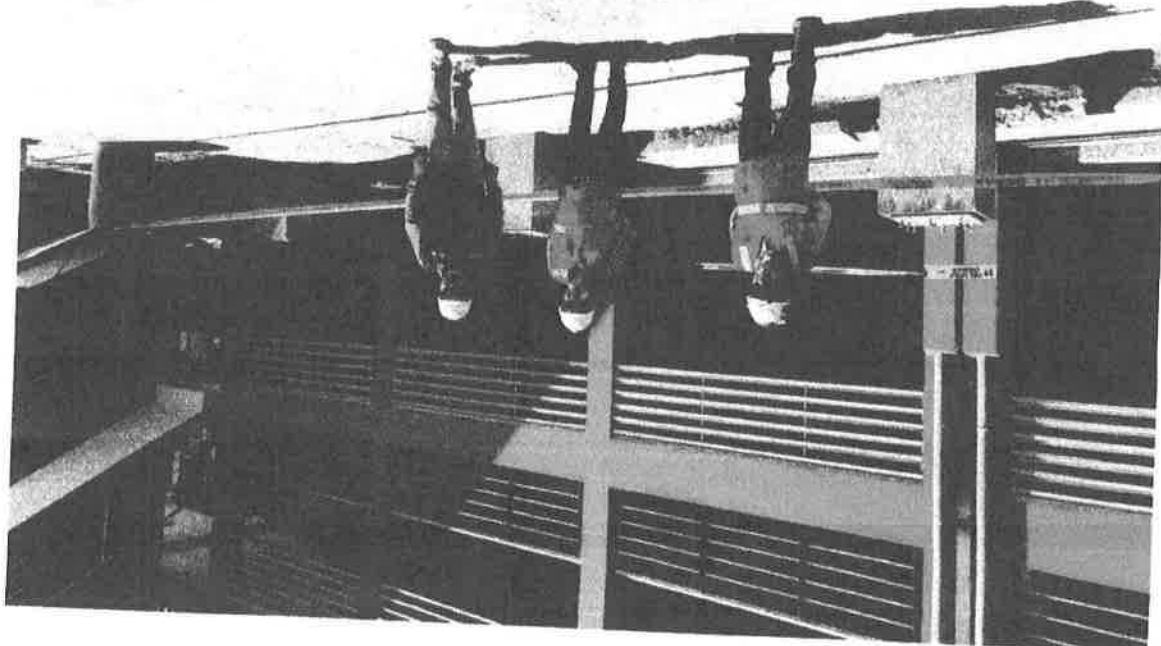

**INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN
DE LA SUPERVISIÓN
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)**

OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496**

EJECUTA : CONSORCIO CAJAMARCA
RESIDENTE : ING. ROLANDO E. PEREZ GODOY
SUPERVISA : CONSORCIO SUPERVISOR JV
SUPERVISOR : ING. ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO

CAJAMARCA, ABRIL 2024

INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7603016
RESPONSABLE COMITÉ

INTRODUCCIÓN..... 4

1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA..... 5

1.1. CONTRATISTA DE OBRA..... 5

1.2. CONSULTOR DE OBRA..... 5

1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA..... 7

1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA..... 7

1.5. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA..... 7

1.6. RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DE LA OBRA..... 8

1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA..... 8

2. RESUMEN EJECUTIVO..... 9

2.1. NOMBRE DE LA OBRA..... 9

2.2. ANTECEDENTES..... 9

2.3. UBICACIÓN..... 11

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA..... 11

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA..... 12

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL..... 12

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR..... 12

2.5.1. VÍAS DE ACCESO..... 12

2.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA..... 12

2.5.3. METAS DEL PROYECTO..... 13

2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA..... 13

2.7. PRESUPUESTO OFERTADO CONTRACTUAL POR CONTRATISTA..... 14

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN..... 15

2.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN..... 15

INDICE

	PROYECTO:	“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496
	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN	Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

353

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTO DAVID PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 7055018

INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA
Rolando Angulo Alcamino

- 2.10. NORMAS Y REGLAMENTOS15
- 2.11. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA16
- 3. VALORIZACIÓN Nº02 DE OBRA17
- 3.1. INTRODUCCIÓN17
- 3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA17
- 3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO18
- 3.4. OBJETIVO PRINCIPAL18
- 3.5. DESARROLLO DE LA OBRA19
- 3.6. CONTROL DE CALIDAD24
- 3.7. CONTROL DE PLAZOS25
- 4. CONCLUSIONES26
- 5. RECOMENDACIONES27

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	
	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	

382

INTRODUCCIÓN

El presente informe de conformidad de valorización se elabora en el contexto del contrato de construcción para la "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". El contrato se rige bajo el sistema de contratación a suma alzada, en el cual se estableció un precio fijo para la ejecución de la obra, independientemente de los costos reales en los que pueda incurrir el contratista.

El objetivo principal de este informe es verificar y certificar que los trabajos realizados por el CONTRATISTA hasta la fecha están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción. Asimismo, se busca asegurar que los valores presentados para su pago sean justos y correspondan fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados. Durante el proceso de elaboración de este informe, se realizaron inspecciones detalladas de los trabajos realizados, se revisaron los documentos pertinentes, se analizaron los avances registrados y se llevaron a cabo reuniones con el equipo técnico y el contratista para recopilar la información necesaria.

El informe está estructurado en varias secciones que detallan los aspectos relevantes del proceso de valorización, incluyendo el avance físico y financiero de la obra, las observaciones y recomendaciones derivadas de las inspecciones realizadas, así como cualquier otra información relevante para garantizar el cumplimiento satisfactorio del contrato.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
 SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
 DNI: 78056016
 REPRESENTANTE COMÚN

ROLANDO ALVARADO
 INGENIERO CIVIL
 CIR. 131027
 SUPERVISOR DE OBRA



PROYECTO:
 "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN
 N°02
 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

350

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
--	---	--

VALORIZACIÓN Nº02
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

1. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

- PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

• UBICACIÓN POLÍTICA:

- ✓ Distrito: Cajamarca
- ✓ Provincia: Cajamarca
- ✓ Departamento: Cajamarca

• ENTIDAD: Gobierno Regional De Cajamarca

- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE E.T.: Resolución Gerencial Regional Nº D92-2023-GR.CAJ/GRI, de fecha 30/10/2023
- FECHA PRESUPUESTO BASE: Octubre - 2023

• Consultor del E.T.: Ing. Elmer Bustamante Valdivia - CIP. Nº 139745

1.1. CONTRATISTA DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada - Nº078-2023-GR.CAJ-Ira C, convocado el 18/12/2023

- NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: IOAR Aprobado
- PRESUPUESTO BASE: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

- FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000

- EMPRESA EJECUTORA: Consorcio Cajamarca

✓ Sr. Francis Arturo Figueroa Torres (Representante Común)

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTIAGO DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7605216
REPRESENTANTE COMÚN

ROLANDO ANTONIO FIGUEROA TORRES
INGENIERO CIVIL
CIP: 139745
SUPERVISOR DE OBRA

349

CSJV "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	--

- CONTRATO DE OBRA: Contrato N°015-2024- GR.CAJ-GGR, fecha 16/02/2024
- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 120 días calendario
- SISTEMA DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)
 - ✓ S/ 194,365.25
- RESIDENTE DE OBRA: Ing. Rolando Eloy Pérez Godoy - CIP N°107626

1.2. CONSULTOR DE OBRA

- PROCESO DE SELECCIÓN: Adjudicación Simplificada N°088-2023-GR.CAJ - Ira C, convocado el 12/12/2023
- PRESUPUESTO BASE: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)
- FACTOR DE RELACIÓN: 1.00000
- EMPRESA CONSULTORA: Consorcio Supervisor JV
- ✓ Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)

- CONTRATO DE CONSULTORIA: Contrato N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, fecha 21/02/2024

- PLAZO DE CONSULTORIA: 180 días calendario

- SISTEMA DE EJECUCIÓN:

- ✓ Tarifas (Supervisión de la Obra) (120 d.c.)
- ✓ Suma Alzada (Liquidación de Obra) (60 d.c.)

- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Retención del (10%)
 - ✓ S/ 9,970.94

- SUPERVISOR DE OBRA: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro - CIP N°131027

CONSORCIO SUPERVISOR JV
DAVID PÉREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP 131027

ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	---	--

1.3. DATOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 01/03/2024
- FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 02/03/2024
- TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL: 29/06/2024

1.4. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

- Nº DE VALORIZACIONES TRAMITADAS: 01
- ✓ Valorización Nº02 del 01 al 30 de Abril del 2024
- Nº DE VALORIZACIONES PAGADAS: 01
- PERIODO DE VALORIZACIÓN ACTUAL: Valorización Nº 02 (01 al 30 de Abril del 2024)
- VALORIZACIÓN BRUTA (INC. IGV):
✓ S/ 1,943,652.51 (Total de proyecto)

AVANCE EFECTUADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
14.1860373%	36.3074972%	50.4935345%	49.5064655%
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
17.5354714%	28.3831234%	45.9185948%	54.0814052%

- ESTADO DE LA OBRA: En Ejecución y ADELANTADA en un 4.5749397%

1.5. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

AVANCE EFECTUADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 275,727.27	S/ 705,691.58	S/ 981,418.85	S/ 962,233.66
AVANCE PROGRAMADO			
ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
S/ 340,828.63	S/ 551,669.29	S/ 892,497.92	S/ 1,051,154.59

- ESTADO DE LA OBRA: En Ejecución y ADELANTADA en S/ 88,920.93.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
S. Compañía
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
CUI: 2585496
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Andrés Angajones Méndez
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR JV

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

1.6. RESUMEN DE VALORIZACIÓN BRUTA DE LA OBRA

Fórmula	Fórmula	Descripción	Presupuesto	Subtotal	Mes Anterior	Mes Actual	Acumulado	Saldo
1	ESTRUCTURAS	G.G. (95699971%CD)	S/ 106,205.42	S/ 106,205.42	S/ 10,252.16	S/ 95,953.26	S/ 95,953.26	S/ 49,137.86
		UT.LIBRO (5.00000035%CD)	S/ 20,205.42	S/ 20,205.42	S/ 2,020.54	S/ 18,184.88	S/ 18,184.88	S/ 9,092.44
		COSTO DIRECTO	S/ 126,410.84	S/ 126,410.84	S/ 12,272.70	S/ 114,138.14	S/ 114,138.14	S/ 58,230.30
2	ARQUITECTURA	G.G. (95699971%CD)	S/ 10,205.42	S/ 10,205.42	S/ 1,020.54	S/ 9,184.88	S/ 9,184.88	S/ 4,592.44
		UT.LIBRO (5.00000035%CD)	S/ 2,020.54	S/ 2,020.54	S/ 202.05	S/ 1,818.49	S/ 1,818.49	S/ 909.24
		COSTO DIRECTO	S/ 12,225.96	S/ 12,225.96	S/ 1,222.59	S/ 11,003.37	S/ 11,003.37	S/ 5,501.68
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	G.G. (95699971%CD)	S/ 2,020.54	S/ 2,020.54	S/ 202.05	S/ 1,818.49	S/ 1,818.49	S/ 909.24
		UT.LIBRO (5.00000035%CD)	S/ 404.11	S/ 404.11	S/ 40.41	S/ 363.70	S/ 363.70	S/ 181.85
		COSTO DIRECTO	S/ 2,424.65	S/ 2,424.65	S/ 242.46	S/ 2,182.19	S/ 2,182.19	S/ 1,091.09
4	INSTALACIONES SANITARIAS	G.G. (95699971%CD)	S/ 1,020.54	S/ 1,020.54	S/ 102.05	S/ 918.49	S/ 918.49	S/ 459.24
		UT.LIBRO (5.00000035%CD)	S/ 204.11	S/ 204.11	S/ 20.41	S/ 183.70	S/ 183.70	S/ 91.85
		COSTO DIRECTO	S/ 1,224.65	S/ 1,224.65	S/ 122.46	S/ 1,102.19	S/ 1,102.19	S/ 551.09
SUB PRESUPUESTO TOTAL			S/ 1,444,387.10	S/ 1,444,387.10	S/ 144,438.71	S/ 1,300,000.00	S/ 1,300,000.00	S/ 660,000.00
SUB TOTAL			S/ 23,754.30	S/ 23,754.30	S/ 2,375.43	S/ 21,378.87	S/ 21,378.87	S/ 10,689.43
G.G. (95699971%CD)			S/ 129,506.68	S/ 129,506.68	S/ 12,950.66	S/ 116,556.02	S/ 116,556.02	S/ 58,278.01
UT.LIBRO (5.00000035%CD)			S/ 72,289.36	S/ 72,289.36	S/ 7,228.93	S/ 65,060.43	S/ 65,060.43	S/ 32,530.25
SUB TOTAL			S/ 206,446.37	S/ 206,446.37	S/ 20,644.63	S/ 185,801.74	S/ 185,801.74	S/ 90,808.26
G.G. (95699971%CD)			S/ 42,060.09	S/ 42,060.09	S/ 4,206.00	S/ 37,854.09	S/ 37,854.09	S/ 18,927.04
UT.LIBRO (5.00000035%CD)			S/ 233,667.18	S/ 233,667.18	S/ 23,366.71	S/ 210,300.47	S/ 210,300.47	S/ 105,151.22
SUB PRESUPUESTO TOTAL			S/ 1,444,387.10	S/ 1,444,387.10	S/ 144,438.71	S/ 1,300,000.00	S/ 1,300,000.00	S/ 660,000.00
TOTAL (EJECUCIÓN DE OBRA)			S/ 1,444,387.10	S/ 1,444,387.10	S/ 144,438.71	S/ 1,300,000.00	S/ 1,300,000.00	S/ 660,000.00

1.7. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

A. OBRA CIVIL	S/ 598,043.71		S/ 598,043.71
B. VALORIZACIÓN BRUTA	S/ 598,043.71		S/ 598,043.71
C. REAJUSTES	S/ 0.00		S/ 0.00
D. DEDUCCIONES	S/ 0.00		S/ 0.00
E. AMORTIZACIONES	S/ 0.00		S/ 0.00
F. SUBTOTAL DE OBRA	S/ 598,043.71		S/ 598,043.71
G. IGV (18%)	S/ 107,647.87		S/ 107,647.87
H. MONTO A FACTURAR (OBRA)	S/ 705,691.58		S/ 705,691.58
I. RETENCIÓN DE 10% (2/2)	-S/ 97,182.62		-S/ 97,182.62
J. MONTO A CANCELAR (OBRA)	S/ 608,508.96		S/ 608,508.96
(INC. IGV)			

INGENIERO CIVIL
CP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMPLER DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7605016
REPRESENTANTE COMUN

346

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	---

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. NOMBRE DE LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) IE I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

2.2. ANTECEDENTES

- Con fecha 18/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496
- Con fecha 12/12/2023, se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra.
- Con fecha 30/01/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO CAJAMARCA como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 07/02/2024, se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO SUPERVISOR JV como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.

- PRIMERA CONVOCATORIA.
- Con fecha 16/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO Nº015-2024-GR.CAJ-GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Díaz y por otra parte el CONSORCIO CAJAMARCA con su representante común el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres, ganador de la buena pro ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - Nº078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DE REPRESENTACIÓN COMUN

INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"
--	---	--

CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

- Con fecha 21/02/2024, se realizó la firma del CONTRATO N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Díaz y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR JV representado por el Sr. Samuel David Pérez Silva, ganador de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la liquidación de obra.

- Con fecha 01/03/2024, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en representación la Ing. Doris Jimenez en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y la Ing. Lizabeth Saldaña Cedron en calidad de Coordinadora de Obra; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Pérez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra.

- Con fecha 02/03/2024, se firma el ACTA DE DISPOSICION DE TERRENO, por parte del I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA en representación la Sor. Margarita Castilla Felix en calidad de Directora de la I.E. y la Sra. Yarithal Terrones Cotrina en calidad de Administradora de la I.E.; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Pérez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra; quedando esta acta como muestra del Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
 SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
 CUI: 2585496
 REPRESENTANTE COMÚN

ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 131027
 SUPERVISOR DE OBRA

345

344

CSJV CONSORCIO SUPERVISOR JV	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
---	--	--

2.3. UBICACIÓN

2.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Geográficamente el distrito de Cajamarca se ubica en la sierra norte de la Región Cajamarca, en la Provincia de Cajamarca.

Su altitud es de 2,750 m.s.n.m.

Sus coordenadas GEODESICAS ESTAN ESTABLECIDAS EN:

7° 9'22.05" LATITUD SUR

78°30'44.68" LONGITUD OESTE

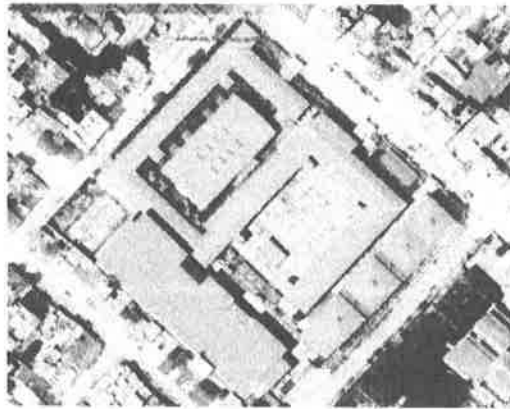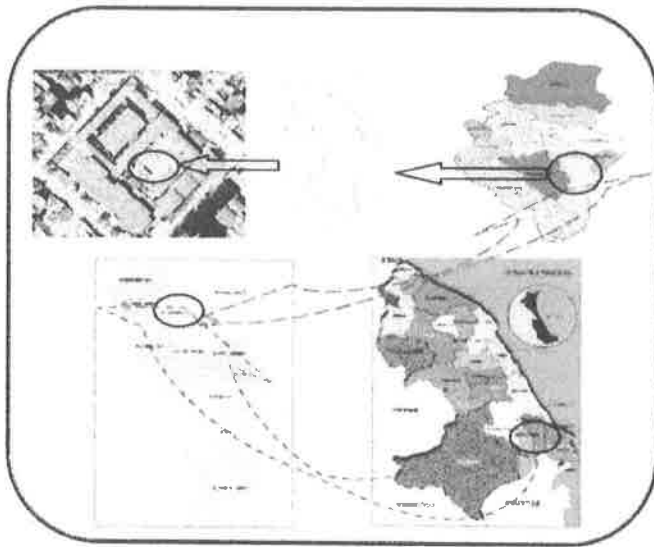

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

Imagen satelital actual I.E. Emblematíco Santa Teresita - Distrito Cajamarca

CAJAMARCA – CAJAMARCA – 2024. Fuente: Elaboración propia

343

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	---	---

2.3.2. UBICACIÓN POLÍTICA

Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del informe de conformidad de valorización en el contexto de la "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", es verificar y certificar que los trabajos realizados están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción y que los valores presentados para su pago son justos y corresponden fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados.

2.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR

2.5.1. VÍAS DE ACCESO

CUADRO DE ACCESO

Desde	Hacia	Tipo de Transporte	Tipo de Via	Distancia (m.)	Tiempo: vehículo (Minutos)
Plaza de Armas Cajamarca	Cajamarca	Vehículo	Pavimento de concreto	600	10 min

Fuente: Elaboración Propia y MRP/PERT

2.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La ejecución del proyecto en la Institución Educativa emblemática Santa Teresita, considera la construcción de cobertura de la instalación deportiva (patio multi usos):

MODULO

Cobertura de instalación deportiva:

01

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7605416
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
CIR 131027
SUPERVISOR DE OBRA

INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA DEL
MES DE ABRIL DEL 2024

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI.: 2585496



GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

DISTRITO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DN: 70184165

CONSORCIO CAJAMARCA
Rodrigo Eloy Pérez Góngora
Presidente de Obra
CIP: 107228

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DN: 76036016
REPRESENTANTE COMUN


Rolando Anyaypoma Jilcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

ABRIL DEL 2024


310

INDICE

2.1.	DATOS GENERALES	4
2.2.	INTRODUCCION	5
2.3.	ANTECEDENTES	5
2.4.	OBJETIVO PRINCIPAL:	8
2.5.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	8
2.6.	PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA:	9
2.7.	PRESUPUESTO OFERTADO CONTRACTUAL POR CONTRATISTA:	10
2.8.	NORMAS Y REGLAMENTOS:	11
2.9.	INICIO DE LOS TRABAJOS	11
2.10.	PLAZO DE EJECUCION:	11
2.11.	FIN DE LOS TRABAJOS	11
2.12.	SISTEMA DE CONTRATACION:	11
2.13.	CUADERNO DE OBRA O TRABAJOS	11
2.14.	DESARROLLO DE LA OBRA	12
2.15.	RESUMEN DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA	14
2.16.	RETENCION DEL 10% DE FONDO DE GARANTIA	15
2.17.	DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA	16
2.18.	CONTROL DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE CONTRATISTA	17
2.19.	CONTROL DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE CONTRATISTA	18
2.20.	CONTROLES DE OBRA	19
2.21.	CONCLUSIONES	20
2.22.	RECOMENDACIONES	20




CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 75056019
REPRESENTANTE COMUN



ROLANDO ANAYA POMA JUCUMORO
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
DNI: 70184766
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO CAJAMARCA
Roberto Eloy Perez Godoy
DNI: 1039330
Presidente de Obra

2.1. DATOS GENERALES

-Obra	IOARR-“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE
	EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA
	LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
	CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA,
	DEPARTAMENTO CAJAMARCA "
	DISTRITO CAJAMARCA
-Ubicación Geográfica	DISTrito : Cajamarca
	Provincia : Cajamarca
	Departamento : Cajamarca
-Entidad Contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
	2585496
-Código Único de Inversión	Resolución Gerencial Regional N° D92-2023-
	GR.CAJ/GRI, de fecha 30/10/2023
-Fecha Presupuesto Base	Octubre - 2023
-Presupuesto Base	S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
-Presupuesto Contratado	S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)
-Contratista	CONSORCIO CAJAMARCA
	- Sr. Francis Arturo Figueroa Torres (Representante
	Común)
-Contrato de Obra	Contrato N°015-2024- GR.CAJ-GGR, fecha 16/02/2024
	120 días calendario
-Sistema de Ejecución	Suma Alzada
-Residente de Obra	Ing. Rolando Eloy Perez Godoy - CIP N°107626
-Consultor	CONSORCIO SUPERVISOR JV
-Jefe de Supervisión de obra	-Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)
	Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro - CIP N°131027
-Fecha de Entrega de Terreno	01/03/2024
-Fecha de Inicio de Ejecución	02/03/2024
-Termino de plazo contractual	29/06/2024

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7605616
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184166

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Perez Godoy
Residente de Obra
CIP: 107626

2.2.INTRODUCCION

En el presente mes de abril del 2024, se han ejecutado 30 días calendario desde el 01 al 30 del presente mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a seguridad y salud en obra, limpieza, movimiento de tierras, obras de concreto armado y estructuras metálicas referente a la construcción de cobertura metálica en la IE. Santa Teresita.

2.3.ANTECEDENTES

-Con fecha dieciocho (18) de diciembre del 2023 se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI: 2585496

-Con fecha doce (12) de diciembre del 2023 se convoca la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra.

-Con fecha treinta (30) de enero del 2024 se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO CAJAMARCA como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.

-Con fecha siete (07) de febrero del 2024 se otorga la BUENA PRO al CONSORCIO SUPERVISOR JV como ganador de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA.

-Con fecha dieciséis(16) de febrero del 2024, se realizó la firma del CONTRATO N°015-2024- GR.CAJ-GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Díaz y por otra parte el CONSORCIO CAJAMARCA con su representante común el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres, ganador de la buena pro ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - N°078-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

-Con fecha veintuno(21) de febrero del 2024, se realizó la firma del CONTRATO N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA representada en calidad de Gerente General Regional por el Ing. Jesús Julca Díaz y por otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR JV representado por el Sr. Samuel David Perez Silva, ganador de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°088-2023-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA, por un monto que asciende a la suma de

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DUI: 705601
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70182155

Rolando Anguipoma Jilancino
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100

SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la liquidación de obra.

-Con fecha uno (01) de marzo del 2024 se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en representación la Ing. Doris Jimenez en calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones y la Ing. Lizbeth Saldaña Cedron en calidad de Coordinadora de Obra; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra.

-Con fecha dos (02) de marzo del 2024 se firma el ACTA DE DISPOSICION DE TERRENO, por parte del I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA en representación la Sor. Margarita Castilla Felix en calidad de Directora de la I.E. y la Sra. Yaribal Terrones Cotrina en calidad de Administradora de la I.E.; por parte de la supervisión el Sr. Samuel David Perez Silva en calidad de representante común del CONSORCIO SUPERVISOR JV y el Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro en calidad de Jefe de Supervisión de Obra; y por parte del contratista el Sr. Francis Arturo Figueroa Torres en calidad de representante común del CONSORCIO CAJAMARCA y el Ing. Rolando Eloy Perez Godoy en calidad de Residente de Obra; quedando esta acta como muestra del inicio del Plazo de Ejecución de la Obra.

- Con fecha catorce (14) de marzo del 2024 con CARTA N°D55-2024-GR.CAJ/GRI la Entidad Aprueba los Calendarios Valorizados Actualizados de Obra – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496; que serán usados como fines de control físico y financiero en la obra.

-Con fecha treinta y uno (31) de marzo del 2024 con CARTA N° 006-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó la Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496. -Con fecha quince (15) de abril del 2024 con CARTA N° 009-CC/FAFT-CAJ/2024 se presentó el levantamiento de observaciones de Valorización N° 1 de Obra correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo del 2024 – Proyecto: IOARR-

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 70184166

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Rolando Anyaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA
DNI: 7056015

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7056015
REPRESENTANTE COMUN

307

CONSORCIO CAJAMARCA	
Proyecto: IOARR-"Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585496	
INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA - DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	

"Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585496.

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Angulo Jilcamoro
INGEN. : C. C. U.
CIP: 13102/
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
DNI: 70184166
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
DNI: 107628
REPRESENTANTE COMÚN

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL:

El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:

- ❖ "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"
- ❖ Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita, donde la construcción de la cobertura de la Instalación Deportiva tenga un diseño moderno y de calidad, salvaguardando no solo la integridad de las estudiantes, personal docente y administrativo.

2.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

A continuación, se describe las Metas en función a la nomenclatura indicada en los Planos:

METAS FISICAS DEL PROYECTO			
MODULO	CANTIDAD	AREA OCUPADA	UNIDAD
	01	2,118.39	M2
-COBERTURA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA			
OTROS			
-INSTALACIONES ELÉCTRICA	01	1	GLB
-DRENAJE PLUVIAL	01	1	GLB

Rolando A.
INGENIERO
CIP: 13
SUPERVISOR

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7656016
ALPESSENTANTE COMÚN

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP: 107528

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184166

El Valor Referencial del proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 1,943,652.51 (Un millón novecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos con 51/100 soles). El Costo Total de Inversión del Proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 2,098,648.07 (Dos millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con 07/100), con precios vigentes al mes octubre del 2023, conforme el siguiente resumen:

con precios vigentes al mes octubre del 2023, conforme el siguiente resumen:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO		
ITEM	COMPONENTE	MONTO
1	ESTRUCTURAS	S/ 1,185,328.39
2	ARQUITECTURA	S/ 216,190.04
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 23,024.26
4	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 20,844.41
6	COSTO DIRECTO	S/ 1,445,387.10
7	GASTOS GENERALES (8.96%)	S/ 129,506.68
8	UTILIDAD (5%)	S/ 72,269.36
9	SUB TOTAL	S/ 1,647,163.14
10	IGV (18%)	S/ 296,489.37
11	VALOR REFERENCIAL	S/ 1,943,652.51
13	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 55,286.18
12	SUPERVISION (4.62%)	S/ 89,796.75
12	LIQUIDACION (0.51%)	S/ 9,912.63
16	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 2,098,648.07

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 07/100 SOLES

CONSORCIO CAYAMARCA

2.7. PRESUPUESTO OFERTADO CONTRATUAL POR CONTRATISTA:

El monto contractual total de la obra asciende A S/ 1,943,652.51 (SON: 1111UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCION		PARCIAL
SUBPRESUPUESTO (1.00) ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO	S/ 1,185,328.39
	G.G (8.95999971% CD)	S/ 106,205.42
	UTILIDAD (5.00000035% CD)	S/ 59,266.42
	SUB TOTAL	S/ 1,350,800.23
	IGV (18.000%)	S/ 243,144.04
	SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 1,593,944.27
SUBPRESUPUESTO (2.00) ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO	S/ 216,190.04
	G.G (8.95999971% CD)	S/ 19,370.63
	UTILIDAD (5.00000035% CD)	S/ 10,809.50
	SUB TOTAL	S/ 246,370.17
	IGV (18.000%)	S/ 44,346.63
	SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 290,716.80
SUBPRESUPUESTO (3.00) INSTALACIONES ELECTRICAS	COSTO DIRECTO	S/ 23,024.26
	G.G (8.95999971% CD)	S/ 2,062.97
	UTILIDAD (5.00000035% CD)	S/ 1,151.21
	SUB TOTAL	S/ 26,238.44
	IGV (18.000%)	S/ 4,722.92
	SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 30,961.36
SUBPRESUPUESTO (4.00) INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO	S/ 20,844.41
	G.G (8.95999971% CD)	S/ 1,867.66
	UTILIDAD (5.00000035% CD)	S/ 1,042.23
	SUB TOTAL	S/ 23,754.30
	IGV (18.000%)	S/ 4,275.78
	SUB PRESUPUESTO TOTAL	S/ 28,030.08
COMPONENTE (1) OBRA CIVIL	COSTO DIRECTO	S/ 1,445,387.10
	G.G (8.95999971% CD)	S/ 129,506.68
	UTILIDAD (5.00000035% CD)	S/ 72,269.36
	SUB TOTAL	S/ 1,647,163.14
	IGV (18.000%)	S/ 296,489.37
	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 1,943,652.51

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAAMUEL DAVID PEREZ SILVA

DNI: 76056016

REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Figueroa Torres

DNI: 70184166

REPRESENTANTE COMUN

ROLANDO ARGUJON DIAZ

INGENIERO CIVIL

CIP: 131027

SUPERVISOR DE OBRA

Mz. D Lote 1 urb. Hurtado Miller - Los Baños del Inca - Cajamarca

10

303

CONSORCIO CAJAMARCA 	INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA - DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
	Proyecto: IOARR-"Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca", CUI: 2585496


2.14. DESARROLLO DE LA OBRA


a) Aspectos Técnicos

La Residencia de Obra trabaja en los procesos de seguimiento, control y ejecución, a través de la coordinación permanente en obra con el Ing. Supervisor de obra, maestro de obra, operarios y trabajadores en general de la Obra y en virtud de las funciones inherentes. En lo que respecta al aspecto técnico se controla directamente in situ todas las partidas que se ejecutan y que estas se desarrollen de acuerdo con el expediente técnico.

b) Descripción de las partidas ejecutadas

En lo que respecta al aspecto técnico se controla directamente in situ todas las partidas que se ejecutan y que estas se desarrollen de acuerdo con lo indicado en el expediente técnico y Normativa Vigente.


Rolando Anguipoma Vilcamayo
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI. 74836018
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueiras
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 70184165


CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Góngora
Residente de Obra
CIP: 107020


501

Los trabajos realizados en el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024, en los cuales fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UND	AVANCES EJECUTADOS
01	ESTRUCTURAS		
01.02	CONTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.02.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	0.25
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.02	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS	gib	0.15
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION	gib	0.15
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	0.50
01.04	MITIGACION AMBIENTAL		
01.04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	0.25
01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.06.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	27.87
01.08	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.08.03	PEDESTAL		
01.08.03.01	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=280 KG/CM2	m3	17.86
01.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL	m2	126.72
01.09	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.09.01	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 300 X 300 X 8.0 MM	Und	64.00
01.09.02	VIGAS DE TUBO DE ACERO 100 X 250 X 4.50 MM	m	377.00
01.09.03	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12.5mm (1/2") con PERNOS DE 1" (incluye nivelacion con GROUT)	Und	32.00
01.09.06	MONTAJE DE COLUMNAS - VIGAS	Und	32.00
01.10	VARIOS		
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS	gib	0.05
2	ARQUITECTURA		
02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.01.01	TARAJEO EN SUPERFICIE DE PEDESTAL CON C/A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	30.72
02.01.02	OCHAVO EN PEDESTAL C/A= 1:5	m	56.32
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION DE INSTALACION		
03.01.11	POZO ATIERRA	Und	2.00




Rolando Anguipoma Uteaurero
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA



Amul David Perez Silva
CIP. 2506016
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR JV



Francisco Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 70184765
CONSORCIO CAJAMARCA



Rolando Eloy Perez Godoy
Residente de Obra
CIP. 100420
CONSORCIO CAJAMARCA

2.15. RESUMEN DE VALORIZACION DE EJECUCION DE OBRA

FORMULA	FÓRMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO SUBTOTAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
				MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1	ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO	S/. 1,185,328.39	S/ 205,043.15		S/ 521,157.26		S/ 726,200.41		S/ 459,127.98	
		G.G (8.95999971%CD)	S/. 106,205.42	S/ 18,371.87		S/ 46,665.69		S/ 65,067.56		S/ 41,137.86	
		UTILIDAD (6.00000035%CD)	S/. 59,266.42	S/ 10,252.16	17.2984260%	S/ 26,057.86	43.9673314%	S/ 36,310.02	61.2657574%	S/ 22,656.40	38.7342425%
		SUB TOTAL	S/. 1,350,800.23	S/ 223,667.18		S/ 593,910.81		S/ 827,577.99		S/ 523,222.24	
2	ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO	S/. 216,190.04			S/ 171,564.06		S/ 1,564.06		S/ 214,625.98	
		G.G (8.95999971%CD)	S/. 19,370.63			S/ 140.14		S/ 140.14		S/ 19,230.49	
		UTILIDAD (6.00000035%CD)	S/. 10,809.50			S/ 78.20	0.7234635%	S/ 78.20	0.7234635%	S/ 10,731.30	99.2765366%
		SUB TOTAL	S/. 246,370.17			S/ 1,782.40		S/ 1,782.40		S/ 244,587.77	
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	COSTO DIRECTO	S/. 23,024.26			S/ 2,062.56		S/ 2,062.56		S/ 20,961.70	
		G.G (8.95999971%CD)	S/. 2,062.97			S/ 184.81		S/ 184.81		S/ 1,878.16	
		UTILIDAD (6.00000035%CD)	S/. 1,151.21			S/ 103.13	8.9582305%	S/ 103.13	8.9582305%	S/ 1,048.08	91.0417695%
		SUB TOTAL	S/. 26,238.44			S/ 2,350.50		S/ 2,350.50		S/ 23,887.94	
4	INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO	S/. 20,844.41							S/ 20,844.41	
		G.G (8.95999971%CD)	S/. 1,867.66							S/ 1,867.66	
		UTILIDAD (6.00000035%CD)	S/. 1,042.23							S/ 1,042.23	100.0000000%
		SUB TOTAL	S/. 23,754.30							S/ 23,754.30	
TOTAL (EJECUCIÓN DE OBRA)											
SUB PRESUPUESTO TOTAL			S/. 1,943,652.51	S/ 275,727.27		S/ 705,691.58		S/ 981,418.85		S/ 962,233.66	

CONSORCIO CAJAMARCA

Francisco Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 70184164

CONSORCIO CAJAMARCA

Rolando Eloy Pérez Godoy
Presidente de Obra
CIP: 199826

CONSORCIO SUPERVISOR JV

Rolando Anguypona Alcamano
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE C

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7605016
REPRESENTANTE COMUN

2.16. RETENCION DEL 10% DE FONDO DE GARANTIA

N°	FÓRMULA	DESCRIPCION	FONDO DE GARANTIA	VALORIZACION N°01		VALORIZACION N°02		ACUMULADO	SALDO POR RETENER
				02 al 31- Marzo- 2024	MONTO RETENIDO (INC. IGV)	01 al 30- Abril - 2024	MONTO RETENIDO (INC. IGV)		
SUPERVISION)			MONTO CONTRACTUAL	S/ 1,943,652.51					
			GARANTIA (10%)	S/ 194,365.250	S/ 97,182.63	S/ 97,182.62	S/ 194,365.25	S/ 0.00	
			TOTAL		S/ 97,182.63	S/ 97,182.62	S/ 194,365.25	S/ 0.00	

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Figueroa Torres

REPRESENTANTE COMUN

DNI: 70184745




CONSORCIO CAJAMARCA

Rolando Eloy Pérez Godoy

Residente de Obra

CIP: 107530




CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA

DNI: 76056016

REPRESENTANTE COMUN



ROLANDO ANAYPOMA TILCAUORO

INGENIERO CIVIL

CIP 131027

SUPERVISOR DE OBRA



2024


2.17. DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA

El detalle de cancelación al contratista por ejecución de obra del periodo del 01 al 30 de Abril del 2024, en función a los días laborados es el siguiente:

SON: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 96/100 SOLES							
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - ABRIL DEL 2024							
S/ 608,608.96							
TOTAL (F) = MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA							
RETENCIONES	POR FONDO DE GARANTIA DE 10% (I)	1° RETENCION (12%) (INC. IGV)	2° RETENCION (12%) (INC. IGV)	S/ 194,366.26	S/ 97,182.63	S/ 97,182.62	
				S/ 194,366.25	S/ 97,182.62	S/ 194,365.25	
S/ 0.00							
SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100 SOLES							
MONTOS A FACTURAR A CONTRATISTA - ABRIL DEL 2024							
S/ 706,691.66							
MONTOS A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	EN EFECTIVO (VN)	MONTOS POR I.G.V. (18%)	MONTOS TOTAL CON I.G.V.	TOTAL (E) = MONTOS A FACTURAR POR CONTRATISTA			
				S/ 1,943,662.61	S/ 278,727.27	S/ 706,691.66	
S/ 1,647,163.14	S/ 296,489.37	S/ 233,667.18	S/ 42,080.09	S/ 598,043.71	S/ 107,647.87	S/ 831,710.89	
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - D)							
S/ 1,647,163.14							
S/ 233,667.18							
S/ 698,043.71							
S/ 831,710.89							
AMORTIZACIONES	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	TOTAL (D)				
			S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A + B - C)							
S/ 1,647,163.14							
S/ 233,667.18							
S/ 698,043.71							
S/ 831,710.89							
TOTAL (C)							
S/ 0.00							
DEDUCCIONES	POR ADELANTO DIRECTO	TOTAL (B)					
		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	
REAJUSTES	Realiste	TOTAL (A)					
		S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 698,043.71	S/ 831,710.89	S/ 815,452.25	
VALORIZACION CONTRACTUAL	VALORIZACION N°02 - TOTAL	PROYECTO TOTAL	% DE AVANCE EJECUTADO DE OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO DE OBRA	TOTAL (A)		
					S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 598,043.71
S/ 815,452.25							
VALORIZACION CONTRACTUAL	VALORIZACION N°02 - OBRA	ESTRUCTURAS	ARQUITECTURAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	TOTAL (A)	
						S/ 1,350,800.23	S/ 233,667.18
S/ 246,370.17	S/ 26,238.44	S/ 23,754.30	S/ 29,238.44	S/ 2,350.50	S/ 0.00	S/ 23,754.30	
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815,452.25							
S/ 815							

2.18. CONTROL DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE CONTRATISTA

En la presente Valorización de Obra N° 02 (Abril-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 36.3074972%, siendo el Programado de 28.3831234%. El avance acumulado ejecutado es de 50.4935345%, mientras el avance programado acumulado es de 45.9185948%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra ADELANTADA en 4.5735345%.

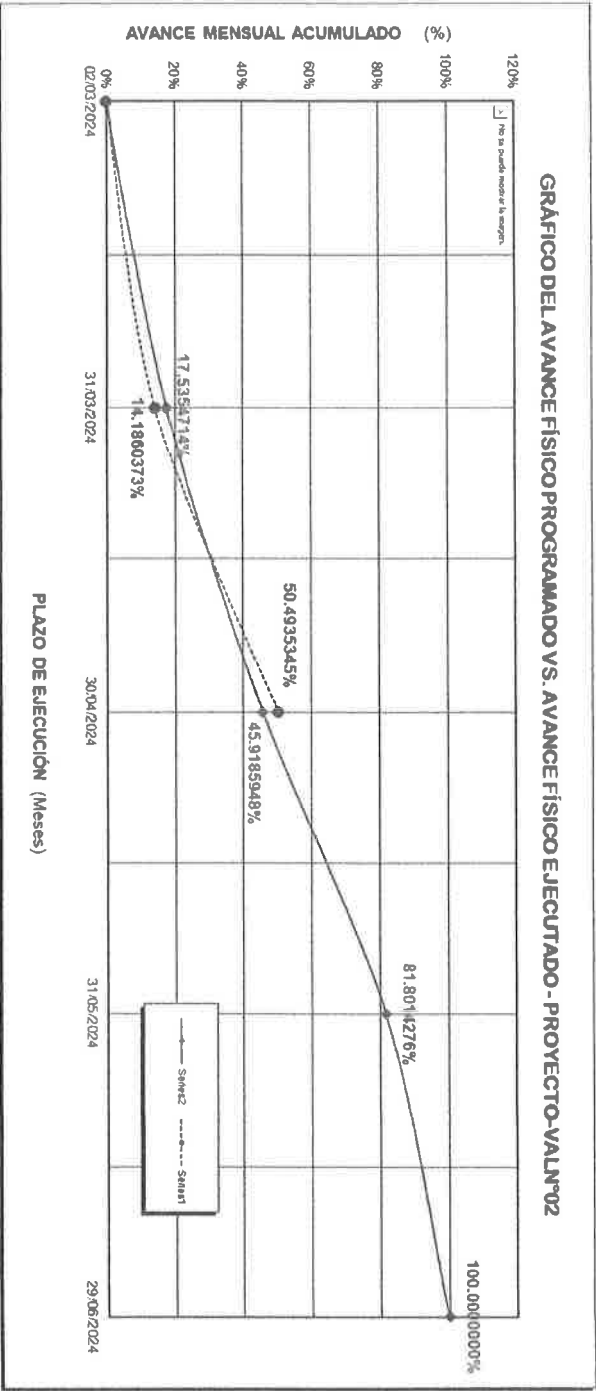

Rolando Anyayupoma Jilcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP. 107826

CONSORCIO SUPERVISOR
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Alvarado Torres
DNI: 70184165
REPRESENTANTE COMÚN

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
02/03/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0000000%	0.0000000%
31/03/2024	S/ 340,828.63	S/ 340,828.63	17.5354714%	17.5354714%
30/04/2024	S/ 551,669.29	S/ 892,497.92	28.3831234%	45.9185948%
31/05/2024	S/ 697,437.58	S/ 1,589,935.50	35.8828328%	81.8014276%
29/06/2024	S/ 353,717.01	S/ 1,943,652.51	18.1985724%	100.0000000%
TOTAL	1,943,652.51		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con/IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
02/03/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/03/2024	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	14.1860373%	14.1860373%
30/04/2024	S/ 705,691.58	S/ 981,418.85	36.3074972%	50.4935345%
31/05/2024				
29/06/2024				
TOTAL	981,418.85		50.4935345%	

2.19. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO DE CONTRATISTA

En la presente Valorización de Obra N° 02 (Abril - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de S/ 705,691.58 (SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 SOLES), teniendo un acumulado de S/ 981,418.85, incluido IGV; considerando que el monto acumulado programado es de S/ 892,497.92; se cuenta con un adelanto de S/ 88,920.93, incluido IGV.

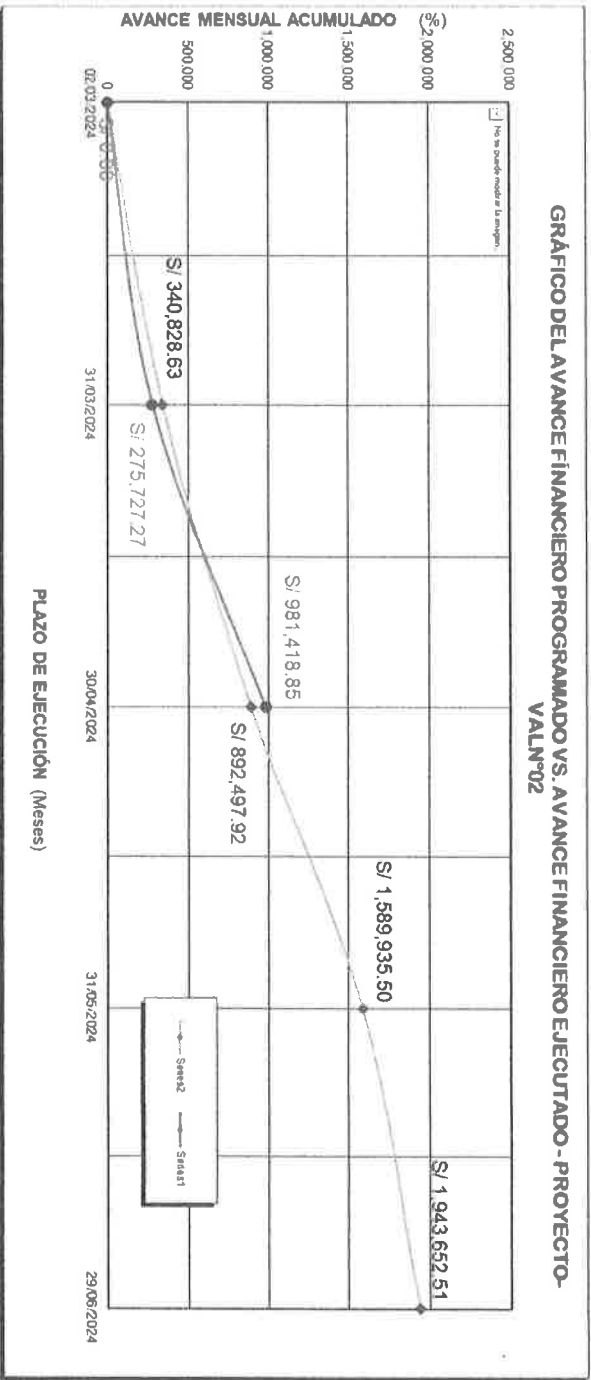

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184166

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Anyujpoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP: 107826

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA				
MES	MONTOS (Con IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
02/03/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00000000%	0.00000000%
31/03/2024	S/ 340,828.63	S/ 340,828.63	17.5354714%	17.5354714%
30/04/2024	S/ 551,669.29	S/ 892,497.92	28.3831234%	45.9185948%
31/05/2024	S/ 697,437.58	S/ 1,589,935.50	35.8828328%	81.8014276%
29/06/2024	S/ 353,717.01	S/ 1,943,652.51	18.1985724%	100.0000000%
TOTAL	1,943,652.51		100.00%	

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA				
MES	MONTOS (con IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
02/03/2024	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%
31/03/2024	S/ 275,727.27	S/ 275,727.27	14.1860373%	14.1860373%
30/04/2024	S/ 705,691.58	S/ 981,418.85	36.3074972%	50.4935345%
31/05/2024				
29/06/2024				
TOTAL	981,418.85		50.4935345%	

29/6

2.20. CONTROLES DE OBRA

a) Realiztes de precios de obra

A la fecha no se presenta cálculos de reajustes correspondientes al presente mes, debido a que se realizaran en la etapa de liquidación final de obra.

b) Adicionales y/o deductivos de obra

A la fecha no existen adicionales y/o deductivos de obra, solicitadas ni aprobadas por la entidad.

c) Ampliaciones de plazo de obra

A la fecha no existen ampliaciones de plazo solicitadas ni aprobadas por la entidad.

d) Métodos de Construcción empleados:

Los métodos de construcción empleado es el correspondiente a garantizar un buen comportamiento del sistema estructural (concreto preparado en obra en base a las dosificaciones indicadas en el Diseño de Mezclas, tanto como empresa Contratista en el vaciado y compactado en base a las recomendaciones de la normativa vigente, elementos de encofrado de madera correctamente nivelados u arriostros, curado por el método de riego continuo de agua etc.)

e) Control de pruebas previas de materiales

Se han verificado los materiales más incidentes en la ejecución de la obra, tal es el caso de:

❖ Como empresa Contratista presentamos Diseño de Mezcla.

❖ Cemento Portland Tipo I, Pacasmayo

❖ Se ha realizado el uso del cono y el llenado de probetas para su ensayo de

resistencia del concreto, $f_c' = 280\text{kg/cm}^2$

❖ Acero $f_y = 4200\text{kg/cm}^2$ usado de marca reconocida: ACEROS AREQUIPA

❖ Madera tornillo para los encofrados de todas las actividades que se requiere.

❖ Piedra chancada proveniente de chancadora ubicada en el distrito.

ROLANDO ANGELO J. JIMENEZ
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76056018
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 70184165

CONSORCIO CAJAMARCA
ROLANDO ELOY PEREZ GONZALEZ
Residente de Obra
CIP: 102620

2.21. CONCLUSIONES

✓ A la fecha de la presente Valorización de de Obra N° 02(Abril-2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 36.3074972%, siendo el Programado de 28.3831234%. El avance acumulado ejecutado es de 50.4935345%; mientras el avance programado acumulado es de 45.9185948%. Por lo tanto, se presenta un adelanto en la ejecución de la obra por 4.5735345%.

✓ **EL MONTO A FACTURAR POR LA VALORIZACIÓN N° 02 DEL PROYECTO:** IOARR-“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE COBERTURA DE COBERTURA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, correspondiente al periodo de ejecución del 01/04/2024 al 30/04/2024, asciende a S/ 705,691.58 (SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 SOLES), inc. I.G.V.

✓ **EL MONTO A RETENER POR FONDO DE GARANTIA DEL PROYECTO:** IOARR-“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE COBERTURA DE COBERTURA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, correspondiente al periodo de ejecución del 01/04/2024 al 30/04/2024, asciende a S/ 97,182.62 inc. I.G.V).

✓ **EL MONTO A CANCELAR DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL PROYECTO:** IOARR-“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE COBERTURA DE COBERTURA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, correspondiente al periodo de ejecución del 01/04/2024 al 30/04/2024, asciende a S/ S/ 608,508.96 (SON: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 96/100 SOLES), inc. I.G.V.

✓ Se vienen cumpliendo con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo con relación a la protección del personal y las señalizaciones preventivas en Obra.

2.22. RECOMENDACIONES

✓ Se recomienda a la Entidad el pago de la VALORIZACIÓN N° 02 DE OBRA correspondiente al mes de Abril - 2024, dentro de los plazos de ley

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Agustín Figuerola Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNE: 701847165

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP: 107620

Mz. D Lote 1 urb. Hurtado Miller - Los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca

Rolando Anguipoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID CEREZ SILVA
DNE: 7056016
REPRESENTANTE COMÚN

Francis Arturo Aguero Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184166
CONSORCIO CAJAMARCA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76056016
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Andrés Páez Godoi
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Ing. Andrés Páez Godoi
Residente de Obra
CIP: 103623

3. FICHA TECNICA

3. FICHA TECNICA

-Obra

: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

: Distrito : Cajamarca

: Provincia : Cajamarca

: Departamento : Cajamarca

: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

: 2585496

: Resolución Gerencial Regional N° D92-2023-GR.CAJ/GRI,

: de fecha 30/10/2023

: Octubre - 2023

: Ing. Elmer Bustamante Valdivia - CIP. N° 139745

3.1. EJECUTOR DE OBRA

-Proceso de Selección

: Adjudicación Simplificada - N°078-2023-GR.CAJ-1ra C, convocado el 18/12/2023

: IOAR Aprobado

: Nivel de estudio de Pre Inversión

: Presupuesto Base S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

: S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

: Presupuesto Contratado S/ 1,943,652.51 (Inc. IGV)

: Factor de Relación 1.00000

: Fecha de buena pro 30/01/2024

: -Contratista

-Contrato de Obra

: Plazo de Ejecución de Obra

: -Modalidad de Ejecución Por Contrata

: -Sistema de Ejecución Suma Alzada

: Retención del (10%) S/ 194,365.25 (según D.L. N°1553)

: Ing. Rolando Eloy Perez Godoy - CIP N°107626

3.2. SUPERVISION DE OBRA

-Proceso de Selección

: Adjudicación Simplificada N°088-2023-GR.CAJ - 1ra C, convocado el 12/12/2023

: Presupuesto Base S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

: S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

: Presupuesto Contratado S/ 99,709.38 (Inc. IGV)

: Factor de Relación 1.00000

: Fecha de buena pro 07/02/2024

: -Consultor

-Contrato de Consultoría

: Sr. Samuel David Pérez Silva (Representante Común)

: Contrato N°017 - 2024 - GR.CAJ - GGR, fecha 21/02/2024

CONSORCIO DA AMERICA

 CONSORCIO CAJAMARCA	INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA – DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
	Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 755459

4. MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP: 102820

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Hualpa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184165

Reinaldo Alaypoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR IV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7056016
REPRESENTANTE COMÚN

4. MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

- ❖ IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, en EL(LA) I.E. Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI: 2585496”.

4.2. UBICACION:

Geográficamente el distrito de Cajamarca se ubica en la sierra norte de la Región Cajamarca, en la Provincia de Cajamarca.

-Región : Cajamarca

-Provincia : Cajamarca

-Distrito : Cajamarca

-Su altitud es de 2,750 m.s.n.m.

-Sus coordenadas GEODESICAS ESTAN ESTABLE

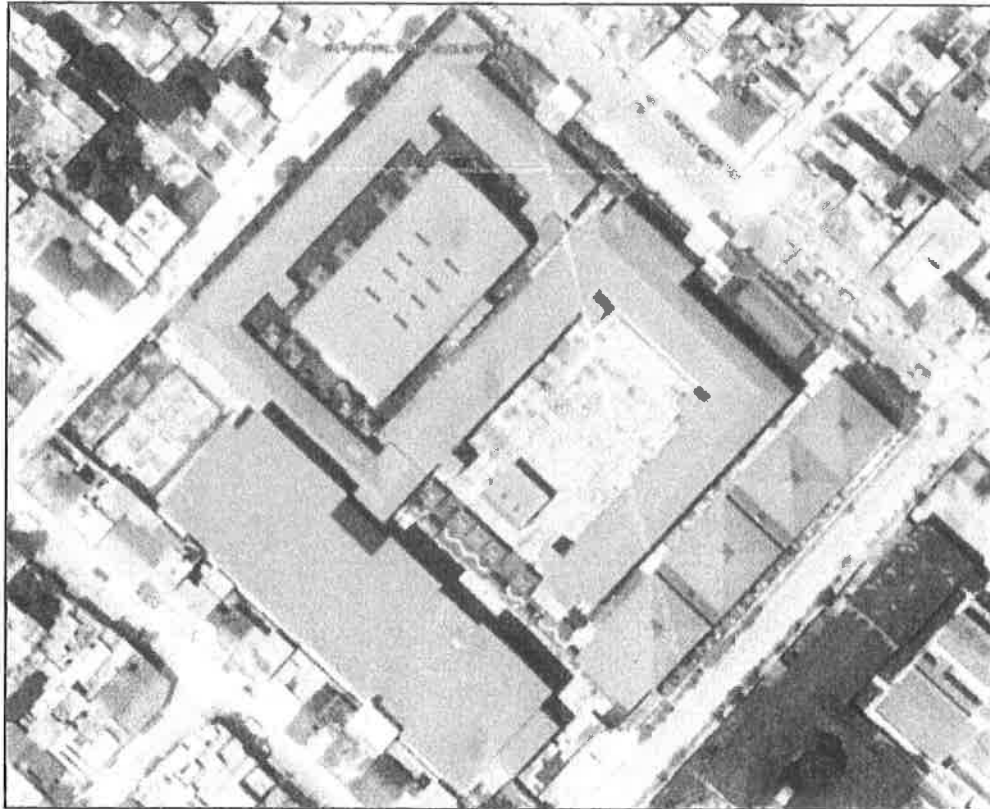



Imagen satelital actual I.E. Emblemático Santa Teresita – Distrito Cajamarca CAJAMARCA – 2023. Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Acuña Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70194766


Rolando Arayupoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO CAJAMARCA
Residente de Obra
Eduardo Eloy Pérez Godoy
CIP: 102820

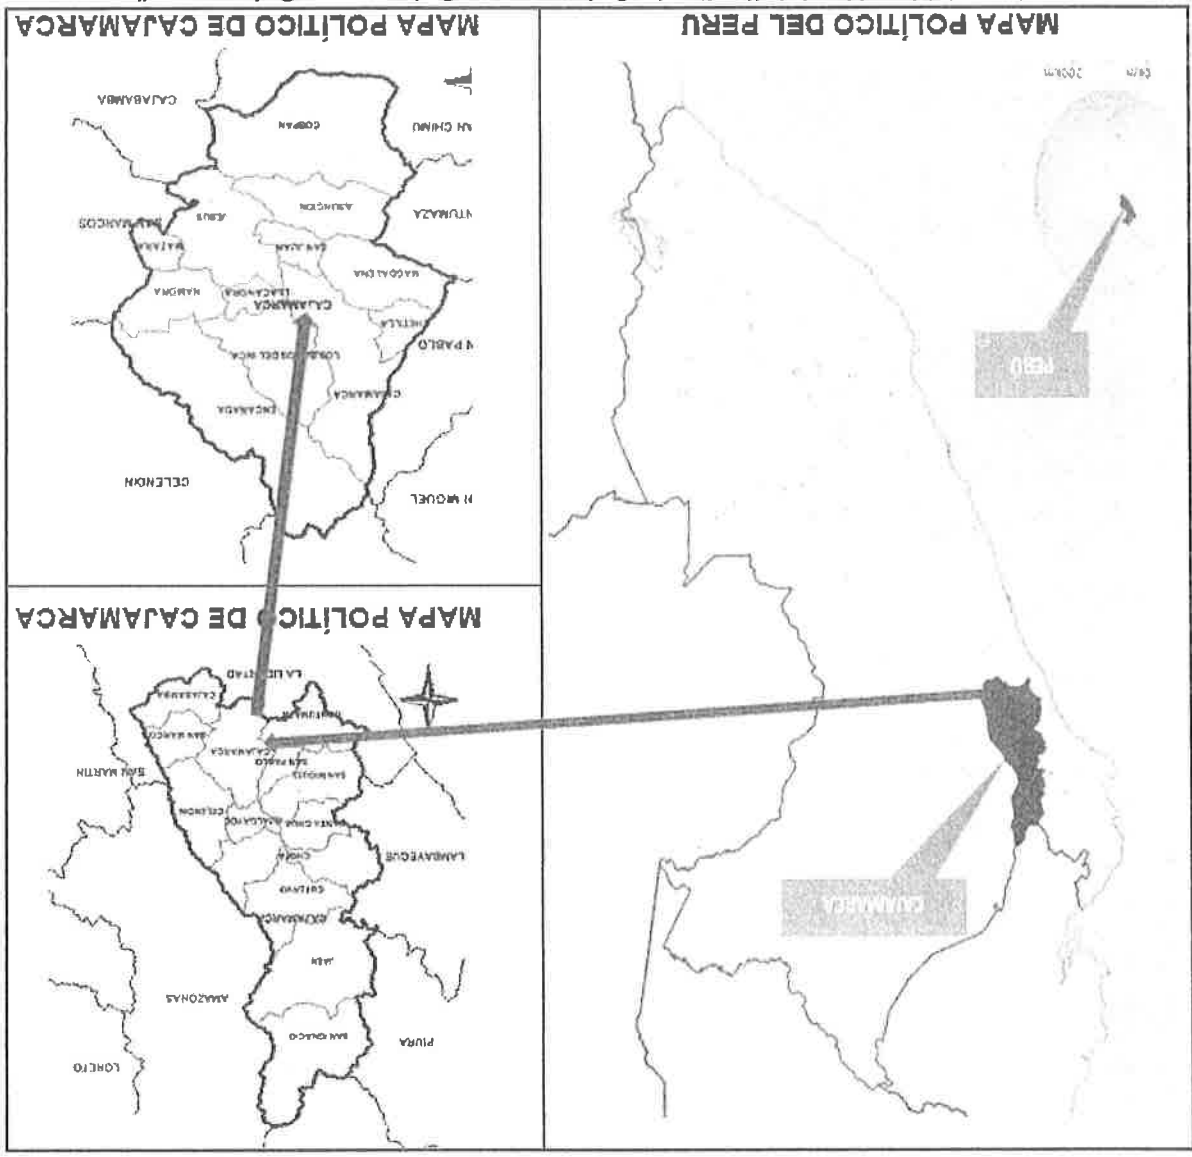


Imagen N° 02: Ubicación del distrito de Cajamarca – Cajamarca.”

4.4. VIAS DE ACCESO

Se tienen la siguientes vías de acceso a la obra:

CUADRO N°01 DE ACCESO

Desde	Hacia	Tipo de Transporte	Tipo de Vía	Distanci a (m.)	Tiempo: vehículo (Minutos)
Plaza de Armas Cajamarca	Cajamarca	Vehículo	Pavimento de concreto	600	10 min

Fuente: Elaboración Propia

Rolando Angulo Paredes
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76058015
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Fiqueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184765

4.5. DESCRIPCION DE LA OBRA

La ejecución del proyecto en la Institución Educativa emblemática Santa Teresita, considera la construcción de cobertura de la instalación deportiva (patio multi usos):

-Modulo:

❖ Cobertura de instalación deportiva

4.6. METAS DEL PROYECTO

El presente proyecto cuenta con las siguientes metas:

METAS FISICAS DEL PROYECTO	CANTIDAD	AREA OCUPADA	UNIDAD
MODULO			
-COBERTURA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA	01	2,118.39	M2
OTROS			
- INSTALACIONES ELECTRICAS	01	1	GLB
- DRENAJE PLUVIAL	01	1	GLB

CONSORCIO CAJAMARCA
Rodrigo Eloy Pérez Gadea
Residente de Obra
CIP: 102629

CONSORCIO SUPERVISOR
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7565016
REPRESENTANTE COMÚN

ROLANDO ARYUJIMON CHICAUERO
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184166

4.7. PLANILLA DE METRADOS EJECUTADAS EN LA PRESENTE VALORIZACION

Los trabajos realizados en el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024, en los cuales fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UND	AVANCES EJECUTADOS
01	ESTRUCTURAS		
01.02	CONTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.02.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	gib	0.25
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.02	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS	gib	0.15
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION	gib	0.15
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	0.50
01.04	MITIGACION AMBIENTAL		
01.04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	0.25
01.06	MOMENTO DE TIERRAS		
01.06.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	27.87
01.08	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.08.03	PEDESTAL		
01.08.03.01	CONCRET O PARA PEDESTAL FC=280 KG/CM2	m3	17.86
01.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL	m2	126.72
01.09	ESTRUCTURAS METALICAS		
01.09.01	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 300 X 300 X 8.0 MM	Und	64.00
01.09.02	VIGAS DE TUBO DE ACERO 100 X 250 X 4.50 MM	m	377.00
01.09.03	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12.5mm (1/2") con PERNOS DE 1" (incluye nivelacion con GROUT)	Und	32.00
01.09.06	MONTAJE DE COLUMNAS - VIGAS	Und	32.00
01.10	VARIOS		
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS	gib	0.05
2	ARQUITECTURA		
02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
02.01.01	TARAJEO EN SUPERFICIE DE PEDESTAL CON C.A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	30.72
02.01.02	OCHAVO EN PEDESTAL C.A= 1:5	m	56.32
03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION DE INSTALACION		
03.01.11	POZO A TIERRA	Und	2.00

CONSORCIO SUPERVISOR JV

Samuel David Perez Silva

DNI: 7855018

REPRESENTANTE COMUNI

Ing. Ricardo Angulo Jimenez

INGENIERO CIVIL

CIP 131027

SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Figueroa Torres

DNI 70184166

REPRESENTANTE COMUNI

CONSORCIO CAJAMARCA

Edgardo Eloy Perez Gomez

CIP: 103620

Residente de Obra

4.8. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO

VALORIZADO

Las partidas ejecutadas son:

01. ESTRUCTURAS

01.02 CONTRUCCIONES PROVISIONALES

01.02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Consistió en el suministro de agua para la construcción, la cual fue almacenada

en cilindros.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS					SALDOS		
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO					
				M. %	M. %	M. %	M. %	M. %	M. %		
01.02.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	0.25	25.00%	0.25	25.00%	0.50	50.00%	0.50	50.00%

01.03 SEGURIDAD Y SALUD

01.03.02 SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS

Consistió, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS								SALDOS	
				EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		EJECUTADO ACUMULADO					
				M.	%	M.	%	M.	%	M.	%		
01.03.02	SEÑALIZACION TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS	GLB	1.00	0.50	50.00%	0.15	15.00%	0.65	65.00%	0.35	35.00%		

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 7455903
ASISTENTE TECNICO

ROLANDO ANTONIO PARRA
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
FRANCIS ARTURO FIGUEROA TORRES
DNI: 10184166
REPRESENTANTE COMUN

01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION

Consistió en todos los equipos de protección colectiva que deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

ITEM	DESCRIPCION	UND	BASE MET.	EJECUTADO ANTERIOR			EJECUTADO ACTUAL			EJECUTADO ACUMULADO			SALDOS
				M.	%	M.	%	M.	%	M.	%	M.	
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION	GLB	1.00	0.50	50.00%	0.15	15.00%	0.65	65.00%	0.35	35.00%		

01.03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.

Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a la construcción de obras.

ITEM	DESCRIPCION	UND	BASE MET.	EJECUTADO ANTERIOR			EJECUTADO ACTUAL			EJECUTADO ACUMULADO			SALDOS
				M.	%	M.	%	M.	%	M.	%	M.	
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00			0.50	50.00%	0.50	50.00%	0.50	50.00%	0.50	

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DNI: 75056010
REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anguipoma Jilcamano
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueira Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 70184766

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Perez Guevara
Residente de Obra
CIP: 109520

01.04 MITIGACION AMBIENTAL

01.04.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Consistió a los trabajos de sensibilización de impacto ambiental, de tal forma reducir lo mayor posible a los cambios del ambiente y no propiciar el deterioro del ambiente que nos rodea.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS			
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO					
01.04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	0.25	25.00%	0.25	25.00%	0.50	50.00%	0.50	50.00%
				M.	%	M.	%	M.	%	M.	%

01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
SELECCIONADO

El relleno con material propio producto de las excavaciones en cimentaciones, se hará según lo especificado en los planos correspondientes, se colocará este material hasta los límites establecidos y hasta adoptar los niveles requeridos, descontando el espesor de las bases de material y del revestimiento de concreto a colocar, según los detalles de corte que se muestran en los planos. El relleno deberá ser compactado cada 20 cm.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS			
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO					
01.06.04	RELLENO Y MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON SELECCIONADO	m3	32.47		27.87	85.83%	27.87	85.83%	4.60	14.17%	
				M.	%	M.	%	M.	%	M.	%

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
REPRESENTANTE COMUN

Rolando Anguipoma Jilcamero
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Rolando Eloy Perez Godoy
Presidente de Obra
CIP 109620
Francis A. Lora Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DN: 70184766

01.08 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.08.03 PEDESTAL

01.08.03.01 CONCRETO PARA PEDESTAL Fc=280 kg/cm2

Consiste en el preparado, transporte, vaciado y vibrado del concreto en Pedestal, para la ejecución de esta partida se requiere contar con el encofrado del mismo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	AVANCES EJECUTADOS			SALDOS		
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	M.	M.	%
01.08.03.01	CONCRETO PARA PEDESTAL Fc=280 kg/cm2	m3	17.86		17.86	17.86	100.00%		

01.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL

Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamiento y dimensiones requeridos por los planos, para la construcción del sobrecimiento.

Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir pérdidas de mortero.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET.	AVANCES EJECUTADOS			SALDOS		
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	M.	M.	%
01.08.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA PEDESTAL	m2	126.72		126.72	126.7204	100.00%		

CONSORCIO CAJAMARCA

Rolando Eloy Pérez Godoy

Residente de Obra

CUI: 10784165

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVILA BENEZ SILVA

DNI: 76195018

INGENIERO CIVIL

CIP: 131027

SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Aguero Torres

REPRESENTANTE COMUN

DNI: 70184165

01.09 ESTRUCTURAS METALICAS

01.09.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 300x300x8.0 mm

Comprende el suministro, habilitación de los tubos LAC ASTM A500 Grado B de 300 x 300 x 8.0 mm en la longitud establecida en los planos y cumplirán la función de columnas. Las columnas se fijarán al pedestal mediante pernos aceros de 1" de diámetro y embecidas 70 cm en el pedestal con un gancho de 15 cm. Se utilizará una plancha de 0.55 m x 0.55 m x 1/2", en la parte superior de la columna se utilizará otra plancha de las mismas dimensiones y características descritas anteriormente. Se empleará para todos los casos soldadura de 3/16".

Asimismo, la partida contempla la aplicación de dos capas de anticorrosivo (zincromato) y dos capas de pintura epoxica como acabado final.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS			
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	M. %	M. %	M. %	M. %	
01.09.01	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 300x300x8.0 mm	UND	64.00		64.00	100.00%	64.00	100.00%			

01.09.02 VIGAS DE TUBO DE ACERO 100x250x4.50 mm

Comprende el suministro, habilitación de los tubos LAC ASTM A500 Grado B de 100 x 250 x 4.5 mm en la longitud establecida en los planos y cumplirán la función de vigas. Las vigas se fijarán a las columnas mediante soldadura; en la. Se empleará para todos los casos soldadura de 3/16".

Asimismo, la partida contempla la aplicación de dos capas de anticorrosivo (zincromato) y dos capas de pintura epoxica como acabado final.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS			
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	M.	%	M.	%	
01.09.02	VIGAS DE TUBO DE ACERO 100x250x4.50 mm	m	377.00			377.00	100.00%	377.00	100.00%		

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVIN PÉREZ SILVA
DNI: 7455455
REPRESENTANTE COMÚN

RODOLFO ANTONIO JILICUMORO
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arufo Figueira Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70784766

CONSORCIO SUPERVISOR JV
Santos
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
UNID: 7605607
REPRESENTANTE COMUN

ROLANDO ANGUIPOYAN DUCHEMINO
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA

CONSEJO CAMARAL
Rolando Eloy Perez Gadea
Residente de Casa
C.R., 195222

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	SALDOS
01.09.06	MONTAJE DE COLUMNAS - VIGAS	UND	32.00	M. %	M. %	M. %	M. %

Comprendió en el montaje de columnas y vigas de acero metálico, con una grúa sobre cada uno de los pedestales, asimismo se aseguraron con soldadura en cada borde de estos.

01.09.06. MONTAJE DE COLUMNAS - VIGAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS					
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	SALDOS		
				M.	%	M.	%	M.	%
01.09.03	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12.5mm (1/2") CON PERNOS DE 1" (incluye nivelación con GROUT)	UND	32.00			32.00	100.00%	32.00	100.00%
				M.	%	M.	%	M.	%

Asimismo, la partida contempla la aplicación de dos capas de anticorrosivo (zincromato) y dos capas de pintura epóxica como acabado final.

Comprende el suministro, habilitación de planchas de acero A36 de 550 x 12.5mm (1/2") y cumplirán la función de placa base entre pedestal y columna de acero. Incluye nivelación con GROUT. Se empleará para todos los casos

01.09.03 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12.5mm (1/2") CON PERNOS DE 1" (incluye nivelación con GROUT)

CONSORCIO CAJAMARCA

correttamente.

Tanto los muros interiores y exteriores serán tarrajeados y enlucidos con mortero de cemento arena fina en una proporción de 1:5 y 1.5cm de espesor como máximo, de modo que se obtenga una superficie lisa donde se pueda pintar

02.01.01 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PEDESTAL CON C: A= 1:5 E=

02. ARQUITECTURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	GLB	1.00	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS							
						EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	SALDOS				
						M. %	M. %	M. %	M. %	M. %			
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS					0.45	45.00%	0.05	5.00%	0.50	50.00%	0.50	50.00%
						M. %	M. %	M. %	M. %	M. %	M. %	M. %	M. %

Consistió en elaborar pruebas de calidad y diseños considerados en los precios

01.10 VARIOS

 CONSORCIO CAJAMARCA	INFORME DE VALORIZACION N°02 DE OBRA – DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
Proyecto: IOARR-“Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas, en EL(LA) I.E. “Emblemático Santa Teresita en la localidad Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento Cajamarca”, CUI.: 2565496	

ITEM	DESCRIPCION	UND	BASE MET.	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS	
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	%	M.	%
02.01.01	TARAJEO EN SUPERFICIE DE PEDESTAL CON C: A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	61.44		30.72	30.72	50.00%	30.72	50.00%

02.01.01 OCHAVO EN PEDESTAL C: A= 1:5{

Los pedestales serán tarrajados y enlucidos con mortero de cemento arena fina en una proporción de 1:5 y 1.5cm de espesor como máximo, de modo que se obtenga una ovalada donde se pueda pintar correctamente.

ITEM	DESCRIPCION	UND	BASE MET.	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS	
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO	%	M.	%
02.01.02	OCHAVO EN PEDESTAL C: A= 1:5	m	112.64		56.32	56.32	50.00%	56.32	50.00%

03. INSTALACIONES ELECTRICAS

03.01 ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES

03.01.11 POZO A TIERRA

El sistema de puesta a tierra tendrá conectadas todas las partes metálicas no vivas de la instalación como son la cubierta de los tableros y las barras destinadas a tierra. La puesta a tierra se da a través de un conductor de cobre desnudo de sección mínima de 16 mm², el cual empieza desde los tableros de distribución, tableros generales y hasta el correspondiente pozo a tierra, éste será fijado a los bornes de conexión de los tableros y al electrodo de cobre el cual será de 1/2" de diámetro y de 2.40 m de longitud.

Todos los tomacorrientes tienen un tercer borne los cuales van a descarga a tierra; para todo el colegio se tiene un pozo a tierra, ubicado en el jardín.

Método de construcción.

Para su construcción se cavará un hoyo de 0.80 m de diámetro, con una profundidad 2.50 m, luego se colocará el electrodo antes descrito, para realizar el relleno se empleará tierra vegetal la cual será verificada que no contenga grandes porcentajes de arena, piedra o cascajo, una vez tamizada la tierra por una malla

o cedazo de ¼", se procederá a rellenar y compactar en capas de 0.20 m, a la mitad del pozo se realizará un primer tratamiento con una dosis de sales minerales THORGEF, en tanto que la segunda dosis se realizará al final de la construcción del pozo, para de esta forma obtener una resistencia inferior a 25 OHM.

Preparación de la Solución Química en Pozo a Tierra

Se disolverá en 20 litros de agua el contenido de la bolsa blanca/amarilla, la solución será vertida y se esperará su absorción.

De igual modo se disolverá en 20 litros de agua el contenido de la bolsa azul, se vertirá y se esperará su total absorción.

Por último, para facilitar la penetración de las soluciones antes descritas, se verterán 20 litros de agua normal.

ITEM	DESCRIPCION	UND	MET. BASE	AVANCES EJECUTADOS				SALDOS			
				EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO ACTUAL	EJECUTADO ACUMULADO		M.	%	M.	%
03.01.11	POZO A TIERRA	und	2.00		2.00	100.00%		2.00	100.00%		

CONSORCIO CAJAMARCA

Francis Arturo Aguilar Torres
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 70184766

CONSORCIO CAJAMARCA

Roberto Eloy Pérez Espinoza
Presidente del Comité
C.P.: 102026

CONSORCIO SUPERVISOR JV

SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DNI: 765015
REPRESENTANTE COMÚN

Roberto Aguilar Torres
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO CAJAMARCA
Francis Arturo Figueroa Torres
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 78184166

CONSORCIO CAJAMARCA
Ricardo Mayapoma Julcamoro
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 2856018
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CAJAMARCA
Rodrigo Eloy Pérez Godoy
Residente de Obra
CIP: 102520

5. RESUMEN DE LA VALORIZACION



INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA
[Firma]

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PAREZ SILVA
DNI: 7409416
REPRESENTANTE LEGAL

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 07/100 SOLES

ITEM	COMPONENTE	MONTO
1	ESTRUCTURAS	S/ 1,185,328.39
2	ARQUITECTURA	S/ 216,190.04
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 23,024.26
4	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 20,844.41
6	COSTO DIRECTO	S/ 1,445,387.10
7	GASTOS GENERALES (8.96%)	S/ 129,506.68
8	UTILIDAD (5%)	S/ 72,269.36
9	SUB TOTAL	S/ 1,647,163.14
10	IGV (18%)	S/ 296,489.37
11	VALOR REFERENCIAL	S/ 1,943,652.51
13	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 55,286.18
12	SUPERVISION (4.62%)	S/ 89,796.75
12	LIQUIDACION (0.51%)	S/ 9,912.63
16	PRESUPUESTO TOTAL	S/ 2,098,648.07

El Valor Referencial del proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 1,943,652.51 (Un millón novecientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos con 51/100 soles).
El Costo Total de Inversión del Proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 2,098,648.07 (Dos millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho con 07/100), con precios vigentes al mes octubre del 2023, conforme el siguiente resumen:

2.6. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

METAS FISICAS DEL PROYECTO	CANTIDAD	AREA A OCUPIADA	UNIDAD
MODULO			
✓ COBERTURA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA	1	2118.39	M2
OTROS			
✓ INSTALACIONES ELECTRICAS	1	1	GLB
✓ DRENAJE PLUVIAL	1	1	GLB

El presente proyecto cuenta con las siguientes metas:

2.5.3. METAS DEL PROYECTO

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	---	---

347

	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
---	---	--

2.7. PRESUPUESTO OFERTADO CONTRACTUAL POR CONTRATISTA

El Monto Contractual Total de la Obra asciende A S/ 1,943,652.51 (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCION	PARCIAL
SUBPRESUPUESTO (1.00) ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO S/ 1,185,328.39 G.G (8.9599971%CD) S/ 106,205.42 UTILDAD (5.00000035%CD) S/ 59,266.42 SUB TOTAL S/ 1,350,800.23 IGV (18.000%) S/ 243,144.04 SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,593,944.27
SUBPRESUPUESTO (2.00) ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO S/ 216,190.04 G.G (8.9599971%CD) S/ 19,370.63 UTILDAD (5.00000035%CD) S/ 10,809.50 SUB TOTAL S/ 246,370.17 IGV (18.000%) S/ 44,346.63 SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 290,716.80
SUBPRESUPUESTO (3.00) INSTALACIONES ELECTRICAS	COSTO DIRECTO S/ 23,024.26 G.G (8.9599971%CD) S/ 2,062.97 UTILDAD (5.00000035%CD) S/ 1,151.21 SUB TOTAL S/ 26,238.44 IGV (18.000%) S/ 4,722.92 SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 30,961.36
SUBPRESUPUESTO (4.00) INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO S/ 20,844.41 G.G (8.9599971%CD) S/ 1,867.66 UTILDAD (5.00000035%CD) S/ 1,042.23 SUB TOTAL S/ 23,754.30 IGV (18.000%) S/ 4,275.78 SUB PRESUPUESTO TOTAL S/ 28,030.08
COMPONENTE (1) OBRA CIVIL	COSTO DIRECTO S/ 1,445,387.10 G.G (8.9599971%CD) S/ 129,506.66 UTILDAD (5.00000035%CD) S/ 72,269.36 SUB TOTAL S/ 1,647,163.14 IGV (18.000%) S/ 296,489.37 PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,943,652.51

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVILA PEREZ SILVA
DNI: 760666
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Augusto Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA

340

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	---

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN

- La Duración de la ejecución de la obra está prevista en 120 días calendario.
- La Duración de la supervisión de la obra está prevista en 120 días calendario.


2.9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- El sistema de contratación de la obra es a SUMA ALZADA.
- El sistema de contratación de la supervisión de la obra es a TARIFAS y a SUMA ALZADA para la Recepción y Liquidación de la Supervisión.

2.10. NORMAS Y REGLAMENTOS

- Ley Nº31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- T.U.O de la Ley Nº30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. Nº082-2019-EF.
- Decreto Supremo Nº344-2018-EF, Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo Nº377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo Nº168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos en bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo Nº011-79-VC
- Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.


INGENIERO CIVIL
CIP. 181021
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
CIP. 181021
REPRESENTANTE COMÚN



"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS: EN EL(LV) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE
VALORIZACIÓN
Nº02
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL
2024)

2.11. SITUACIÓN FÍSICO Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA

FÓRMULA	FÓRMULA	FÓRMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	ALDO				
1	ESTRUCTURAS	COSTO DIRECTO G (B 95699971ACD) S/ 104,205.42	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 104,205.42	S/ 10,292.16 S/ 18,371.87	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28 S/ 45,605.60 S/ 36,057.06 S/ 593,810.81	S/ 726,202.41 S/ 69,567.56 S/ 36,310.02	01.28574%	0.723435%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
2	ARQUITECTURA	COSTO DIRECTO G (B 95699971ACD) S/ 19,370.63	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 19,370.63	S/ 10,809.50	S/ 1,564.08 S/ 140.14	S/ 1,782.40 S/ 78.20	S/ 78.20	0.723435%	0.723435%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
3	ELECTRICAS	COSTO DIRECTO G (B 95699971ACD) S/ 2,067.87	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 2,067.87	S/ 1,511.21	S/ 2,350.50 S/ 103.13	S/ 1,782.40 S/ 184.91	S/ 184.91	0.9082700%	0.9082700%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
4	INSTALACIONES SANITARIAS	COSTO DIRECTO G (B 95699971ACD) S/ 1,867.06	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 1,867.06	S/ 29,444.41	S/ 2,350.50 S/ 103.13	S/ 2,350.50 S/ 103.13	S/ 2,350.50	0.9082700%	0.9082700%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
TOTAL (EJECUCION DE OBRA)		COSTO DIRECTO G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28 S/ 45,605.60 S/ 36,057.06 S/ 593,810.81	S/ 726,202.41 S/ 69,567.56 S/ 36,310.02	S/ 726,202.41	0.723435%	0.723435%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		UTILIDAD (5.0000000000000000%) S/ 7,269.96	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		NOY (16.0000%) S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18	S/ 10,292.16	S/ 205,043.15	S/ 521,157.28	S/ 726,202.41	14.1658073%	14.1658073%	0.0582345%	0.01417895%	100.0000000%
		S/ 14,443.82	SUB TOTAL G (B 95699971ACD) S/ 143,397.18									

338

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	---	---

3. VALORIZACIÓN N°02 DE OBRA

(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

3.1. INTRODUCCIÓN

En el mes de abril del 2024, se han ejecutado 30 días calendario desde el 01 al 30 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a: Construcciones Provisionales, Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Movimiento de Tierras, Pedestal, Estructuras Metálicas, Revoques Enlucidos y Molduras, e Iluminación de Instalación (Pozo a tierra).

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

a) ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gobierno Regional de Cajamarca.

b) ENTIDAD EJECUTORA

Contratista: "CONSORCIO CAJAMARCA"

Residente: Ing. Rolando E. Pérez Godoy

c) ENTIDAD SUPERVISORA

Consultor: "CONSORCIO SUPERVISOR JV"

Jefe de Supervisión: Ing. Rolando Anyaypoma Julcamoro

d) PRESUPUESTO DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la obra asciende a S/ 1,943,652.51 (SON: N MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.

e) PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA OFERTADO

El monto contractual total de la consultoría de obra asciende a S/ 99,709.38 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley, bajo el sistema de contratación de Tarifas para la supervisión de la obra y a Suma Alzada para la recepción y liquidación de la supervisión de la obra.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 78556110
REPRESENTANTE COMÚN

ROLANDO ANYAYPOMA JULCAMORO
INGENIERO CIVIL
CIP: 131027
SUPERVISOR DE OBRA

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 25854496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
--	--	--

h) PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de 120 días calendarios, el cual en el mes de Abril de Valorización Nº02 se ejecutaron 30 días calendario.

g) INICIO DE LOS TRABAJOS

El 02 de marzo del 2024.

h) CUADERNO DE OBRA O TRABAJOS

El cuaderno de obra es el documento donde se anotarán las acciones y/o ocurrencias durante la ejecución de obra, y está a cargo del residente de obra para su respectivo llenado. de igual manera el cuaderno de obra también es llenado por el supervisor de obra, para efectos de observaciones, sugerencias y autorizaciones en la etapa de la ejecución de la obra. Se anexa al presente los folios correspondientes a las diferentes anotaciones del cuaderno de obra, donde se describen los trabajos realizados, correspondientes a la presente valorización desde el 01 al 30 de abril del 2024, del Cuaderno de Obra Digital.

3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

3.4. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del informe de conformidad de valorización en el contexto de la "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", es verificar y certificar que los trabajos realizados están de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de construcción y que los valores presentados para su pago son justos y corresponden fielmente al avance y calidad de los trabajos ejecutados.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 7606016
REPRESENTANTE COMÚN

Rolando Augusto Rodríguez
INGENIERO CIVIL
CIP: 131021
SUPERVISOR DE OBRA

336

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	---

3.5. DESARROLLO DE LA OBRA

a) Aspectos Técnicos

La Residencia de Obra despliega una labor activa en los procesos de seguimiento, control y ejecución, manteniendo una coordinación constante en el sitio con el Ingeniero Supervisor de obra, el maestro de obra, los operarios y demás personal involucrado en el proyecto. Asimismo, se encarga de verificar en el terreno que todas las partidas ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.

b) Descripción de las partidas ejecutadas

En términos técnicos, se supervisan de manera directa y en el lugar todas las tareas que se llevan a cabo, asegurando que se desarrollen conforme a lo especificado en el expediente técnico y de acuerdo con las normativas vigentes.

En el mes de abril del 2024, se han ejecutado 30 días calendario desde el 01 al 30 del mes, en las cuales se han ejecutado partidas referentes a: Construcciones Provisionales, Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Movimiento de Tierras, Pedestal, Estructuras Metálicas, Revocos Enlucidos y Molduras, e Iluminación de Instalación (Pozo a tierra).

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PEREZ SILVA
DNI: 76055016
REPRESENTANTE COMUN

INGENIERO CIVIL
CIP 131927
SUPERVISOR DE OBRA



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)

RESUMEN DE METRADOS DE PARTIDAS EJECUTADAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	LMD	MET.	AVANCES	
				EJECUTADOS	METRADO
01	ESTRUCTURAS				
01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
01.02.04	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION				
01.03	SEGURIDAD Y SALUD				
01.03.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y SEGURIDAD E IMPREVISTOS	gb	1.00		0.25
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION	gb	1.00		0.15
01.03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00		0.50
01.04	MITIGACION AMBIENTAL				
01.04.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gb	1.00		0.25
01.05	RETIENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	32.47		27.87
01.05.03	PEDESTAL				
01.05.03.01	CONCRETO PARA PEDESTAL FC=280 KG/CM2	m3	17.86		17.86
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL	m2	128.72		128.72
01.09.01	COLUMNAS DE TUBO DE ACERO 300 X 300 X 8.0 MM				
01.09.02	VIGAS DE TUBO DE ACERO 100 X 250 X 4.50 MM	Und	64.00		64.00
01.09.03	PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 12 mm (1/2") con PERNOS DE 1" (incluye nivelacion con GROUT)	Und	377.00		377.00
01.09.06	MONTAJE DE COLUMNAS - VIGAS	Und	32.00		32.00
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS	Und	32.00		32.00
01.10.04	PRUEBAS DE CALIDAD Y DISEÑOS	gb	1.00		0.05
2	ARQUITECTURA				
02.01	REVOCOS EXTERIORES Y HOLLERAS				
02.01.01	TARAJEO EN SUPERFICIE DE PEDESTAL CON C.A= 1:5 E= 1.5 CM.	m2	61.44		30.72
02.01.02	OCHAVO EN PEDESTAL C.A= 1:5	m	112.64		56.32
3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.01.11	POZO A TIERRA				2.00

c) Resumen de Valorización de Ejecución de Obra

FÓRMULA	FÓRMULA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
1	ESTRUCTURAS	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)
2	ARQUITECTURA	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)
4	INSTALACIONES SANITARIAS	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)	UTILECHO (0.00000005%WCD)
TOTAL (EJECUCIÓN DE OBRA)							

INGENIERO CIVIL
CUI: 131031
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 75001118
REPRESENTANTE COMÚN



"CONSORCIO SUPERVISOR JV"

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA
TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE
CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA" - CUI: 2585496

CONFORMIDAD DE
VALORIZACIÓN
N°02
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL
2024)

d) Retención del 10% de Fondo de Garantía del Contratista

N°	FÓRMULA	DESCRIPCION	FONDO DE GARANTIA	TOTAL		
				S/ 1,943,652.51	S/ 194,365.250	S/ 194,365.250
VALORIZACION N°01	01 al 30 - Abril - 2024	MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	S/ 97,182.63	S/ 97,182.62	S/ 97,182.62
VALORIZACION N°02	01 al 30 - Abril - 2024	MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	S/ 97,182.62	S/ 194,365.25	S/ 0.00
ACUMULADO		MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	MONTOS RETENIDO (INC. IGV)	S/ 194,365.25	S/ 0.00	S/ 0.00
RETENER		MONTOS POR RETENER (INC. IGV)	MONTOS POR RETENER (INC. IGV)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
SALDO POR RETENER				S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

e) Detalle de Cancelación al Contratista

El detalle de cancelación al contratista por ejecución de obra del periodo del 01 al 30; de
abril del 2024, en función a los días laborados es el siguiente:

I	DESCRIPCION	MONTOS		VALORIZACION		VALOR POR VALORIZAR (S/)
		CONTRATADO SIN IGV (S/)	ANTERIOR (S/)	ACUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	
A	VALORIZACION CONTRACTUAL VALORIZACION N°02 - OBRA ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 1,350,800.23 S/ 246,370.17 S/ 26,238.44 S/ 23,754.30	S/ 233,667.18 S/ 1,782.40 S/ 2,350.50 S/ 0.00	S/ 593,910.81 S/ 1,782.40 S/ 2,350.50 S/ 0.00	S/ 827,577.99 S/ 1,782.40 S/ 2,350.50 S/ 0.00	S/ 523,222.24 S/ 244,587.77 S/ 23,887.94 S/ 23,754.30
	TOTAL (A)	S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 598,043.71	S/ 831,710.89	S/ 815,452.25
B	REALIZES					
	TOTAL (B)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
C	DEDUCCIONES					
	POR ADELANTO DIRECTO POR ADELANTO DE MATERIALES					S/ 0.00 S/ 0.00
	TOTAL (C)					S/ 0.00
D	AMORTIZACIONES					
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES					S/ 0.00 S/ 0.00
	TOTAL (D)					S/ 0.00
E	VALORIZACION NETA (VN = VB - D)	S/ 1,647,163.14	S/ 233,667.18	S/ 598,043.71	S/ 831,710.89	
	MONTOS A FACTURAR POR EL CONTRATISTA MONTOS POR IGV (18%) MONTOS TOTAL CON IGV	S/ 1,647,163.14 S/ 296,489.37 S/ 1,943,652.51	S/ 233,667.18 S/ 42,060.09 S/ 275,727.27	S/ 598,043.71 S/ 107,647.87 S/ 705,691.58	S/ 831,710.89 S/ 149,707.96 S/ 981,418.85	S/ 815,452.25 S/ 146,761.41 S/ 982,233.66
F	RETENCIONES					
	POR FONDO DE GARANTIA DE 10% (I) 1° RETENCION (1/12) (INC. IGV) 2° RETENCION (1/12) (INC. IGV)	S/ 194,365.25 S/ 97,182.63 S/ 97,182.62	S/ 97,182.63 S/ 97,182.63 S/ 178,364.84	S/ 97,182.62 S/ 97,182.62 S/ 808,608.98	S/ 194,365.25 S/ 97,182.62 S/ 787,053.80	S/ 0.00
MONTOS A FACTURAR A CONTRATISTA - ABRIL DEL 2024						
SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 SOLES						
RETENCIONES						
TOTAL (F) = MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA						
MONTOS A CANCELAR A CONTRATISTA - ABRIL DEL 2024						
SON: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 96/100 SOLES						

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÁEZ GILVA
DNI: 7605693
REPRESENTANTE LEGAL


INGENIERO CIVIL
CUI: 181021
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR JV
 SAMUEL DAVID DE REZ SILVA
 DNI: 7404011
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SUPERVISOR JV
 SAMUEL DAVID DE REZ SILVA
 DNI: 7404011
 REPRESENTANTE LEGAL

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS - OBRA			
FECHA	PORCENTAJE	ACUMUL.	PARCIAL
02/03/2024	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00
31/03/2024	14.1860373%	S/ 275.721.27	S/ 275.721.27
30/04/2024	50.4935345%	S/ 705.891.58	S/ 981.418.85
28/05/2024	50.4935345%	S/ 705.891.58	S/ 981.418.85
TOTAL		981.418.85	981.418.85

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - OBRA			
FECHA	PORCENTAJE	ACUMUL.	PARCIAL
02/03/2024	0.0000000%	S/ 0.00	S/ 0.00
31/03/2024	17.5354714%	S/ 340.828.83	S/ 340.828.83
30/04/2024	45.9185948%	S/ 892.497.82	S/ 551.669.29
28/05/2024	100.0000000%	S/ 1.985.724.51	S/ 897.437.66
TOTAL	100.00%	1.943.853.81	1.943.853.81

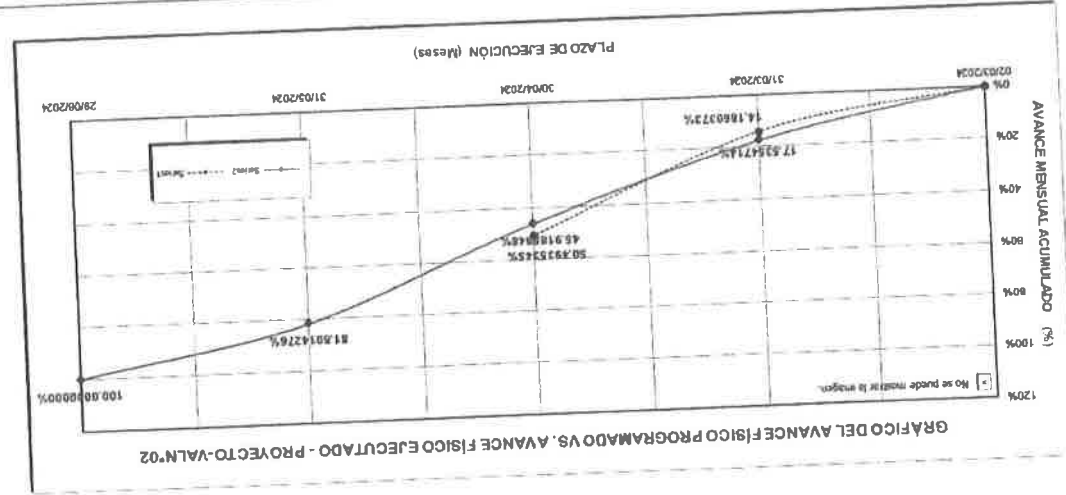

En la presente Valorización de Obra N° 02 (abril - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de 36.3074972%, siendo el Programado de 28.3831234%. El avance acumulado ejecutado es de 50.4935345%; mientras el avance programado acumulado es de 45.9185948%. Por lo tanto, la ejecución de obra se encuentra ADELANTADA en 4.5749397%.

f) Control de Avance Físico Programado VS Ejecutado de Contratista

“CONSORCIO SUPERVISOR JV” 	PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	---	--

El contratista instala los pedestales y vigas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

(d) Ensayos y Pruebas

Se realizó ensayos de comprobación del SLUMP, se extrajo muestras de concreto para sus ensayos respectivos. Ensayos a la compresión uniaxial de testigos de concreto en un laboratorio especializado cuyos certificados se anexa.


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTOS DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76054016
REPRESENTANTE COMUNITARIO

INGENIERO CIVIL
CIP 131027
SUPERVISOR DE OBRA
Rafael Amador Alvarado

"CONSORCIO SUPERVISOR JV"	
	
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	
CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	

g) Control de Avance Financiero Programado VS Ejecutado de Contratista

En la presente Valorización de Obra N° 02 (abril - 2024) se produjo un avance ejecutado total parcial de S/ 705,691.58 (SON: SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 58/100 SOLES), teniendo un acumulado de S/ 981,418.85, incluido IGV.

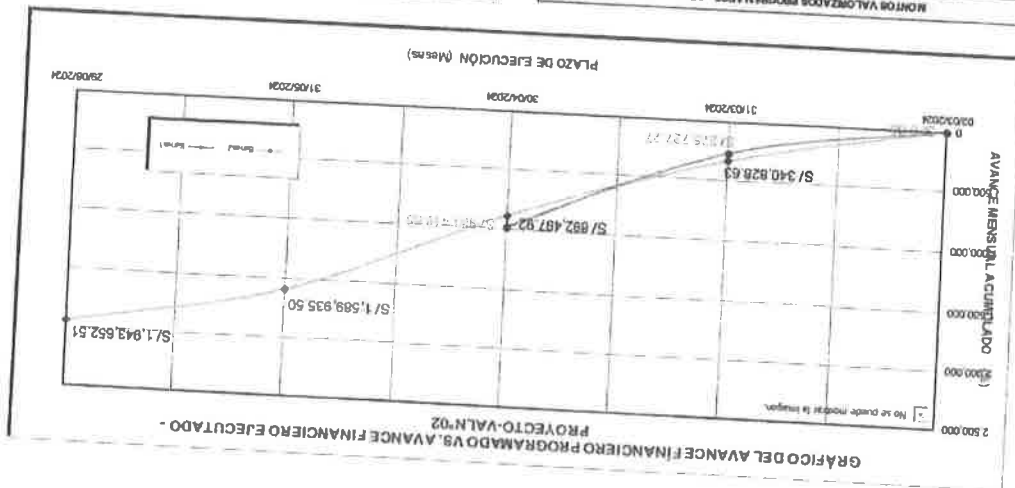

MONEDAS VALORIZADAS PROGRAMADAS - OBRA	
FECHA	MONEDAS VALORIZADAS PROGRAMADAS
28/02/2024	1,943,652.51
31/03/2024	1,589,935.50
30/04/2024	892,487.92
31/05/2024	340,828.63
30/06/2024	275,727.27
TOTAL	1,943,652.51
PAJAL	100.000000%
ACUMUL	100.000000%

MONEDAS VALORIZADAS EJECUTADAS - OBRA	
FECHA	MONEDAS VALORIZADAS EJECUTADAS
28/02/2024	1,943,652.51
31/03/2024	1,589,935.50
30/04/2024	892,487.92
31/05/2024	340,828.63
30/06/2024	275,727.27
TOTAL	981,418.85
PAJAL	50.483345%
ACUMUL	50.483345%

3.6. CONTROL DE CALIDAD

a) Procesos Constructivos

El contratista durante el periodo de la presente valorización, en la ejecución de la partida trazo, nivelación y replanteo utiliza para el control altimétrico instrumentos topográficos (estaciones totales), pintura, estacas de madera, winchas, etc. Se ubicó los BMs que estipula el expediente técnico en perfecto estado de conservación. En la demolición de estructuras como columnas, vigas, se utiliza maquinaria como retroexcavadora, martillo eléctrico, cincel y barretillas de metal, se capacito en el uso correcto de las herramientas manuales por el especialista de seguridad y salud, en el trabajo brindó charlas de inducción, dotó de equipo de protección personal a los obreros como cascos con barbijos, lentes, tapones para el oído, mascarillas para el polvo, etc. Para la preparación del concreto se utilizó una maquina mezcladora de 1 p3, agregados, agua potable, vibrador de concreto eléctrico, piedra de acuerdo a las especificaciones. Para las explanaciones se utilizó una retroexcavadora, para la eliminación un volquete de 4 m3 de capacidad, con sus respectivos SOAT. En la implementación de su plan de bioseguridad (plan COVID-19), personal profesional con formación en salud. Todos los equipos y/o herramientas fueron inspeccionadas e identificadas con sus respectivas señalizaciones del mes.

b) Calidad de materiales, Certificados de calidad

Certificados de calibración del equipo fotográfico utilizado para el replanteo y trazo, donde se emplazan las estructuras. El contratista hizo llegar certificados de control de calidad de materiales e insumos.

 “CONSORCIO SUPERVISOR JV”	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	--

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN N°02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
--	--	--

e) Personal idóneo

- Residente
- Asistente de residente.
- Seguridad en salud ocupacional y medio ambiente.
- Especialistas
- Operadores
- Personal administrativo
- Ayudantes

f) Cumplimiento de Normas Técnicas

La ejecución de la obra, se desarrolla de acuerdo al expediente técnico, la supervisión vela que se cumplan las especificaciones técnicas y la normativa vigente aplicable.

3.7. CONTROL DE PLAZOS

a) Calendario de avance

El contratista durante el periodo de la presente valorización no cumplió con la programación y las actividades previstas en su totalidad.

b) Control de avance programado

En el presente periodo se ejecutó un 36.3074972% y se tenía previsto de 28.3831234%, donde hace que la obra se encuentre adelantada en un 4.5749397% respecto a lo fijado por la programación.

c) Ampliaciones de Plazo y/o Suspensiones de Plazo

A la fecha aún no se ha tramitado ninguna ampliación de plazo, tampoco suspensión del plazo contractual, motivo que no se amerita.

d) Aplicación de penalidades

A la fecha de la presente valorización no se ha detectado de faltas y por lo tanto de penalidades, cualquiera que surja será aplicada en la siguiente valorización o en su defecto en la liquidación.

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID FÉREZ SILVA
DNI: 74594116
REPRESENTANTE COMÚN

[Firma]
INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA

4. CONCLUSIONES

- ✓ En la segunda valorización de obra correspondiente al mes de abril de 2024, se registra un progreso ejecutado parcial del 36.3074972%, en comparación con el progreso programado del 28.3831234%. El avance acumulado ejecutado hasta la fecha es del 50.4935345%, mientras que el avance acumulado programado es del 45.9185948%. En consecuencia, se evidencia un adelanto en la ejecución de la obra del 4.5749397%.
- ✓ El monto a ser facturado correspondiente a la segunda valorización de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA", durante el periodo comprendido del 01/04/2024 al 30/04/2024, alcanza la suma de S/. 705,691.58 (SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 58/100 soles), incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV).
- ✓ El segundo monto a ser retenido por concepto de fondo de garantía al contratista de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA", alcanza la suma de S/ 97,182.62, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV).
- ✓ El importe a ser abonado por el Consorcio Cajamarca, en concepto de la segunda valorización de la obra "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA", llevada a cabo durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024, es de S/ 608,508.96 (SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 96/100 soles), incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV).

CONSORCIO SUPERVISOR JV
SANTOS DAVID PÉREZ SILVA
DNI 7850016
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
CIP 13102
SUPERVISOR DE OBRAS
Pérez Santos David
DNI 7850016

CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMATICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA" - CUI: 2585496	"CONSORCIO SUPERVISOR JV" 
--	--	--


5. RECOMENDACIONES

✓ Se sugiere a la Entidad que realice el pago de la segunda valorización correspondiente al mes de abril de 2024, de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.

 "CONSORCIO SUPERVISOR JV"	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(A) I.E. EMBLEMÁTICO SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - CUI: 2585496	CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN Nº02 (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024)
--	--	--

328


INGENIERO CIVIL
CIP. 131027
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR JV
SAMUEL DAVID PÉREZ SILVA
DNI: 76054016
REPRESENTANTE COMÚN
