

**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



INFORME N°06-2025- GORECAJ-SUP /SERP

A : ING. GESLEY BARBOZA HUANGAL

REPRESENTANTE COMITN DEL CONSORCIO SUPERVISOR
SION

DE : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : INFORME DE VALORIZACIÓN N° 06, SETIEMBRE-2025

REFERENCIA:

a) Ejecución de OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO
POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE
LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CUI N°2649927

FECHA : 03 DE OCTUBRE DEL 2025

De nuestra especial consideración:

Por medio del presente, reciba mi cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a usted, a fin
de alcanzar el informe de valorización correspondiente al mes de setiembre del 2025
perteneiente a la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927".

Sin otro particular me suscribo de usted, sin antes expresar las muestras de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente:

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
F°3. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com


Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

CONSORCIO SUPERVISOR SION



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRICTO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 04 D.C. (RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° D60-2025-GR.CAJ/GR.I)

FECHA DE CULMINACIÓN DE :24-08-2025

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 :16 D.C. (EN TRAMITE)

FECHA DE CULMINACIÓN DE :09-09-2025

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03

GR.CAJ/GR.I

:10 D.C. (RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° D105-2025-GR.CAJ/GR.I)

FECHA DE CULMINACIÓN DE :19-09-2025

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 :06 D.C. (EN TRAMITE)

FECHA DE CULMINACIÓN DE :25-09-2025

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04

ADICIONALES DE OBRA

ADICIONAL DE OBRA N° 01

: CON UN MONTO DE S/ 28,051.94 (INC. IGV), APROBADO
a) RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° D87-2025-GR.CAJ (DEL 20/08/2025, QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01).
b) RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° D313-2025-GR.CAJ/GRR (DEL 09/09/2025, APRUEBA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01).

DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

PROCESO DEL SERVICIO

SUPERVISIÓN

REPRESENTANTE COMÚN

JEFE DE SUPERVISIÓN

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO N°

FECHA DE CONTRATO

MONTO DE CONTRATO VIGENTE

INICIO DEL CONTRATO DE

SUPERVISIÓN

SISTEMA DE EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01

: A LA FECHA, SE HA SOLICITADO Y FUE CONCEDIDO

Ing. Gesley Barboza Hualgal
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR SION

[Handwritten signature]

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
 Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
 SION
 Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMUN

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO VIGENTE	: 24-08-2025
SITUACIÓN DE LA OBRA A LA FECHA	: 16-09-2025
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO VIGENTE	: 0.00%
AVANCE MENSUAL REAL EJECUTADO	: 7.95%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	: 100%
AVANCE REAL EJECUTADO ACUMULADO	: 100%
SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA	: CULMINADA EN SU TOTALIDAD.

368

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

2.COMPROBANTE DE PAGO POR EL MONTO APROBADO DE VALORIZACIÓN

CONSORCIO
SUPERVISOR
SION



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Fºg. CIP. N°: 228281
SUPERVISOR DE OBRA

SE ADJUNTARÁ EN CUANTO LO REQUIERA LA ENTIDAD

 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 358	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	 CONSORCIO SUPERVISOR SION
---	--	--

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Rg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

3. VALORIZACIÓN Y CUANDO CORRESPONDA "OTRAS PENALIDADES" O "PENALIDAD POR MORA"

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"

CONSORCIO
SUPERVISOR



GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA



358

NO CORRESPONDE

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
P.º 3. CIP. N.º: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO
SUPERVISOR
SION



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
Nº2649927"

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA



357

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Fºg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gesley Barboza Huangal
CONSORCIO SUPERVISOR
REPRESENTANTE COMÚN



4. REAJUSTES, DEDUCCIONES Y AMORTIZACIONES DE SER EL CASO

**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

Del 20 al 25 de setiembre de 2025													
MES	VAL. N°	PROGRAMADO		EJECUTADO		K-1	PROGRAMADO		REAJUSTES		RECIBIDO		
		MES	ACUMUL.	% ACUMUL.	MES		ACUMUL.	% ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	
Ab-r-25	01	35,568.21	35,568.21	2.98%	86,973.33	86,973.33	7.28%	0.011	391.25	391.25	956.71	956.71	0.00
May-25	02	235,094.97	270,663.18	22.67%	208,605.73	295,579.06	24.76%	0.013	3,056.23	3,447.48	2,711.87	3,668.58	0.00
Jun-25	03	302,993.44	573,656.62	48.05%	280,637.33	576,266.39	48.27%	0.012	3,635.92	7,083.40	3,368.25	7,036.83	0.00
Jul-25	04	340,720.36	914,376.98	76.59%	401,373.69	977,640.08	81.89%	0.016	5,451.53	12,534.93	6,421.98	13,458.81	0.00
Ago-25	05	279,512.66	1,193,889.64	100.00%	121,342.52	1,098,982.60	92.05%	0.014	3,913.18	16,448.11	1,698.80	15,157.61	0.00
Set-25	06				94,907.04	1,193,889.64	100.00%	0.012			1,138.88	16,296.49	0.00
		1,193,839.64			1,098,932.60				16,448.11		15,157.61		0.00

RESUMEN:	
Reajuste Total Reconocido	0.00
Reajuste Reconocido en la Valorización N° 03	0.00

OBSERVACION : MI REPRESENTADA SOLICITARÁ EL PAGO DE LOS REAJUSTES SE REALICE EN LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN O EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

NOTAS:

1) PARALIZACIÓN DE OBRA (DEL 25/08/25 AL 09/09/25)

2) EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 (DEL 10/09/25 AL 19/09/25)

Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
C°g. CIP. N° 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Roj. CIP. N°: 229261
SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



S. ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO AL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y EJECUTADO

**CONSORCIO
SUPERVISOR
SION**



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA



353

MONTOS VALORIZADOS		PROGRAMADOS		MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS		MONTOS (S/IN/IGV)		PORCENTAJES													
		ACUMUL.	%			PARCIAL	%	ACUMUL.	%												
MES	MONTOS VALORIZADOS	ACUMUL.	S/.	MES	ACUMUL.	%	PARCIAL	S/.	PARCIAL	%											
											23 Abr-25	0.00	0.00%	23 Abr-25	86,973.33	86,973.33	7.28%	7.28%			
											30/04/2025	35,568.21	2.98%	30/04/2025	86,973.33	208,605.73	295,579.06	17.47%	24.76%		
											31-May-25	270,663.18	22.67%	31-May-25	208,605.73	280,687.33	576,266.39	23.51%	48.27%		
											30-Jun-25	573,656.62	48.05%	30-Jun-25	280,687.33	401,373.69	977,640.08	33.62%	81.89%		
											31-Jul-25	914,376.98	76.59%	31-Jul-25	401,373.69	121,342.52	1,098,982.60	10.16%	92.05%		
											24-Ago-25	1,193,889.64	100.00%	24-Ago-25	121,342.52	94,907.04	1,193,889.64	7.95%	100.00%		
											25-Sep-25										
											TOTAL	1,193,889.64		TOTAL	1,098,982.60						
											NOTAS: 1) PARALIZACIÓN DE OBRA (DEL 25/08/25 AL 09/09/25)										
											2) EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 (DEL 10/09/25 AL 19/09/25)										

Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN
 CONSORCIO SUPERVISOR



6. RESUMEN DE VALORIZACIONES

CONSORCIO SUPERVISOR



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



351

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CP MEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
R99. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Gesley Barboza Huangal
CONSORCIO SUPERVISOR
S I O N
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO (N)			
ADJUDICACIÓN: Licitación Pública N°02-2023-G.R.CAJ-Financiera convocatoria			
OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2649927			
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA			
UBICACIÓN: PIZON - MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA			
EJECUTA: MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L			
RESIDENTE: ING. FRANCISCO WILDER CHICHIFE SALAZAR			
SUPERVISOR: ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON			
CONTRACTO: N°030-2025-GRCAJ-GGR			
RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 (FINAL)			
Del 20 al 25 de setiembre de 2025			
ITEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	Valorización Contractual	94,907.04	
1.0.1	Valorización Contractual		
1.1.0	Reintegros		
1.1.1	Reajuste reconocido	0.00	
1.1.2	Reintegro por Reajuste	0.00	
TOTAL MONTO BRUTO (A)			94,907.04
2.0.0	DESCUENTOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
TOTAL DESCUENTOS (B)			0.00
TOTAL NETO (A-B+C)			94,907.04
	I.G.V.	18.00%	17,093.27
MONTO TOTAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA N.º 06			
S/. 111,990.31			
MONTO DE DETRACCIÓN (4.00%)			
S/. 4,480.00			
RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
S/. 0.00			
MONTO TOTAL A CANCELAR			
S/. 107,510.31			
SON: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 31/100 SOLES			



CONSORCIO SUPERVISOR SION

OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

350

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

7. PLANILLA DE METRADOS CUANDO CORRESPONDA, CROQUIS O PLANOS DE TRABAJOS EJECUTADOS

 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"	CONSORCIO SUPERVISOR 
---	--	--

de septiembre del 2025.

	UNID	METRADO	BASE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	METRADO
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENNIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2649927							
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
PIZON							
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
TRABAJOS PROVISIONALES							
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
CASITA DE GUARDIANA	gib	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	mes	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES							
CERCO PROVISIONAL EN OBRA	m	138.59	138.59	138.59	138.59	138.59	100.00%
TRAZO PROVISIONAL EN OBRA	m	138.59	138.59	138.59	138.59	138.59	100.00%
REPLANTEO	m2	1,124.56	1,124.56	1,124.56	1,124.56	1,124.56	100.00%
DESMOLIVIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA							
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
PRUEBAS DE CALIDAD							
DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
CONCRETO	und	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00%
COMPONENTE 01, ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y COBERTURA							
MOVIMIENTO DE TIERRAS							
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL	m3	1,710.94	1,710.94	1,710.94	1,710.94	1,710.94	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 KM	m3	1,710.94	1,710.94	1,710.94	1,710.94	1,710.94	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS							
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO CORRIDO EN TERRENO NORMAL	m3	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+ 30 % PIEDRA GRANDE	m3	11.79	10.39	1.40	11.79	11.79	100.00%
ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	43.19	38.69	4.50	43.19	43.19	100.00%
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 MURO Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA	m3	2.81	2.52	0.29	2.81	2.81	100.00%
MURO DE LADRILLO TPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A -1.4 X 1.5 cm CARAVISTA	m2	65.61	60.61	5.00	65.61	65.61	100.00%
PINTURA DE MURO DE LADRILLO TPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A -1.4 x 1.5 cm	m2	131.21	121.21	10.00	131.21	131.21	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO ACERO CORRUGADO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 80	kg	587.57	587.57	587.57	587.57	587.57	100.00%
ENCORRADO Y DESENCORRADO	m2	53.52	50.00	3.52	53.52	53.52	100.00%
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 REVOCOS Y ENLUCIDOS	m3	2.29	2.15	0.14	2.29	2.29	100.00%
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 1:5	m2	53.52	45.00	8.52	53.52	53.52	100.00%
TARRAJEO SOBRE CIMENTO MEZCLA C/A 1:5	m2	24.81	20.00	4.81	24.81	24.81	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



342

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 1:5	m2	53.52	45.00	8.52	53.52	100.00%
TARRAJEO SOBRECIMENTOS	m2	24.81	20.00	4.81	24.81	100.00%
MEZCLA C.A. 1:5	m2	24.81	20.00	4.81	24.81	100.00%
CARPINTERIA METALICA	m2	149.97	144.93	5.04	149.97	100.00%
CERCO PERIMETRICO DE MALLA GALVANIZADA Y POSTE DE TUBO CIRCULAR	m2	149.97	144.93	5.04	149.97	100.00%
PUERTA METALICA PRINCIPAL	und	1.00	1.00		1.00	100.00%
PUERTA METALICA SECUNDARIA	und	1.00	1.00		1.00	100.00%
TECHO METALICO	und	1.00	1.00		1.00	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	136.48	136.48		136.48	100.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	130.55	126.05	4.50	130.55	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.93	5.93		5.93	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
ZAPATAS						
SOLDOS PARA ZAPATAS, CONCRETO 1:12 E = 10 CM	m2	40.96	40.96		40.96	100.00%
CONCRETO ZAPATA Fc = 210 kg/cm2	m3	20.48	20.48		20.48	100.00%
ACERO CORRUGADO PARA ZAPATAS Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,152.56	1,152.56		1,152.56	100.00%
COLUMNAS						
CONCRETO EN COLUMNAS Fc = 210 kg/cm2	m3	7.46	7.46		7.46	100.00%
ACERO PARA COLUMNAS Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,027.21	1,027.21		1,027.21	100.00%
ENCOFRADO DE COLUMNAS 200 X 8 MM	m2	74.64	74.64		74.64	100.00%
COLUMNAS DE CONCRETO Y CONEXION PEDESTAL (COLUMNA METALICA)	und	16.00	16.00		16.00	100.00%
COBERTURA						
ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA						
ESTRUCTURA METALICA VIGA PARABOLICA S/DISEÑO	und	8.00	8.00		8.00	100.00%
VIGA DE AMARRE VA - 001	und	14.00	14.00		14.00	100.00%
CORREAS METALICAS DE 40 X 60 X 2.5 mm EN TECHO	m	977.49	977.49		977.49	100.00%
ARRIOSTRE METALICO DE VIGAS PRINCIPALES TIPO 1	und	8.00	8.00		8.00	100.00%
COBERTURA CALAMINON TR - 4 CURVO	m2	1,365.00	1,365.00		1,365.00	100.00%
APoyo FIJO	und	8.00	8.00		8.00	100.00%
APoyo MOVIL	und	8.00	8.00		8.00	100.00%
PINTURA						
PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	449.79	449.79		449.79	100.00%
PINTURA VINILICA EN COLUMNAS 2 MANOS	m2	74.64	74.64		74.64	100.00%
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES						
CANALETAS DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA	m	78.20	78.20		78.20	100.00%
INSTALACION DE SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL	m	21.80	21.80		21.80	100.00%
ENCOFRADO PARA LA FALSA COLUMNA	m2	1.92	1.92		1.92	100.00%
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2	m3	0.10	0.10		0.10	100.00%
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS						
TARRAJEO MEZCLA 1:5	m2	1.92	1.92		1.92	100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS						
TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) D=1"	m	200.00	200.00		200.00	100.00%
TUBERIAS FIERRO GALVANIZADO D = 2"	m	50.00	50.00		50.00	100.00%
CABLE ELECTRICO	m	510.00	510.00		510.00	100.00%
INTERRUPTOR	und	5.00	5.00		5.00	100.00%
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO	und	5.00	5.00		5.00	100.00%
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	und	1.00	1.00		1.00	100.00%
TABLERO GENERAL	und	1.00	1.00		1.00	100.00%

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Ing. Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
P.º. CIP. N.º: 225281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



**CONSORCIO
SUPERVISOR**

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
N°2649927"



POLOS	und	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION 2	und	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
REFLECTORES LED DE 300 W	und	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
POZO A TERRA INC.	und	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
EXCAVACION SUMINISTRO E INSTALACION	und					
DRENAJE PLUVIAL						
EXCAVACION DE TERRENO	m3	15.33	15.33		15.33	100.00%
REVESTIDA f _o = 175 kg/cm2	m3	8.52	8.12	0.40	8.52	100.00%
ACERO CORRUGADO Fy = 4200	kg	430.24	410.00	20.24	430.24	100.00%
ENCORRADO Y DESENCORRADO	m2	43.16	39.16	4.00	43.16	100.00%
DE CUENTAS						
JUNTAS ASFALTICAS EN	m	26.62	24.82	1.80	26.62	100.00%
CUNETAS						
REJILLA METALICA L=1.55	und	30.00	25.35	4.65	30.00	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN						
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL	m3	237.04	237.04		237.04	100.00%
RELLENO CON MATERIAL	m3	176.67	171.67	5.00	176.67	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	60.37	60.37		60.37	100.00%
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRAZANTE	m2	42.75	42.75		42.75	100.00%
MEJORAMIENTO DE SUELO	m3	15.88	15.88		15.88	100.00%
CON PIEDRA MAX 8"	m3	46.89	46.89		46.89	100.00%
CONFORMACION DE BASE E = 20 CM	m2	24.25	24.25		24.25	100.00%
ENCORRADO Y DESENCORRADO	m2	27.16	27.16		27.16	100.00%
MURO						
CONCRETO CICLOPEO F _o 175 kg/cm2 + 30% PIEDRA GRANDE	m3	46.58	46.58		46.58	100.00%
JUNTAS	m2	223.17	223.17		223.17	100.00%
JUNTAS ASFALTICAS	m	45.15	45.15		45.15	100.00%
DRENAJE EN MURO						
DRENAJE DE PVC φ = 2" PARA MURS	und	119.00	109.00	10.00	119.00	100.00%
COMPONENTE 02 GRASS SINTETICO						
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	m3	186.82	186.82		186.82	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km	m3	186.82	186.82		186.82	100.00%
BASE GRANULAR						
EXTENDIDO, NIVELADO DE MATERIAL OVER	m2	747.95	732.95	15.00	747.95	100.00%
EXTENDIDO, NIVELADO, RIEGO Y COMPACTADO DE BASE	m2	776.02	761.02	15.00	776.02	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO						
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO	m2	777.02	777.02		777.02	100.00%
MALLA SINTETICA ATRAPA BOLAS	m2	1,000.52	1,000.52		1,000.52	100.00%
CARPINTERIA METALICA						
INSTALACION DE ARCOS	und	2.00	2.00		2.00	100.00%
COMPONENTE 03, INSTALACION DE GRADERIAS COMO TRIBUNA						
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTOS	m3	20.38	20.38		20.38	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km	m3	8.87	8.87		8.87	100.00%
OBRA DE CONCRETO SIMPLE						
1:10+30% PIEDRA GRANDE	m3	11.51	11.51		11.51	100.00%
CONCRETO CICLOPEO PARA GRADERIAS F _o = 140 kg/cm2 + 30 %	m3	25.33	25.33		25.33	100.00%

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N° 779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Ing. Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
N° 9. CIP. N° 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON PROVINCIA DE MIGUEL IGLESIAS DE LA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



SION

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS	m2	47.41	47.41	100.00%
MUROS DE MAMPUESTERIA				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	37.91	37.91	100.00%
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2	m3	4.12	4.12	100.00%
PIEDRA GRANDE PARA MURO	m3	34.84	34.84	100.00%
REVOQUES Y ENLUCIDOS				
TARRAJEO Y PULIDO EN SUPERFICIE DE GRADERIAS	m2	100.37	100.37	100.00%
JUNTAS				
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION	m	16.28	16.28	100.00%
COMPONENTE 04. INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS				
MOVIMIENTO DE TIERRAS				
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTOS (h) prom = 0.60 M, EN TERRENO NORMAL	m3	5.60	5.60	100.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.39	1.39	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.21	4.21	100.00%
ESTRUCTURAS				
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30 % PIEDRA GRANDE	m3	4.21	4.21	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	m2	11.40	11.40	100.00%
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2, PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.75	0.75	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
COLUMNAS				
CONCRETO EN COLUMNAS f'c = 210 kg/cm2	m3	0.79	0.79	100.00%
ACERO PARA COLUMNAS f'y = 4200 kg/cm2 - GRADO 60	kg	136.89	136.89	100.00%
ENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	17.59	17.59	100.00%
VIGAS				
CONCRETO EN VIGAS F'c = 210 KG/CM2	m3	0.39	0.39	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m2	5.44	5.44	100.00%
ACERO CORRUADO EN VIGAS f'y = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	125.54	125.54	100.00%
LOSA DE TECHO				
CONCRETO EN LOSA DE TECHO f'c = 210 kg/cm2	m3	1.55	1.55	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE TECHO	m2	15.54	15.54	100.00%
ACERO CORRUADO EN LOSA DE TECHO f'y = 4200 kg/cm2	kg	59.62	59.62	100.00%
ARQUITECTURA Y ACABADOS				
MURO Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA				
MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A - 1.4 X 1.5 cm	m2	25.73	25.73	100.00%
CARAVISTA				
PINTURA DE MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A - 1.4 X 1.5 cm	m2	51.46	51.46	100.00%
REVOQUES ENLUCIDOS				
TARRAJEO MEZCLA 1:5	m2	38.57	38.57	100.00%
VESTIDURA DE DERRAMES a = 15 cm	m	27.41	27.41	100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS				
FALSO PISO				
FALSO PISO E = 4"	m2	6.55	6.55	100.00%
PISO CERAMICO ANTIPESIZANTES CELIMA 0.30 X 0.30, CON PEGAMENTO Y FRAGA	m2	6.82	6.82	100.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO EN VEREDAS	m2	0.68	0.68	100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h = 0.30 m	m	17.98	17.98	100.00%
COBERTURA				
COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	15.54	15.54	100.00%
CARPINTERIA DE MADERA (2 AGUAS)				

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

Ing. Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
R.Sg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Gesley Barboza Huangal
CONSORCIO SUPERVISOR
REPRESENTANTE COMÚN

P-01, PUERTA COTRAPLACADA (INC. MACO, BISAGRA Y CHAPA)	und	3.00	3.00	3.00	100.00%
VENTANAS, VIDRIOS Y SIMILARES	und	11.00	11.00	11.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PARA BAÑOS	und	11.00	11.00	11.00	100.00%
PINTURAS					
EMPASTE Y PINTURA LATEX 2	m2	15.54	15.54	15.54	100.00%
MANOS EN CIELO RASO					
EMPASTE Y PINTURA LATEX 2	m2	3.56	3.56	3.56	100.00%
MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES					
INSTALACIONES SANITARIAS					
RED DE DESAGUE					
SALIDA DE PVC PARA DESAGUE	plo	6.00	6.00	6.00	100.00%
4"	plo	2.00	2.00	2.00	100.00%
SALIDA DE PVC PARA DESAGUE	plo	6.00	6.00	6.00	100.00%
2"	plo	2.00	2.00	2.00	100.00%
TUBERIAS PARA DESGUE DE	m	15.45	15.45	15.45	100.00%
PVC - SAL DE 2"	m	9.27	9.27	9.27	100.00%
TUBERIAS PARA DESGUE DE	m	2.00	2.00	2.00	100.00%
PVC - SAL DE 4"	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
CAJA DE REGISTRO 12" X 24"	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
RED DE AGUA					
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA	plo	6.00	6.00	6.00	100.00%
PVC C - 10 DE 1/2"	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
LLAVE DE PASO DE 1/2"	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
TUBERIA PVC SAP φ 1/2"	m	35.57	35.57	35.57	100.00%
APARATOS SANITARIOS					
INDODORO BLANCO	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
DUCHA	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
LAVAMANOS	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
RED DE DESAGUE					
EXCAVACION MASIVA CON	m3	17.81	17.81	17.81	100.00%
MAGUINA EN TERRENO NORMAL					
PERFILADO Y COMPACTADO DE	m2	62.50	62.50	62.50	100.00%
ZANJA					
CAMA DE ARENA h=0.10	m2	15.00	15.00	15.00	100.00%
TUBERIA PVC UF DN 160 ISO 4435	m	25.00	25.00	25.00	100.00%
SERIE 16.7					
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	15.94	15.94	15.94	100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS					
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	plo	3.00	3.00	3.00	100.00%
INTERUPTOR	und	5.00	5.00	5.00	100.00%
TERMOAGNETICO	und	1.00	1.00	1.00	100.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION 6	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
POLOS					
TABLERO DE DISTRIBUCION 2	und	2.00	2.00	2.00	100.00%
POLOS					
CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m	100.00	100.00	100.00	100.00%
CONDUCTOR TW NRO 14	m	150.00	150.00	150.00	100.00%
CONDUCTOR TW NRO 12	m	25.00	25.00	25.00	100.00%
ARTEFACTO FLUORESCENTE	und	3.00	3.00	3.00	100.00%
CIRCUAR DE 32 W					
COMPONENTE 05 MITIGACION					
AMBIENTAL					
INSTALACION DE CONTENEDOR DE	gib	4.00	4.00	4.00	100.00%
RESIDUOS SOLIDOS X4					
MATERIAL EN AREA DE	m2	218.41	218.41	218.41	100.00%
CIRCULACION					
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,124.56	1,124.56	1,124.56	100.00%
COMPONENTE 06 FLETE					
FLETE TERRESTRE CELENDIN -	gib	1.00	1.00	1.00	100.00%
PIZON					

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCÉS, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO
ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Roj. CIP. N°: 229281,
SUPERVISOR DE OBRA

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y/O GARANTÍAS DE FABRICACIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR SION



OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



343

Durante el presente periodo, no se ha tenido partidas con vaciado de concreto.

Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Rg. CIP. N° 229281
 SUPERVISOR DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMUN



9. PROTOCOLOS Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Rg. CIP. N°: 229281
 SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN
 CONSORCIO SUPERVISOR

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE
 PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
 EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON
 DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
 PROVINCIA DE CELENDIN DEL
 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI
 N°2649927"

**CONSORCIO
 SUPERVISOR**





CONSORCIO SUPERVISOR SION

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927"



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

1. DATOS GENERALES

OBRA : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI N°2649927

UBICACIÓN	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIAL	DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	ADMINISTRADOR	CONTRATO
	PIZON	MIGUEL IGLESIAS	CELENDIN	CAJAMARCA	MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L	CONSORCIO SUPERVISOR SION	DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	

2. RESPONSABLES:

SUPERVISOR DE OBRA: ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICÓN

RESIDENTE DE OBRA: ING. FRANCISCO WILDER CHICHIPE SALAZAR

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Ejes 1-1 y 10-10 entre los ejes A-A y H-H, DEL PLANO DE CIMENTACIONES (CM-01), DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

TIPO DE SUELO: TIERRA GREDOSA

3. HORARIO DE TRABAJO:

- Inicio de jornada: 8:00 AM
- Refrigerio: 12:00 PM a 1:00 PM
- Fin de jornada: 5:00 PM

Domicilio Legal: CALLE AYACUCHO N°779 PISO 2 CPMEN. GARCES, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Teléfono: 979 987 845 / E-mail: gesleyb@gmail.com


Santos Felipe Rodríguez Picón
INGENIERO CIVIL
Rég. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

4. DURACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DIARIA:

Jornada completa (8h diarias)

5. CANTIDAD DE PERSONAL INVOLUCRADO:

- 1 asistente de ing. Residente
- 1 Ing. SSOMA
- 1 maestro de Obra
- 4 operarios
- 3 operarios metálicos
- 9 peones
- 1 chofer de volquete

6. PARTIDAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

- ❖ CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+ 30 % PIEDRA GRANDE
- ❖ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
- ❖ CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$
- ❖ MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A -1:4 X 1.5 cm
- ❖ CARAVISTA
- ❖ PINTURA DE MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C/A -
- ❖ 1:4 x 1.5 cm
- ❖ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- ❖ CONCRETO $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$
- ❖ TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 1:5
- ❖ TARRAJEO SOBRECIMIENTO MEZCLA C/A 1:5
- ❖ CERCO PERIMETRICO DE MALTA GALVANIZADA Y POSTE DE TUBO CIRCULAR
- ❖ RELLENO CON MATERIAL PROPIO
- ❖ CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$
- ❖ ACERO CORRUGADO $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60
- ❖ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNTAS
- ❖ JUNTAS ASFALTICAS EN CUNTAS

- ❖ REJILLA METALICA L=1.55
- ❖ RELLENO CON MATERIAL PROPIO
- ❖ DRENAJE DE PVC $\phi = 2"$ PARA MUROS
- ❖ EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE SUELO
- ❖ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5 km
- ❖ EXTENDIDO, NIVELADO DE MATERIAL OVER
- ❖ EXTENDIDO, NIVELADO, RIEGO Y COMPACTADO DE BASE
- ❖ SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO
- ❖ MALLA SINTETICA ATRAPA BOLAS
- ❖ LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

EQUIPOS A UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO:

- ◆ volquete Volvo A 40F
- 7. RESERVACIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD:
- Verificación diaria de condiciones del terreno
- Uso obligatorio de EPP
- Control de acceso y señalización de zonas de trabajo

8. AUTORIZACIÓN:

Firma Supervisor de Obra:

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
R.º 3. CIP. N.º 235281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Gesley Barboza Huangal
CONSORCIO SUPERVISOR SION
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Fog. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

10. REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCIÓN Y CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Celendín, 30 de SETIEMBRE del 2025

INFORME N°006-2025-PLSR-CSS

AL : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON
Ingeniero Supervisor de Obra
DEL : ING. PATRICIA LIZBET SILVA REYES
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
ASUNTO : INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2025 (del 20 al 25)

REFERENCIA :

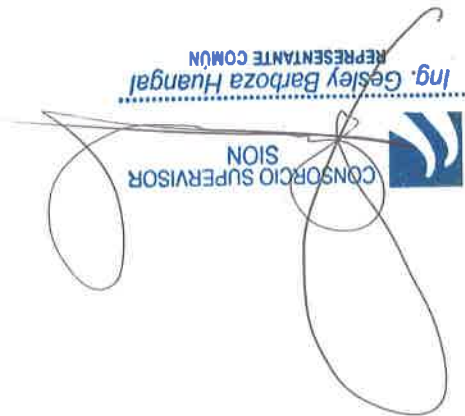
- a) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-64-2024-GR.CAJ-1
- b) Contrato N°016-2025-GRCAJ-GGR.
- c) Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927".


De mi mayor consideración,


Tengo a bien dirigirme a Usted para expresarle mi grato saludo y a la vez con relación al asunto hacerle llegar el Informe Mensual N° 006 en calidad de Especialista en Seguridad y salud ocupacional, de la obra que se indica en la referencia c), que comprende las actividades realizadas por el Contratista y la Supervisión de SETIEMBRE 2025 (del 20 al 25) del presente año, esperando su conformidad y trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,


CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gessley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN


Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Santos Felipe Rodriguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA
ECCIBD
FECHA: 30-09-2025
Hora: 2:56 P.m.

SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL



Periodo

: 20 - 25 de SETIEMBRE de 2025

Especialista

: Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes

Jefe de Supervisión

: Ing. Santos Felipe Rodríguez Picon

OBRA

: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LA
PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA
PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA, CUI N°2649927

SETIEMBRE-2025

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO SUPERVISOR
SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

334

NOMBRE DEL PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

CONTRATO DE OBRA : N°030-2025-GRCAL-GGR.

MONTO DEL CONTRATO : S/1,408,789.78 Soles

CONTRATISTA : MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.

REPRESENTANTE LEGAL : RODIN HERIBERTO MAS CAMUS

RESIDENTE DE OBRA : ING. FRANSISCO WILDER CHICHEPE SALAZAR

CONSULTOR : CONSORCIO SUPERVISOR SION

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA : ING. SANTOS FELIPE RODRIGUEZ PICON

ACTA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE INICIO DEL PLAZO : 23 DE ABRIL DEL 2025

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SION
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

I. INTRODUCCION:

El CONSORCIO SUPERVISOR SION, representado por el Ing. Gesley Barboza Huangal y la Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., vienen realizando las actividades correspondiente, teniendo el compromiso de parte de la Alta Dirección, empleados y de todos los trabajadores en cumplir con los procedimientos, con las normas de forma consciente y comprometidos con la importancia de la seguridad de obra, aplicado dentro de las actividades que se ejecutaron en los días **20 al 25 del mes de SETIEMBRE** en la zona de trabajo durante la EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927.

II. OBJETIVOS

Documentar las evidencias de gestión de seguridad en Obra, en la ejecución de las diversas actividades del Proyecto, orientados a consolidar una cultura de prevención de riesgos laborales. La intención es reducir los costos asociados a los accidentes en el puesto de trabajo y a los impactos que puedan suscitar en el proyecto de la obra; y comprende las siguientes actividades:

- a. Cumplir con el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo de la obra, presentado por Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**
- b. Cumplir con el Programa de Seguridad de obra y Salud ocupacional
- c. Verificar que la Contratista mantenga vigente el Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) para todo el personal en el presente mes de SETIEMBRE.
- d. Exponer los índices de accidentabilidad, frecuencia y evaluación de los peligros y riesgos relacionados con las actividades programadas durante el presente de la Contratista **MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.**
- e. Documentar e implementar las medidas de prevención, mitigación y corrección que nos permitan eliminar o minimizar los riesgos a la seguridad de los trabajadores e impactos en el entorno de desarrollo de la obra.
- f. Verificar el equipo de protección personal y el uso correcto de ellos en las actividades a realizar en la ejecución del proyecto.
- g. Revisión del correcto llenado de ATS, PETAR, Check list de equipos y herramientas
- h. Verificar la señalización temporal en obra de acuerdo a las áreas presentes en el proyecto.

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR SION



Ing. Patricia Lizbet Silva Keyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

[Firma]

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Roj. CIP. N°. 229281
SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Durante los días 20 al 25 de SETIEMBRE se realizaron las siguientes actividades:

- Se hizo la revisión de la señalética de seguridad, su ubicación y su estado de conservación.
- Colocación de puntos de hidratación en las actividades operativas en obra.
- Implementación de equipos de protección colectiva.
- Inducción y capacitación de personal hombre nuevo.
- Charlas de seguridad.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA

4.2

Para la Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., de acuerdo con sus obligaciones de proteger la integridad física y salud de sus trabajadores, se verificó la entrega de EPP nuevos cumpliendo con la norma G-050.

Se verifica permanentemente que todo el personal del proyecto lleve puesto siempre el equipo de protección personal básico, y adecuado a la tarea que desarrolla, en buenas condiciones, elementos de protección anti caídas y equipo de protección específico, el cual consiste en: casco de seguridad, zapatos de seguridad, lentes, chaleco, guantes de cuero, traje de seguridad, y se recomienda el cambio del EPP inmediatamente tenga algún deterioro.

PROGRAMA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL OBRA.

4.1

IV. EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD DE OBRA.

El presente informe plasma todas las actividades realizadas en el proyecto referentes a seguridad en obra en el proceso constructivo y las etapas de trabajos durante el presente mes en la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE PIZON DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2649927.

III. ALCANCE

- Verificar el equipo de respuestas ante emergencias en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir con el cronograma de charlas y capacitaciones Mensuales programadas durante el desarrollo del proyecto.
- Supervisar y apoyar a la gestión de las oportunidades de mejora en actividades diarias, haciendo cumplir los estándares de seguridad y salud en el trabajo en obra.
- Prevenir accidentes de trabajo en obra que impliquen daños personales.
- Verificar la implementación de agua en el frente de trabajo.

4.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD.

331

4.3.1 Programa de inducción de Seguridad en el trabajo

En el mes de SETIEMBRE se hizo la inducción al personal nuevo a obra se realizaron la inducción en seguridad en obra y salud ocupacional dirigido al personal nuevo, se le verificó el SCTR del mes de SETIEMBRE y el compromiso del trabajador y la entrega del RISST, los cuales son registrados en los formatos establecidos por la Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.

4.3.2 Programa de reuniones diarias en Seguridad en el trabajo.

La Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., realizó la reunión diaria de 5 minutos en los días 20 al 25 de SETIEMBRE de 2025, teniendo en cuenta la ley N° 29783 de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S. N°005-2012 -TR y su modificatoria la Ley N°30222, D.S. N° 006-2014-TR y D.S. N° 012-2014-TR., y sus modificatorios y ampliatorias.

4.4 PROGRAMA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

Para toda actividad que se ejecuta en obra se realizará el IPERC y el ATS dependiendo de las actividades ejecutadas y continuar capacitando al personal en la identificación de peligros e identificación de riesgos residuales en el llenado de los IPERC. Al mismo tiempo se hace una verificación que el personal cumpla con las medidas de control en cada una de las actividades que ejecuta.

4.5 AVISO, REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES CON LESIONES PERSONALES

La Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., y la Supervisión, ambas no se han visto involucradas en ningún tipo accidente con lesiones personales o incidente alguno durante el mes de SETIEMBRE.

5.6.1 . INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MENSUAL

En el mes de SETIEMBRE del 2025, la Supervisión y la Contratista MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., no registró incidentes con daños personales, y/o materiales.
Por lo tanto, sus indicadores de seguridad en los días 20 al 25 de SETIEMBRE de 2025 es cero.

Se detallan los indicadores de accidentalidad correspondientes:

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

4.6 CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS INSPECCIONES DE GESTION EN SEGURIDAD

- Índice de Frecuencia mensual (IF) = 0
- Índice de Severidad mensual (IS) = 0
- Índice de Accidentabilidad mensual (IA) = 0

I. Inspección de Documentos de Gestión:

- La supervisión verificará e inspeccionará los siguientes documentos: ATS, IPERC, PETS, PETAR, SOAT, Check List equipos y vehículos, licencias internas y licencias de conducir.
- La supervisión inspeccionará y verificará las herramientas de Gestión de Seguridad, ATS, registro de charlas de capacitación diaria, en las actividades que se están realizando en este mes.

II. Inspección Planificadas e Inopinadas

La supervisión inspeccionará diariamente en las actividades de la obra, donde las partidas realizadas en obra, para verificar las medidas de seguridad implementadas para el desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el mes, los documentos de gestión.

En las actividades a implementar los controles operacionales, el correcto uso, de ser necesario el remplazo y estado de los EPPs (cascos, zapatos, lentes, chaleco, protectores auditivos y respiradores de acuerdo a cada actividad realizada) de los trabajadores y personal.

1. Se verificó que la Contratista mantenga vigente el Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) para este mes de SETIEMBRE se verificó el ingreso al personal nuevo con SCTR, es un seguro obligatorio para todo el personal, se rige con las normas técnicas de DS 003-98-SA y que se cumpla DS 043-2016-SA donde se desarrollan actividades de riesgo previstas por Ley.

2. Se verificó que cuenten con los implementos de Seguridad en el equipo de protección personal de la Contratista, cumplimiento al Artículo 60. Equipos para la protección, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, LEY Nº 29783.

3. Se inspeccionó la correcta realización de las capacitaciones en Seguridad y Salud en obra de la Contratista de acuerdo a los días 20 al 25 de SETIEMBRE.

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

4. Se verificó los trabajos que involucran al cerco perimétrico del proyecto, movimiento de tierras, excavaciones, vaciados de concretos, encofrados, entre otros.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- ✓ En los días 20 al 25 de SETIEMBRE de 2025, se verifica el uso obligatorio de EPP y cumplir con la Normativa vigente.
- ✓ Se realizó la verificación de la implementación de seguridad colectiva, donde se verificó la señalización de seguridad en la obra.
- ✓ Se verifica que el contratista está realizando sus charlas diarias de 5 minutos, antes del inicio de cada jornada los días 20 al 25 SETIEMBRE de 2025.
- ✓ Se verificó la señalización temporal de seguridad, donde se va distribuir a la realización de los trabajos.
- ✓ Mejorar en el correcto llenado de ATS y Check list.
- ✓ Cumplir con los tiempos solicitados por la supervisión en la entrega de registro de charlas de seguridad, inducción, ATS, check list.

Recomendaciones:

- ✓ Se recomienda cumplir con la legislación aplicable vigente en materia de seguridad y salud en el Trabajo.
- ✓ Se recomienda en obra a todo el personal de trabajo cumplir todas las medidas de seguridad (Uso de equipos de protección personal en forma obligatoria) para llevar de forma armónica a la ejecución de cada una de las partidas de la obra.
- ✓ Se recomienda mejorar en el correcto llenado de ATS y Check list.
- ✓ Se recomienda cumplir con los tiempos solicitados por la supervisión en la entrega de registro de charlas de seguridad, inducción, ATS, check list.

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



Seguimiento de actividades, en cumplimiento al plan de SST.



Verificación de cumplimiento de la norma G050.

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Patricia Lizbet Silva Reyes

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Pg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Santos Felipe Rodríguez Picon

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Pag. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR SION



Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

[Handwritten signature]

Charlas de seguridad diarias.



Verificación de uso correcto de EPP.



Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Rg. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

[Signature]

CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN



Trabajo articulado con el supervisor de obra, en materia de seguridad



Charlas diarias en presente de supervisor y residente de obra



CONSORCIO SUPERVISOR
Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N.º 229281
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Verificación de cumplimiento de la norma G050.



Seguimiento de actividades diarias en cumplimiento con el plan SST




CONSORCIO SUPERVISOR SION
 Ing. Gesley Barboza Huangal
 REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N°: 229261
 SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
 CIP: 266008
 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Verificación de cumplimiento de la norma G050.



Verificación de uso correcto de EPPS



CONSORCIO SUPERVISOR

Ing. Gesley Barboza Huangal
REPRESENTANTE COMÚN

Santos Felipe Rodríguez Picon
INGENIERO CIVIL
Fog. CIP. N°: 229281
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. Patricia Lizbet Silva Reyes
CIP: 266008
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Verificación de cumplimiento de la norma G050.



Seguimiento directo de actividades de alto riesgo.

