



INFORME N° 005-2025- CSMC/ OBCR /SO

A : ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN - CONSORCIO SUPERVISOR MC

DE : ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°05 – SEPTIEMBRE 2025.

REFERENCIA : 1.- CARTA N°031-2025-JLYV-RC-CVN
2.- Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA
SAN NICOLÁSEMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE
CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA -
PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".

FECHA : Cajamarca, 05 de octubre del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente y a la vez, visto la carta de la referencia 1 y revisado toda la documentación que forma parte de la misma, hacerle llegar el informe de la valorización de obra N°05 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025, dicha valorización ha sido **revisada y aprobada** por la supervisión, la obra de la referencia 2 viene siendo ejecutada por el CONSORCIO VIAL DEL NORTE según CONTRATO DE OBRA N°006-2025-GRCAJ-GGR, derivado del proceso de selección A L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA.

A.- INFORMACIÓN GENERAL

I. FICHA RESUMEN

Mediante LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA, el Órgano encargado de las contrataciones con fecha 05 de diciembre del 2024 adjudicó la Buena Pro al Contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE, Con fecha 13 de enero del 2025 se firma el contrato de obra N°006-2025-GRCAJ-GGR entre el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO VIAL DEL NORTE y la entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, Con fecha 28 Enero de 2025 la entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA realiza la entrega de terreno a la empresa contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE, Con fecha 15 Abril de 2025 se da inicio al plazo de ejecución de obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 39818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



El plazo de ejecución de la obra es de 360 DÍAS CALENDARIO, el 07 de mayo del 2025 se suscribe el acta de suspensión de plazo de ejecución de obra que rige a partir del 02 de mayo del 2025, el 19 de julio del 2025 se suscribe el acta de reinicio del plazo de ejecución el cual rige a partir del 19 de julio del 2025 fecha de la cual se computa el plazo.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA OBRA	:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA MORAN LIRIO - PICACHO - TRANCA DE PÚJUPE DISTRITO DE HUALGAYOC DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
UBICACIÓN	:	DEPARTAMENTO : CAJAMARCA PROVINCIA : CAJAMARCA DISTRITO : JESÚS - NAMORA LOCALIDAD :NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPLAME PE-3N
TIPO DE PROCESO	:	A L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATO	:	N°006-2025-GRCAJ-GGR
FECHA DE CONTRATO	:	13 de enero del 2025
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
REPRESENTANTE COMÚN	:	LIC. JOSE LUIS YOPLA VERGARA
RESIDENTE	:	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	:	ING OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ (DESDE EL 19/08/2025)
VALOR REFERENCIAL SIN IGV	:	S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL CON IGV	:	S/ 32,141,980.18

CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / C.I.R.N.° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



MONTO DEL CONTRATO, SIN IGV	:	S/ 27,102,771.42
MONTO DEL CONTRATO, CON IGV	:	S/ 31,981,270.28
FACTOR DE RELACIÓN	:	0.995
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	:	Julio-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	360 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	28/01/2025
FECHA DE INICIO DE OBRA	:	15/04/2025
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	:	09/04/2026
ADICIONALES DE OBRA	:	No existe
DEDUCTIVOS DE OBRA	:	No existe
AMPLIACIONES DE PLAZO	:	No existe
ATRASO JUSTIFICADO	:	No existe
PLAZO VIGENTE DE EJECUCIÓN	:	360 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01	:	INICIO 02/05/2025 FIN 18/07/2025
FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN N°01	:	19/07/2025
TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL	:	26/06/2026

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR-BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONTROL DE CARTAS FIANZAS**CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO PRINCIPAL	Monto Inc. IGV:	S/ 3,198,127.03	Número de fianza:	N°3002024037117
	Aseguradora:	ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento:	22/02/2026	Estado Actual:	Vigente

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

**CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO**

CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO	Monto Inc. IGV:	S/ 3,198,127.02	Número de fianza:	N°3002024037118-2
	Aseguradora:	ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento:	10/10/2025	Estado Actual:	Vigente

DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO

AVANCE EJECUTADO DEL MES	3.83%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	13.58%
AVANCE PROGRAMADO DEL MES	0.76%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	3.59%
PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRASO	9.99%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	378.4%
SITUACIÓN DE LA OBRA	ADELANTADA

ASPECTO ECONÓMICO

Valorizaciones tramitadas:	5
Valorizaciones pagadas:	4
Valorización de obra del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 Sin IGV:	1,038,388.28
Valorización de obra del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 Con IGV:	1,225,298.17
Reajuste Sin IGV:	0.00

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY QUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR MC



1080
RUC N° 20614556171

Reajuste Con IGV:	0.00
Amortización del adelanto directo Sin IGV:	103,838.83
Amortización del adelanto directo con IGV:	122,529.82
Amortización adelanto materiales Sin IGV:	0.00
Amortización adelanto materiales Con IGV:	0.00
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Sin IGV:	-1,433.67
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Con IGV:	-1,691.73
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Sin IGV:	0.00
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Con IGV:	0.00
Monto neto a facturar Sin IGV:	935,983.12
Monto neto a facturar Con IGV:	1,104,460.08

CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BENLY CUEVARODRÍGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

**LAS METAS DEL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN:**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1.00
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	KM	19.76
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	mes	8.00
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	TERRAPLENA O RELLENO P/SUBRASANTE		
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49
02.01.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27
02.01.03	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08
02.01.04	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36
02.01.05	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES		
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



02.02.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76
03	SUB BASE - BASE		
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06
04	PAVIMENTOS		
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)		
04.01.01	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	M2	123,551.70
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56
04.02	VARIOS		
04.02.01	NIVELACIÓN DE TECHO DE BUZONES	und	7.00
04.02.02	REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	und	36.00
04.02.03	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	306.03
04.02.04	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	1,228.87
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
05.01	BADENES		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	877.31
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20
05.01.03	CONCRETO SIMPLE		
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397.03
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78



05.01.03.03	CONCRETO EN EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA $f'c=140 \text{ kg/cm}^2$	M3	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	591.27
05.02	ALCANTARILLAS		
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76
05.02.01.04	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	2,110.02
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	253.06
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO $D \leq 1.80 \text{ KM}$	M3	2,638.35
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	716.34
05.02.02.06	CAMA DE APOYO $E=10 \text{ cm}$	M3	466.09
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68
05.02.03	INSTALACIÓN TMC		
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC $D=24"$	m	308.31
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC $D=36"$	m	58.93
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC $D=60"$	m	11.92
05.02.03.04	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC $D=24"$	m	308.31
05.02.03.05	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC $D=36"$	m	58.93
05.02.03.06	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC $D=60"$	m	17.89
05.02.04	CONCRETO SIMPLE		
05.02.04.01	CONCRETO $F'c=175 \text{ KG/CM}^2$ PARA PARAPETOS	M3	21.32
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77
05.02.04.03	CONCRETO $F'c=175 \text{ KG/CM}^2 + 25\% \text{ PM}$ PARA CABEZALES	M3	111.95

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



1076

05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA EMBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50
05.03	MURO DE CONTENCIÓN		
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE	M2	7,686.15
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	7,363.90
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	8,030.45
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	2,572.40
05.03.03	CONCRETO SIMPLE		
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25
05.03.04	CONCRETO ARMADO		
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02
05.03.05	MISCELÁNEO		
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64
05.04	CUNETAS		
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M		
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.04.01.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,110.64

CONSORCIO SUPERVISOR MC

 OSCAR BERTHEL CUEVAS RODRÍGUEZ
 Ing. Civil CIP N° 19818
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACIÓN	M2	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACIÓN.	M3	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ²	M3	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1"	m	9,348.03
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
06.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		
06.01.01	LÍNEAS CONTINUAS	m	71,437.00
06.01.02	LÍNEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00
06.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00
06.02.05	GUARDAVÍAS METÁLICOS	m	1,265.10
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	GLB	1.00
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
OSCAR BERLY GUEVARA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



07.01.06.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GLB	1.00
07.01.06.02	PARTICIPACIÓN DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA		
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES.	GLB	1.00
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTILES	und	10.00
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00
07.04	PLAN DE ABANDONO		
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00
07.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00
08	FLETE		
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

DATOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

- Con fecha 09 de julio del 2025, el comité de selección adjudico la buena pro del CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-GRCAJ - primera convocatoria, adjudicó la Buena Pro al Contratista CONSORCIO SUPERVISOR MC con domicilio legal En Jr. Cinco Esquinas N° 1581, Urb. San Luis II etapa - Cajamarca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, con correo electrónico cuevarooscar@hotmail.com, representado por su representante Común el Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez.
- Con fecha 15 de agosto del 2025, se firma el CONTRATO N° 060-2025-GRCAJ-GGR entre el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y CONSORCIO SUPERVISOR MC para la **SUPERVISION** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA –

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.





REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA” – CUI N° 2384857.

- Con fecha 18 de agosto del 2025, se realiza la entrega de terreno por parte de los representantes del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA al CONSORCIO SUPERVISOR MC dando inicio al plazo contractual por parte de la Supervisión con fecha 19/08/2025.

Descripción del Contrato de Supervisión:

1. CONTRATO	:	CONTRATO N° 060-2025-GRCJ-GCR
2. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	15. Agos.2025
3. ENTIDAD CONTRATANTE	:	Gobierno Regional de Cajamarca
4. CONTRATISTA DE SUPERVISIÓN	:	CONSORCIO SUPERVISOR MC
5. REPRESENTANTE COMÚN	:	Sr. Oscar Berly Cueva Rodriguez
6. JEFE DE SUPERVISIÓN	:	Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	(Etapas)
7.1. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	Tarifas
7.2. LIQUIDACIÓN DE OBRA	:	Suma Alzada
8. MONTO CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN	:	S/.1, 025,424.35(c/IgV)
8.1. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	S/.1,011,752.00 (c/IgV)
8.2. LIQUIDACIÓN DE OBRA	:	S/.13,672.35 (c/IgV)
9. PLAZO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	:	360 días calendario
10. PLAZO DE LIQUIDACIÓN	:	30 días calendario
11. INICIO DEL SERVICIO	:	19.Agost.2025
12. FECHA TÉRMINO PROGRAMADA	:	14.Agost.2026

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil. CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR MC




RUC N° 20614556171

II. GRAFICO RESUMEN DE LA OBRA

- ✓ **Determinación del Avance Físico**

GRÁFICO DE CURVA "S": AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS AVANCE FÍSICO EJECUTADO

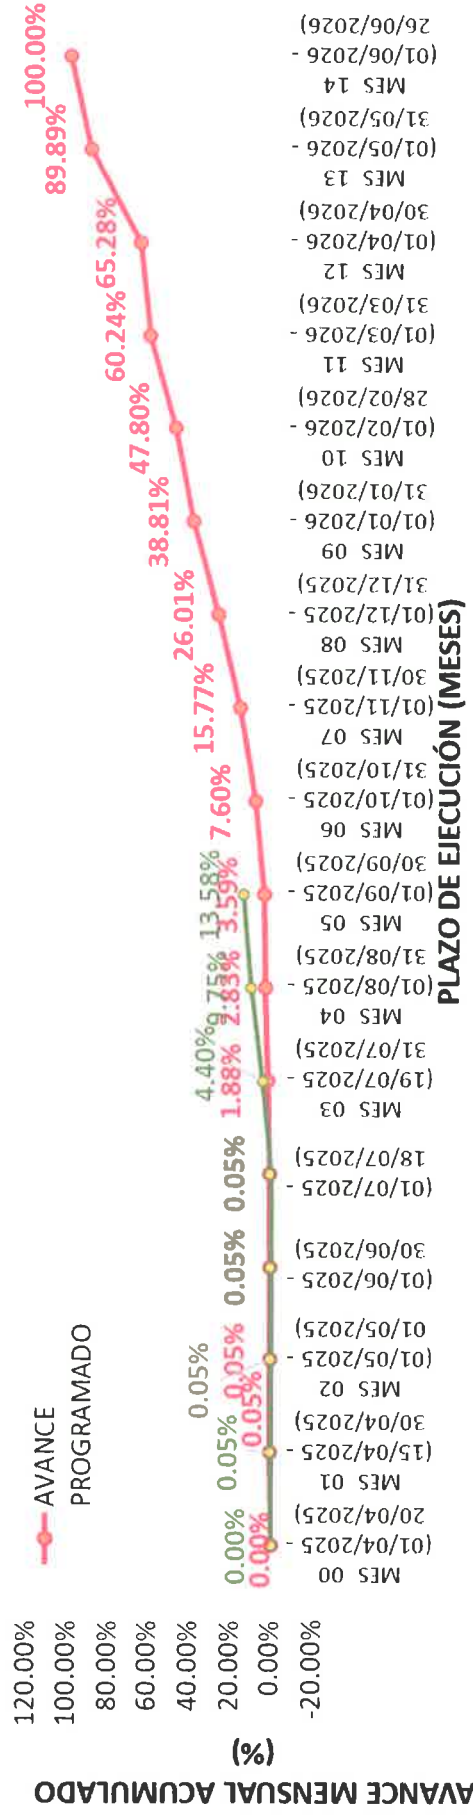

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1072

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
(15/04/2025 - 30/04/2025)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/2025 - 01/05/2025)	MES 02								
(19/07/2025 - 31/07/2025)	MES 03	493,674.87	508,558.81	1.82%	1.88%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.35%	4.40%
(01/08/2025 - 31/08/2025)	MES 04	257,573.68	766,132.49	0.95%	2.83%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/2025 - 30/09/2025)	MES 05	206,459.18	972,591.67	0.76%	3.59%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/2025 - 31/10/2025)	MES 06	1,086,162.20	2,058,753.87	4.01%	7.60%				
(01/11/2025 - 30/11/2025)	MES 07	2,216,423.94	4,275,177.81	8.18%	15.77%				
(01/12/2025 - 31/12/2025)	MES 08	2,772,942.24	7,048,120.05	10.23%	26.01%				
(01/01/2026 - 31/01/2026)	MES 09	3,470,204.38	10,518,324.43	12.80%	38.81%				
(01/02/2026 - 28/02/2026)	MES 10	2,437,759.56	12,956,083.99	8.99%	47.80%				
(01/03/2026 - 31/03/2026)	MES 11	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%				
(01/04/2026 - 30/04/2026)	MES 12	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%				
(01/05/2026 - 31/05/2026)	MES 13	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%				
(01/06/2026 - 26/06/2026)	MES 14	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		3,680,591.84		13.58%	

CS
MC

CONSORCIO SUPERVISOR MC

[Signature]

OSCAR BERYL CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA - Cajamarca.




CONSORCIO SUPERVISOR MC

RUC N° 20614556171



✓ Comparación del Avance Financiero

GRÁFICO DE CURVA "S": AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS AVANCE FÍSICO EJECUTADO

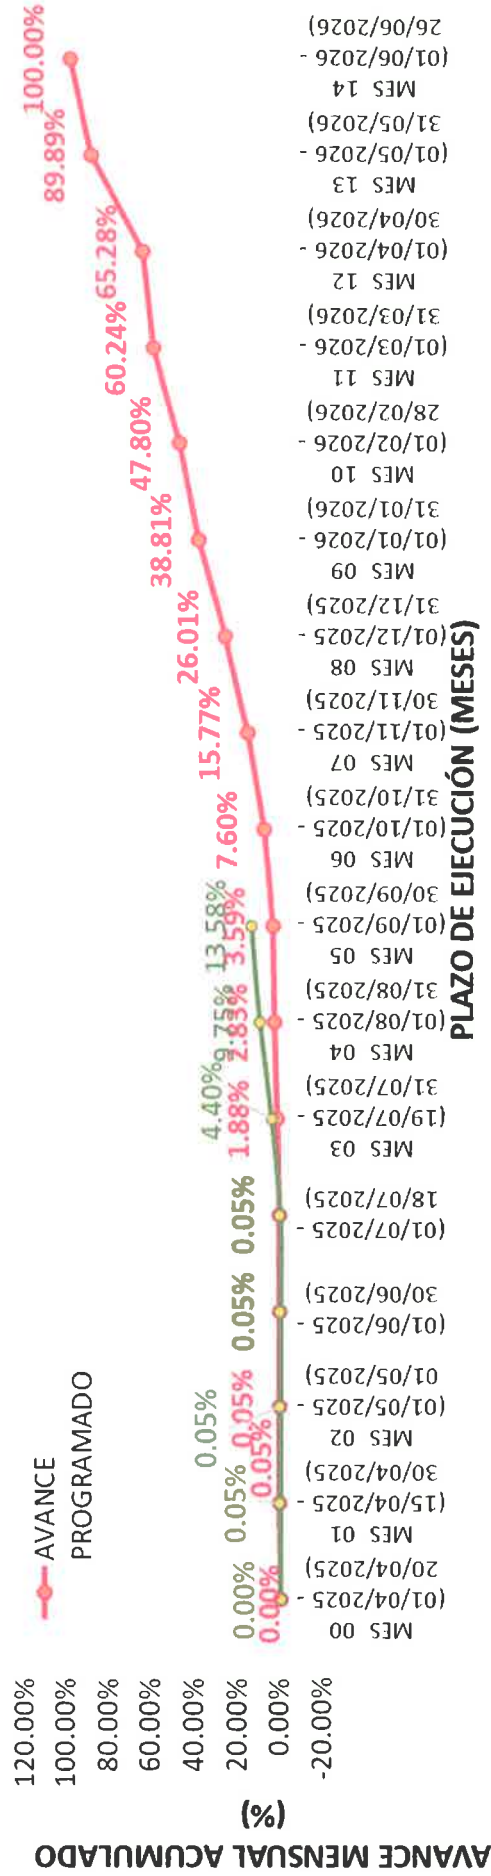

CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERRY GUEVA RODRIGUEZ

Ing. Civil / CIP N° 15818

JEFE DE SUPERVISION

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR MC



RUC N° 20614556171

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL S/	ACUMUL S/	PARCIAL %	ACUMUL %	PARCIAL S/	ACUMUL S/	PARCIAL %	ACUMUL %
(15/04/2025 - 30/04/2025)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/2025 - 01/05/2025)	MES 02								
(01/06/2025 - 30/06/2025)									
(01/07/2025 - 18/07/2025)									
(19/07/2025 - 31/07/2025)	MES 03	493,674.87	508,558.81	1.82%	1.88%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.35%	4.40%
(01/08/2025 - 31/08/2025)	MES 04	257,573.68	766,132.49	0.95%	2.83%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/2025 - 30/09/2025)	MES 05	206,459.18	972,591.67	0.76%	3.59%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/2025 - 31/10/2025)	MES 06	1,086,162.20	2,058,753.87	4.01%	7.60%				
(01/11/2025 - 30/11/2025)	MES 07	2,216,423.94	4,275,177.81	8.18%	15.77%				
(01/12/2025 - 31/12/2025)	MES 08	2,772,942.24	7,048,120.05	10.23%	26.01%				
(01/01/2026 - 31/01/2026)	MES 09	3,470,204.38	10,518,324.43	12.80%	38.81%				
(01/02/2026 - 28/02/2026)	MES 10	2,437,759.56	12,956,083.99	8.99%	47.80%				
(01/03/2026 - 31/03/2026)	MES 11	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%				
(01/04/2026 - 30/04/2026)	MES 12	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%				
(01/05/2026 - 31/05/2026)	MES 13	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%				
(01/06/2026 - 26/06/2026)	MES 14	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		3,680,591.84		13.58%	

SUSPENSION DE OBRA

CS
MC
CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Civil CIP N° 15818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



III. INFORMACIÓN DE LA OBRA

ESTADO FÍSICO DE LA OBRA

- En fecha 15/04/2025, se ha dado inicio al plazo de ejecución contractual de la ejecución de la obra (consorcio vial del norte).
- Con fecha 18 de agosto del 2025, se realiza la entrega de terreno por parte de los representantes del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA al CONSORCIO SUPERVISOR MC.
- Con fecha 19 de agosto del 2025, el CONSORCIO SUPERVISOR MC da inicio al plazo contractual por parte de la Supervisión.
- Con fecha 18 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 003-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita acceso al cuaderno de obra digital.
- Con fecha 22 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 004-2025-OBCR /RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita se haga llegar el Programa de Ejecución de Obra - Calendario de Avance de Obra, Adquisición de Materiales, Utilización de Equipo y Programación PERT-CPM, juntamente con el documento de aprobación de los mismos.
- Con fecha 25 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 005-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°010-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 25 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 006-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°021-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 26 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 007-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°012-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 26 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 008-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía opinión sobre documentos remitidos mediante CARTA N°D461-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL
- Con fecha 27 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 009-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía la contestación a la carta N°004-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 28 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 010-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza evaluación sobre cambio del ingeniero de suelos y pavimentos solicitado por la empresa contratista Consorcio Vial del Norte.
- Con fecha 28 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 011-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se informa sobre la participación de personal adicional al acreditado por parte de la empresa contratista.
- Con fecha 04 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 012-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°04 correspondiente al mes de agosto de la contratista (Consorcio Vial del Norte).
- Con fecha 05 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 013-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de supervisión respecto a la valorización N°01 correspondiente al periodo del mes de agosto (19-31 de agosto)

 CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 014-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita autorización de extracción de material para sub base de la cantera Samaday y Chilacat.
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 015-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite advertencia sobre el conocimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto.
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 016-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite cumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE - 3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 017-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza levantamiento de observaciones del plan de seguridad y salud ocupacional de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- Con fecha 15 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 018-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía advertencia sobre aspectos identificados en la supervisión ambiental rutinaria.
- Con fecha 17 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 019-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite documentación solicitada mediante oficio N° 000681-2025-CG/OC5336.
- Con fecha 17 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 020-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía resultado de análisis de cantera San José – Llimbe.
- Con fecha 19 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 021-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía contestación a la carta N° D489-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL en relación al informe N° D145-2025-GR.CAJ-GRE-SGE/RIC, sobre cuantificación de volúmenes de mayores metrados de roca suelta y roca fija.
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 022-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía contestación respecto a solicitud de liberación de tendido eléctrico subterráneo en la progresiva 01+210.
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 023-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita gestión urgente del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), para incorporar nuevas áreas auxiliares no contempladas en la DIA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA -REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA- PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 024-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita informe de acciones de prevención y acciones tomadas en campo.

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**
[Firma]
OSCAR BERRY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 025-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento sobre contestación respecto a solicitud de liberación de tendido eléctrico subterráneo en la progresiva 01+210.
- Con fecha 23 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 026-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N° 01 de la supervisión correspondiente al mes de agosto (periodo del 19 al 31) del 2025.
- Con fecha 23 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 027-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía solicitud de cierre inmediato de botadero no autorizado en progresiva 7+600.
- Con fecha 24 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 028-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza observaciones en relación a los informes presentados mediante carta N° 023-2025-AHVR/RO, por falta de sustento técnico de las consultas para absolución de las mismas.
- Con fecha 25 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 029-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza copia de la carta N° 021-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, para conocimiento.
- Con fecha 25 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 030-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza copia de la carta N° D547-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL para conocimiento.
- Con fecha 29 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 031-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite información de canteras y nuevo almacén.
- Con fecha 29 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 032-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza observaciones a la carta N° 027-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 30 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 033-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía devolución de expediente sobre necesidad de adicional de obra en redes de agua potable.
- Con fecha 30 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 034-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza informe de especialista de suelos y pavimentos de la supervisión.
- Con fecha 01 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 035-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza carta N° D559-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha 01 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 036-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza carta N° D561-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha 03 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 037-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía aprobación a solicitud de adelanto de materiales.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
OSCAR BERLY UELVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

**CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO****CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS**

MES	VAL. N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJE./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
(15/04/2025 - 30/04/2025)	01	14,114.11	14,114.11	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	100.00%
(01/05/2025 - 01/05/2025)	02	0.00	14,114.11	0.05%		14,883.94	0.05%	100.00%
(01/06/2025 - 30/06/2025)		0.00	14,114.11	0.05%		14,883.94	0.05%	100.00%
(01/07/2025 - 18/07/2025)		0.00	14,114.11	0.05%		14,883.94	0.05%	100.00%
(19/07/2025 - 31/07/2025)	03	488,194.71	502,308.82	1.85%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.40%	237.41%
(01/08/2025 - 31/08/2025)	04	259,267.42	761,576.24	2.81%	1,450,070.18	2,642,203.56	9.75%	346.98%
(01/09/2025 - 30/09/2025)	05	207,890.46	969,466.70	3.59%	1,038,388.28	3,680,591.84	13.58%	378.43%
(01/10/2025 - 31/10/2025)	06	1,087,855.94	2,057,322.64	7.59%				
(01/11/2025 - 30/11/2025)	07	2,217,855.20	4,275,177.84	15.77%				
(01/12/2025 - 31/12/2025)	08	2,772,942.24	7,048,120.08	26.01%				
(01/01/2026 - 31/01/2026)	09	3,470,204.38	10,518,324.46	38.81%				
(01/02/2026 - 28/02/2026)	10	2,437,759.26	12,956,083.72	47.80%				
(01/03/2026 - 31/03/2026)	11	3,371,710.27	16,327,793.99	60.24%				
(01/04/2026 - 30/04/2026)	12	1,366,032.31	17,693,826.30	65.28%				
(01/05/2026 - 31/05/2026)	13	6,668,689.39	24,362,515.69	89.89%				
(01/06/2026 - 26/06/2026)	14	2,740,255.43	27,102,771.12	100.00%				
TOTAL		S/. 27,102,771.12			S/ 3,680,591.84			

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MES

Los trabajos realizados por el contratista en el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025; se verifican con la participación de los especialistas de supervisión las siguientes partidas:

Se verifican con la participación de los especialistas de supervisión las siguientes partidas:

01 TRABAJOS PRELIMINARES**01.03 TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN (KM)**

METRADO EJECUTADO: 2.50

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 87.10%

DESCRIPCIÓN

En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procedió al replanteo general de la obra. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que fue revisado y aprobado por el inspector, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

El Contratista instaló puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el Contratista deberá proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciación, monumentación, cálculo y registro de datos para el control de las obras.

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY CUEVA RODRÍGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA (MES)

METRADO EJECUTADO: 1

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 28.75%

DESCRIPCIÓN

Se realizo el mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan en construcción y la seguridad vial, así como de la implementación de medidas ambientales, durante el periodo de ejecución de obras.

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 TERRAPLÉN O RELLENO P/SUBRASANTE

02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS (HA)

METRADO EJECUTADO: 0.25

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 77.18%

DESCRIPCIÓN

Se realizo el trabajo de rozar y desbrozar la vegetación existente, destroncar y desenraizar árboles, así como limpiar el terreno en las áreas que ocupo las obras y las zonas o fajas laterales requeridas para la vía, que se encontraron cubiertas de rastrojo, maleza, bosques, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quedo limpio y libre de toda vegetación y la superficie resulto apta para iniciar los trabajos

02.01.02 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE (M3)

METRADO EJECUTADO: 1,422.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 71.55%

DESCRIPCIÓN

Se realizo los trabajos de escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde se colocó el terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de materiales apropiados de acuerdo con la presente especificación, los planos y secciones transversales del proyecto.

02.02 CORTE EN EXPLANACIONES

02.02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM (M3)

METRADO EJECUTADO: 21,435.90

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 63.59%

DESCRIPCIÓN

Se realizo las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el limite de acarreo libre y colocar en los sitios de desecho, los materiales provenientes de los cortes clasificados como material suelto requeridos para la explanación y préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto.

02.02.06 PERFILADO DE CORTES EN TALUD (M2)

METRADO EJECUTADO: 725.34

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 75.11%

**CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



DESCRIPCIÓN

Se realizó las actividades de perfilado de corte en talud y las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes en ladera, así como de los taludes de desmonte.

02.02.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM (M3K)

METRADO EJECUTADO: 17,354.54

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 61.88%

DESCRIPCIÓN

Se considero el transporte y posterior eliminación del material excedente menor a un kilómetro procedente de los trabajos de la obra, dichos materiales son eliminados a los DME autorizados.

02.02.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM (M3K)

METRADO EJECUTADO: 37,255.61

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 58.83%

DESCRIPCIÓN

Se considero el transporte y posterior eliminación del material excedente mayor a un kilómetro procedente de los trabajos de la obra, dichos materiales son eliminados a los DME autorizados.

02.02.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA (M3)

METRADO EJECUTADO: 4,119.48

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 34.97%

DESCRIPCIÓN

Se elimino el material a media ladera determinado después de haber realizado las partidas de excavación, nivelación y rellenos de la obra.

04 PAVIMENTOS

04.02 VARIOS

04.02.02 REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ (UND)

METRADO EJECUTADO: 7

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 58.33%

DESCRIPCIÓN

Se desmonto los postes de iluminación como elementos a retirar y se realizó la reubicación en una posición relativamente cerca, procediendo con especial cuidado para no maltratarlos y cuidando de las personas que transitan.

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.03 MURO DE CONTENCIÓN

05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

METRADO EJECUTADO: 103.82

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 1.41%

CS CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
Oscar Berly Queva Rodríguez
ING. CIVIL / CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

**DESCRIPCIÓN**

Se realizó los trabajos de movimiento de tierras para relleno con material propio de las excavaciones ejecutados en terrenos comprendidos y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Asimismo, se realizó las excavaciones con maquinaria para la construcción de diferentes obras de arte, también comprendió el retiro del material proveniente de estas excavaciones sin contenido de elementos extraños, residuos o materias orgánicas.

05.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

METRADO EJECUTADO: 64.32

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 0.80%

Se realizaron los trabajos utilizando los volúmenes necesarios del material de préstamo para lograr la ejecución óptima de los rellenos. Todos los trabajos realizados fueron ejecutados en coordinación con el equipo de Supervisión.

05.03.02.04 PERFILADO Y COMPACTACIÓN (M2)

METRADO EJECUTADO: 78.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 13.24%

DESCRIPCIÓN

Se realizó el trabajo de afinado y terminado siempre a mano. El trabajo que se realizará en el área que soportará directa o indirectamente a la estructura del pavimento. Se respetó el ancho que se muestran los planos.

El origen de la zona a perfilar y compactar, fue:

Como resultado de corte de material suelto.

Como resultado de corte en roca suelta.

Como resultado de corte en roca fija.

Se suministró y usó las plantillas que controlan las dimensiones de este trabajo. En el caso de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al pavimento, las tolerancias de la subrasante, se debió ajustar a la cota del perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos.

05.03.03 CONCRETO SIMPLE**05.03.03.01 SOLADO $f'c=100$ kg/cm² (M3)**

METRADO EJECUTADO: 10.20

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 1.41%

DESCRIPCIÓN

Se colocó una capa de concreto $f'c=100$ kg/cm², para recibir a la estructura de concreto en la base de sus cimentaciones, previo el suelo compactado.

05.03.03.02 CONCRETO $F'c=175$ KG/CM² + 30% PG (M3)

METRADO EJECUTADO: 186.32

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**
[Firma]
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 25.44%

DESCRIPCIÓN

Se suministro los diferentes tipos de compuestos de cemento portland Tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparado y construido de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios forma, dimensiones y clases indicadas en los planos.

La clase de concreto que se utilizó se en las estructuras, se realizó de acuerdo a lo indicado en los planos o las especificaciones.

Concreto Clase G, 14MPa ($f_c = 140 \text{ Kg/cm}^2$)

Concreto $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 30 \% \text{ P.G.}$

Concreto Clase E, 17.5MPa ($f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$)

Se realizo los trabajos de suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

El concreto que se utilizó en el proyecto fue premezclado para sus diferentes resistencias a la compresión (f_c) a los 28 días.

05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (M2)

METRADO EJECUTADO: 418.59

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 27.38%

DESCRIPCIÓN

Se suministro, habilito, y se colocó las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida también incluye el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre.

05.03.04 CONCRETO ARMADO

05.03.04.01 CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$

METRADO EJECUTADO: 59.40

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 2.90%

Se suministro los diferentes tipos de compuestos de cemento portland Tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparado y construido de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios forma, dimensiones y clases indicadas en los planos.

La clase de concreto que se utilizó se en las estructuras, se realizó de acuerdo a lo indicado en los planos o las especificaciones.

Se realizo los trabajos de suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CS CONSORCIO SUPERVISOR MC
ML
OSCAR BERLY ZULEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISION

**05.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

METRADO EJECUTADO: 30.38

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 0.93%

Se suministro, habilito, y se colocó las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida también incluyó el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre.

05.03.04.04 ACERO F'Y=4200 KG/CM2

METRADO EJECUTADO: 8,481.90

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 4.10%

Esta actividad se realizó basándose en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto y en coordinación con la supervisión de la obra.

05.03.05 MISCELANEO**05.03.05.01 DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"**

METRADO EJECUTADO: 19.01

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 2.02%

Este trabajo consistió en la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final de acuerdo con las especificaciones, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto y las instrucciones del supervisor.

05.03.05.02 TUBO DE PVC Ø 2" (m)

METRADO EJECUTADO: 25.93

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 17.57%

DESCRIPCIÓN

Se suministro y coloco la tubería PVC en el diámetro y las dimensiones, indicadas en los planos del proyecto.

Preparación de la cama. - La cama es la parte que estará en contacto con el fondo de la tubería

Se colocolo un solado de 10 cm de concreto pobre y un ancho no menor a 1 1/2 diámetro.

Se construyo muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada y salida, para mejorar la captación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como reducir la erosión del relleno y controlar el nivel de entrada de agua.

07 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**07.01 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES****07.01.01 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 26.00 %

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - EIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com**Celular: 991746896****Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.**



DESCRIPCIÓN

Se realizaron los lineamientos generales para realizar la gestión de los residuos sólidos desde su generación, recolección, clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final, considerando los criterios de minimización en el origen y las opciones de reúso y/o reciclaje, según su aplicabilidad.

07.01.02 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE

METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 26.00 %

DESCRIPCIÓN

Se dio cumplimiento a los límites de emisiones de material particulado, gases y generación de ruido, exigidas por la normatividad ambiental vigente, y establecer las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del aire durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.03 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO

METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 26.00 %

DESCRIPCIÓN

Se dio las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del suelo durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.06 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

07.01.06.03 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 26.00 %

DESCRIPCIÓN

se estableció condiciones para que haya un ambiente cordial entre la población del área de influencia y trabajadores, así como trabajadores y el medio ambiente, todo ello para que no se generen conflictos y que haya una relación directa y organizada en pro del desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente.

07.02 PLAN DE CONTINGENCIA

07.02.02 SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTILES

METRADO EJECUTADO: 4.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00 %

DESCRIPCIÓN

Se realizó la colocación del sistema de extintores portátiles bajo Los Reglamentos de Seguridad aplicables a las actividades de comercialización de GLP exigen como mínimo extintores PQS (polvo químico seco) portátiles y rodantes con una capacidad mínima de extinción (rating) específica para cada tipo de agente de comercialización de GLP.

Extintor PQS de 6 Kg.

07.02.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 28.00 %

DESCRIPCIÓN

Se cumplieron con todas las exigencias de seguridad y se le proveerá a los trabajadores de todos los equipos de protección personal (EPPs) requeridos para el desarrollo de sus actividades, así como uniformes que los identifiquen.

07.02.07 SIMULACROS

METRADO EJECUTADO: 1.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 33.33%

DESCRIPCIÓN

Se ejecuto El Programa de Contingencias que tiene como propósito establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y controlar los accidentes que se pueden ocasionar como consecuencia de las actividades en la vía, principalmente durante el proceso constructivo.

07.03 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

07.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

METRADO EJECUTADO: 6.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 25.00%

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se realizó ejecutando un seguimiento de la calidad de emisiones gaseosas que se emitirán a la atmósfera, a fin de determinar si cumplen con los estándares que sean aplicables, y de esa manera evaluar las medidas para el control de las fuentes emisoras.

07.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

METRADO EJECUTADO: 3.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 25.00%

DESCRIPCIÓN

La ejecución de esta actividad se realizó para evaluar los niveles de ruido ambiental en áreas receptoras del aporte generado por las actividades de construcción, concernientes al nivel equivalente continuo de ruido diurno y nocturno.

07.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO

METRADO EJECUTADO: 6200

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 25.00%


CONSORCIO SUPERVISOR MC
OSCAR BERLY CUEVARODRÍGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



DESCRIPCIÓN

Se realizó esta actividad en las áreas susceptibles de recibir algún impacto en el suelo producto de la manipulación de residuos u otros productos, durante las actividades de construcción.

07.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

METRADO EJECUTADO: 5.00

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 55.56%

DESCRIPCIÓN

Se realizó esta actividad para obtener la caracterización física y química de los cuerpos de agua superficial a lo largo de distintas etapas del proyecto, enfocados en la evaluación de la Laguna San Nicolás y otros que se utilice en la etapa de construcción de la obra.

08 FLETE

08.01 FLETE TERRESTRE

METRADO EJECUTADO: 0.08

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 16.00 %

DESCRIPCIÓN

Se realizó el transporte de los insumos para ejecutar la obra, los insumos fueron puestos en obra.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ME
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



Se adjunta la Hoja de Metrados:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL (01/09/2025 - 30/09/2025)	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
			BASE				
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	19.76	14.71	2.50	17.21	2.55
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	8.00	1.30	1.00	2.30	5.70
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86	0.00	0.00	0.00	2,465.86
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01	TERRAPLEN O RELLENO P/SUBRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49	0.90	0.25	1.15	0.34
02.01.02	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27	20,620.54	1,422.00	22,042.54	8,765.73
02.01.03	PREPARACION DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08	0.00	0.00	0.00	23,115.08
02.01.04	PREPARACION DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36	0.00	0.00	0.00	28,351.36
02.01.05	PREPARACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95	0.00	0.00	0.00	25,890.95
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57	83,425.21	21,435.90	104,861.11	60,045.46
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75	2,991.41	0.00	2,991.41	4.34
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15	1,606.85	0.00	1,606.85	6.30
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99	0.00	0.00	0.00	11,837.99
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70	0.00	0.00	0.00	123,551.70
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85	5,210.54	725.34	5,935.88	1,966.97
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06	51,573.44	17,354.54	68,927.98	42,455.08
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10	45,436.80	37,255.61	82,692.41	57,871.69
02.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76	16,749.47	4,119.48	20,868.95	38,809.81
03	SUB BASE - BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09	0.00	0.00	0.00	16,764.09
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06	0.00	0.00	0.00	18,492.06
04	PAVIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	123,551.70	0.00	0.00	0.00	123,551.70
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56	0.00	0.00	0.00	126,017.56
04.02	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.02.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00


CONSORCIO SUPERVISOR MC

 OSCAR BERLY CUEVA ROBRIGUEZ
 Ing. Civil CIP N° 19818
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



04.02.01	DESCRIPCIÓN	und	METRADO	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL (01/09/2025 - 30/09/2025)	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
			BASE				
04.02.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	36.00	14.00	7.00	21.00	15.00
04.02.03	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	306.03	0.00	0.00	0.00	306.03
04.02.04	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	1,228.87	0.00	0.00	0.00	1,228.87
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01	BADENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13	0.00	0.00	0.00	1,906.13
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13	0.00	0.00	0.00	1,906.13
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45	0.00	0.00	0.00	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31	0.00	0.00	0.00	877.31
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05	0.00	0.00	0.00	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A	M3	543.73	0.00	0.00	0.00	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE	M3	125.17	0.00	0.00	0.00	125.17
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13	0.00	0.00	0.00	1,906.13
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
05.01.03	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397.03	0.00	0.00	0.00	397.03
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN Fc=175 kf/cm2	M3	87.78	0.00	0.00	0.00	87.78
05.01.03.03	CONCRETO EN ENBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA Fc=140 kf/cm2	M3	225.90	0.00	0.00	0.00	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16	0.00	0.00	0.00	582.16
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73	0.00	0.00	0.00	166.73
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACION	m	591.27	0.00	0.00	0.00	591.27
05.02	ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96	0.00	0.00	0.00	1,405.96
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96	0.00	0.00	0.00	1,405.96
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76	0.00	0.00	0.00	97.76
05.02.01.04	REMOCION DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68	0.00	0.00	0.00	24.68
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	2,110.02	0.00	0.00	0.00	2,110.02
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52	0.00	0.00	0.00	80.52
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	253.06	0.00	0.00	0.00	253.06
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	2,638.35	0.00	0.00	0.00	2,638.35
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	716.34	0.00	0.00	0.00	716.34
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09	0.00	0.00	0.00	466.09
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
05.02.03	INSTALACION TMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	134.00	0.00	134.00	174.31
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	58.93	0.00	58.93	0.00
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=60"	m	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92
05.02.03.04	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	0.00	0.00	0.00	308.31
05.02.03.05	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	0.00	0.00	0.00	58.93
05.02.03.06	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=60"	m	17.89	0.00	0.00	0.00	17.89
05.02.04	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32	0.00	0.00	0.00	21.32
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77	0.00	0.00	0.00	204.77
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABEZALES	M3	111.95	0.00	0.00	0.00	111.95
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94	0.00	0.00	0.00	704.94
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99	0.00	0.00	0.00	17.99
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14	0.00	0.00	0.00	113.14
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA ENBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC

Oscar Cuevaro Rodríguez
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



1054

05.03.01	DESCRIPCIÓN	0	METRADO BASE	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL (01/09/2025 - 30/09/2025)	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
05.03	MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	7,686.15	782.79	0.00	782.79	6,903.36
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15	782.79	0.00	782.79	6,903.36
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	7,363.90	930.71	0.00	930.71	6,433.19
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90	0.00	103.82	103.82	7,260.08
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8,030.45	0.00	64.32	64.32	7,966.13
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	2,572.40	262.60	78.00	340.60	2,231.80
05.03.03	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.03.01	SOLOADO F'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80	28.62	10.20	38.82	2,709.98
05.03.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16	288.00	186.32	474.32	1,389.84
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25	551.11	418.59	969.70	2,571.55
05.03.04	CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.04.01	CONCRETO F'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74	0.00	59.40	59.40	1,991.34
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80	0.00	0.00	0.00	2,164.80
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05	0.00	30.38	30.38	3,239.67
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02	0.00	8,481.90	8,481.90	198,597.12
05.03.05	MISCELANEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73	0.00	19.01	19.01	921.72
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59	50.62	25.93	76.55	359.04
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36	108.06	0.00	108.06	856.30
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64	0.00	0.00	0.00	1,735.64
05.04	CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	0.00	0.00	0.00	4,110.64
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64	0.00	0.00	0.00	4,110.64
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACION	M2	24,890.36	0.00	0.00	0.00	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACION.	M3	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS TRIANGULAR	M2	830.09	0.00	0.00	0.00	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS RECTANGULAR	M2	4,171.92	0.00	0.00	0.00	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO F'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45	0.00	0.00	0.00	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION e= 1"	m	9,348.03	0.00	0.00	0.00	9,348.03
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.01	LINEAS CONTINUAS	m	71,437.00	0.00	0.00	0.00	71,437.00
06.01.02	LINEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
06.02	SEÑALIZACION VERTICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
06.02.05	GUARDAVIAS METÁLICOS	m	1,265.10	0.00	0.00	0.00	1,265.10
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	GLB	1.00	0.18	0.08	0.26	0.74
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00	0.18	0.08	0.26	0.74
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00	0.18	0.08	0.26	0.74
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	GLB	1.00	0.18	0.00	0.18	0.82

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



07.01.06.02	DESCRIPCIÓN	GLB	METRADO	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL (01/09/2025 - 30/09/2025)	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
			BASE				
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00	0.10	0.00	0.10	0.90
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.06.01	PARTICIPACION CIUDADANA	GLB	1.00	0.18	0.00	0.18	0.82
07.01.06.02	PARTICIPACION DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00	0.18	0.00	0.18	0.82
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00	0.18	0.08	0.26	0.74
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00	0.10	0.00	0.10	0.90
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENOMENOS NATURALES.	GLB	1.00	0.18	0.00	0.18	0.82
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTATILES	und	10.00	6.00	4.00	10.00	0.00
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	0.20	0.08	0.28	0.72
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00	4.00	0.00	4.00	4.00
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00	1.00	1.00	3.00	3.00
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00	0.00	6.00	6.00	18.00
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00	0.00	3.00	3.00	9.00
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00	0.00	2.00	2.00	6.00
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00	0.00	5.00	5.00	4.00
07.04	PLAN DE ABANDONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
07.04.02	RESTAURACION DE AREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
08	FLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	0.08	0.08	0.16	0.84

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ME
OSCAR BERLY CUEVARO RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



RESUMEN DE VALORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Valorización de obra del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE-3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

UBICACIÓN CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: A PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL NORTE

RESIDENTE ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO

SUPERVISOR ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ (DESDE EL 19/08/25)

FECHA DE ENTREGA DE 28/01/2025

FECHA DE INICIO: 15/04/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 02/05/2025 al 18/07/2025

FECHA DE REINICIO: 19/07/2025

FECHA DE TÉRMINO: 26/06/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 DÍAS CALENDARIO

VALOR REFERENCIAL (SIN IGV): S/ 27,238,966.25

VALOR REFERENCIAL (CON IGV): S/ 32,141,980.18

FACTOR DE RELACION: 0.99500

MONTO CONTRATADO (SIN IGV): S/ 27,102,771.42

MONTO CONTRATADO (CON IGV): S/ 31,981,270.28

FECH BASE: Julio-2024

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: 360 DÍAS CALENDARIO

DESCRIPCIÓN	MONTO VIGENTE (SIN IGV)	VALORIZACION				SALDO (S/)
		ANTERIOR ACUM. (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	% AVANCE ACUMULADO	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL						
MONTO VALORIZADO SIN IGV	S/ 27,102,771.42	S/ 2,642,203.56	S/ 1,038,388.28	S/ 3,680,591.84	13.58%	S/ 23,422,179.58
TOTAL	S/ 27,102,771.42	S/ 2,642,203.56	S/ 1,038,388.28	S/ 3,680,591.84		S/ 23,422,179.58
AVANCE FISICO DE LA OBRA		9.75%	3.83%	13.58%		86.42%
CONTROL DE LINEA BASE						
Monto de Avance físico acumulado			f =	S/ 3,680,591.84		ADELANTADA
Monto de avance programado acum.			g =	S/ 972,591.67		
Cumplimiento de monto programado (f/g)				378.00%		
B. REAJUSTES						
Reajuste contrato principal		S/ 8,860.81	S/ 0.00	S/ 8,860.81		
TOTAL		S/ 8,860.81	S/ 0.00	S/ 8,860.81		
C. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo		-S/ 2,774.17	-S/ 1,433.67	-S/ 4,207.84		
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales						
TOTAL		-S/ 2,774.17	-S/ 1,433.67	-S/ 4,207.84		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A+B-C)		S/ 2,653,838.54	S/ 1,039,821.95	S/ 3,693,660.49		
D. AMORTIZACIONES						
Amortización de adelanto directo		S/ 368,059.18	S/ 103,838.83	S/ 471,898.01		
Amortización de adelanto de materiales						
TOTAL		S/ 368,059.18	S/ 103,838.83	S/ 471,898.01		
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB-D)		S/ 2,285,779.36	S/ 935,983.12	S/ 3,221,762.48		
MONTO POR I.G.V. (VN x 18%)		S/ 411,440.28	S/ 168,476.96	S/ 579,917.24		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		S/ 2,697,219.64	S/ 1,104,460.08	S/ 3,801,679.72		
TOTAL A FACTURAR PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			S/ 1,104,460.08			
DESCUENTOS (RETENCIONES, PENALIDADES) INCLUIDO IGV						
RETENCIONES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
PENALIDADES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
MONTO DE PAGOS CON I.G.V.	S/ 0.00	S/ 2,697,219.64	S/ 1,104,460.08	S/ 3,801,679.72		
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			S/ 1,104,460.08			



CONSORCIO SUPERVISOR MC

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - RUP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR MC



RUC N° 20614556171

IV. ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA

AVANCE ECONÓMICO POR PARTIDA – VALORIZACIÓN MES DE SETIEMBRE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	PRESUPUESTO OFERT.				ANTERIOR ACUMULADO				AVANCE				ACUMULADO				SALDOS			
			METRADO	P.U.	(\$/)	(\$/)	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	(\$/)	METRADO	PARCIAL	(\$/)	%	METRADO	PARCIAL	(\$/)	%	METRADO	PARCIAL	(\$/)	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES						631,351.38															
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1.00	362,491.23			362,491.23	0.5	181,245.62	50.00%	0.40											
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00	3,514.15			7,028.30	2	7,028.30	100.00%												
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	KM	19.76	1,654.33			32,689.58	14.71	24,395.20	74.44%												
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	8.00	28,448.60			227,588.80	1.3	36,983.18	16.25%												
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86	0.63			1,553.49															
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						4,327,199.85															
02.01	TERRAPLEN O RELLENO P/SUBRASANTE	HA	1.45	4,787.83			7,133.87	0.9	4,309.04	60.40%	0.34											
02.01.01	DESBRUCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS																					
02.01.02	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE	M3	30,808.27	10.77			331,805.07	20,620.54	222,083.22	66.93%												
02.01.03	PREPARACION DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08	7.28			168,277.78															
02.01.04	PREPARACION DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36	7.28			206,397.90															
02.01.05	PREPARACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95	7.28			188,486.12															
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES						3,425,099.11															
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57	7.33			1,208,765.18	83,425.21	611,506.76	50.59%	0.37											
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,996.75	28.79			86,247.64	2,991.41	86,122.66	99.88%												
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15	47.06			75,914.84	1,606.85	75,618.36	1.00%												
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.95	34.74			411,251.77															
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	123,551.70	2.01			248,338.92															
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85	3.77			29,793.74	5210.54	19,643.74	65.93%												
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=1 KM	MSK	131,363.06	1.67			186,009.71	51,573.44	86,127.64	0.46%												
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=2 KM	MSK	140,564.10	7.21			1,013,467.18	45,436.80	327,599.33	0.32%												
02.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL A MEDIA ADEREA C/MACINARIA	M3	59,678.76	2.77			165,310.17	16749.47	46,396.03	28.07%												
03	SUB BASE - BASE						1,723,138.38															
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00	39.76			235,339.44															
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09	41.35			693,195.12															

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1051



RUC N° 20614556171



CONSORCIO SUPERVISOR N° 1
Oscar Berly Lueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 19018
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA-Cajamarca.

05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76	8.69	849.53													97.76	849.53	100.00%
05.02.01.04	REMOCION DE ALcantarILLAS TMC	m	24.68	39.62	977.82													24.68	977.82	100.00%
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALcantarILLAS TMC	und	3.00	62.62	187.86													3.00	187.86	100.00%
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				105,434.23														105,434.23	100.00%
05.02.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	2,110.02	11.06	23,336.82													2,110.02	23,336.82	100.00%
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52	26.09	2,100.77													80.52	2,100.77	100.00%
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	253.06	97.47	24,665.76													253.06	24,665.76	100.00%
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	2,638.35	1.67	4,406.04													2,638.35	4,406.04	100.00%
05.02.02.05	A ROTADERO D<=1.80 KM																			
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	716.34	7.25	5,222.12													716.34	5,222.12	100.00%
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09	97.77	45,569.62													466.09	45,569.62	100.00%
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68	195.73	133.10													0.68		100.00%
05.02.03	INSTALACION TMC				71,684.87														71,684.87	36.76%
05.02.03.01	ARMADO ALcantarILLA TMC D=24"	m	308.31	337.92	104,184.12	134	45,281.28	43.46%									134	45,281.28	58,902.84	56.54%
05.02.03.02	ARMADO ALcantarILLA TMC D=36"	m	58.93	448.05	26,403.59	58.93	26,403.59	100.00%									58.93			
05.02.03.03	ARMADO ALcantarILLA TMC D=50"	m	11.92	1,109.70	13,227.62															
05.02.03.04	INSTALACION ALcantarILLA TMC	m	308.31	124.54	38,396.93													308.31	38,396.93	100.00%
05.02.03.05	INSTALACION ALcantarILLA TMC	m	58.93	149.40	8,804.14													58.93	8,804.14	100.00%
05.02.03.06	INSTALACION ALcantarILLA TMC	m	17.89	224.02	4,007.72													17.89	4,007.72	100.00%
05.02.04	CONCRETO SIMPLE				139,924.82														139,924.82	100.00%
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32	538.43	11,479.33													21.32	11,479.33	100.00%
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77	55.20	11,303.30													204.77	11,303.30	100.00%
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABLEZALES	M3	111.95	554.67	62,095.31													111.95	62,095.31	100.00%
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABLEZALES	M2	704.94	55.20	38,912.69													704.94	38,912.69	100.00%
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99	444.42	7,995.12													17.99	7,995.12	100.00%
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14	62.03	7,018.07													113.14	7,018.07	100.00%
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA	M3	1.80	502.28	904.10													1.80	904.10	100.00%
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA	M2	4.50	48.20	216.90													4.50	216.90	100.00%

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA-Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Nueva Rodríguez
Ing. Civil
JEFE DE SUPERVISIÓN



05.03	MURO DE CONTENCIÓN																	
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					7,055,743.24		222,107.25	0.03		236,014.07	3.34%		458,121.32	6.49%		6,597,621.92	93.51%
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	7,686.15	3.91		54,648.53		5,565.64	0.10					5,565.64	10.18%		49,082.99	83.82%
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15	3.20		24,595.68	782.79	2,504.95	10.18%					782.79	10.18%		26,992.14	89.82%
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					1,340,570.93		12,208.00	0.01		13,275.34	0.99%		25,483.34	1.90%		1,315,087.59	98.10%
05.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	7,363.90	11.06		81,444.73	930.71	10,293.65	12.64%					930.71	12.64%		71,151.08	87.36%
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90	61.82		455,236.30				103.82	6,418.15	1.41%		6,418.15	1.41%		448,818.15	98.59%
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8,030.45	97.77		785,137.10				64.32	6,288.57	0.80%		6,288.57	0.80%		778,848.53	99.20%
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	2,572.40	7.29		18,752.80	262.6	1,914.35	10.21%		568.62	3.03%		2,492.97	13.24%		16,260.83	86.76%
05.03.03	CONCRETO SIMPLE					2,532,501.01		202,550.73	0.08		130,950.11	5.19%		333,500.84	13.22%		2,199,000.17	86.77%
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80	473.58		1,301,776.70	28.62	13,553.86	0.01	10.20	4,890.52	0.37%		18,384.38	1.41%		1,283,392.32	98.59%
05.03.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM² + 30% PG	M3	1,864.16	537.54		1,002,060.57	288	154,811.52	15.45%	186.32	100,154.45	9.99%		254,965.97	25.44%		747,094.60	74.56%
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25	62.03		219,663.74	551.11	34,185.35	15.56%	418.59	25,965.14	11.82%		60,150.49	27.38%		159,513.25	72.62%
05.03.04	CONCRETO ARMADO					2,302,908.73					88,141.12	3.04%		88,141.12	3.04%		2,214,767.61	96.96%
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74	646.78		1,326,377.62				59.40	38,418.73	2.90%		38,418.73	2.90%		1,287,958.89	97.10%
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA	M2	2,164.80	95.05		205,764.24											205,764.24	100.00%
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05	62.03		207,841.20				30.38	1,884.47	0.93%		1,884.47	0.93%		200,956.73	99.07%
05.03.04.04	ACERO F'y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02	5.64		1,167,925.67				8,481.90	47,837.92	4.10%		47,837.92	4.10%		1,120,087.75	95.90%
05.03.05	MISCELANEO					234,114.04		1,782.88	0.01		3,647.50	1.56%		5,430.38	2.32%		228,683.66	97.68%
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" -	M3	940.73	184.48		173,545.87				19.01	3,506.96	2.02%		3,506.96	2.02%		170,038.91	97.98%
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59	5.42		2,360.90	50.62	274.36	11.62%	25.93	140.54	5.95%		414.90	17.57%		1,946.00	82.43%
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2" PARA MUROS	M2	964.36	13.96		13,462.47	108.06	1,508.52	11.21%					1,508.52	11.21%		11,953.95	88.79%
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64	25.78		44,744.80											44,744.80	100.00%
05.04	CUNETAS					1,854,243.56											1,854,243.56	100.00%
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M					1,854,243.56											1,854,243.56	100.00%
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					381,155.79											381,155.79	100.00%
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	44.73		183,868.93											183,868.93	100.00%
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	4,110.64	2.55		10,482.13											10,482.13	100.00%
D=1KM																		
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACION	M2	24,890.36	7.29		181,450.72											181,450.72	100.00%
05.04.01.01.04	EXCAVACION Y PERFIADO DE ZANJAS DE CORONACION.	M3	85.50	62.62		5,354.01										85.50	5,354.01	100.00%
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE					1,473,087.77											1,473,087.77	100.00%
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS TRIANGULAR	M2	830.09	33.09		27,467.68											27,467.68	100.00%
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETAS RECTANGULAR	M2	4,171.92	55.03		229,580.76											229,580.76	100.00%
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45	527.31		1,124,989.52											1,124,989.52	100.00%
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION e= 1"	m	9,348.03	9.74		91,049.81											91,049.81	100.00%

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Ir. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA-Cajamarca.

[illegible]

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA-Cajamarca.



CONSORCIO SUPERVISOR M...
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO SUPERVISOR MC



RUC N° 20614556171

07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO						67,120.92					21,544.44	32.10%			21,544.44	32.10%			45,576.48	67.90%
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00	1,226.79			29,442.98				6.00	7,360.74	25.00%			7,360.74	25.00%		18.00	22,082.22	75.00%
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00	879.58			10,554.98				3.00	2,638.74	25.00%			2,638.74	25.00%		6.00	7,916.22	75.00%
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00	1,441.38			11,531.04				2.00	2,882.76	25.00%			2,882.76	25.00%		6.00	8,648.28	75.00%
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00	1,732.44			15,591.98				5.00	8,662.20	55.56%			8,662.20	55.56%		4.00	6,929.76	44.44%
07.04	PLAN DE ABANDONO						127,640.00													127,640.00	100.00%
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES	GLB	1.00	57,060.00			57,060.00												1.00	57,060.00	100.00%
07.04.02	RESTAURACION DE AREAS	GLB	1.00	70,580.00			70,580.00												1.00	70,580.00	100.00%
08	FLETE						395,187.54			31,615.00	0.08	31,615.00	8.00%			63,230.00	16.00%			331,957.54	84.00%
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	395,187.54			395,187.54			31,615.00	0.08	31,615.00	8.00%			63,230.00	16.00%		0.84	331,957.54	84.00%
	COSTO DIRECTO						21,992,833.80			842,611.28		842,611.28				2,986,655.62				19,006,178.18	
	GASTOS GENERALES (16.853876631473%)						3,706,634.08			142,012.24		142,012.24				503,365.76				3,203,268.32	
	UTILIDAD (16.38075087907352%)						1,403,303.54			53,764.76		53,764.76				190,570.46				1,212,733.08	
	SUB TOTAL						27,102,771.42			1,038,368.28	9.75%	1,038,368.28	3.83%			3,680,591.84	13.58%			23,422,179.58	86.42%
	IGV (18%)						4,878,498.86			186,909.86		186,909.86				662,506.53				4,215,992.33	
	COSTO TOTAL						31,981,270.28			1,225,298.17		1,225,298.17				4,343,098.37				27,638,171.91	
	AVANCE PORCENTUAL						100.00%			9.75%		9.75%				13.58%				86.42%	

CONSORSIO SUPERVISOR MC
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISION

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1046



CONSORCIO SUPERVISOR MC



RUC N° 20614556171

V. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°05									
Valorización de obra del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025									
: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE-3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.									
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA									
CONSORCIO VIAL DEL NORTE									
ING. ALEX HIDEBRANDO VÁSQUEZ REGALADO									
ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ (DESDE EL 19/08/2025)									
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 28/01/2025									
FECHA DE INICIO: 15/04/2025									
FECHA DE SUSPENSIÓN: 02/05/2025 al 18/07/2025									
FECHA DE REINICIO: 19/07/2025									
FECHA DE TÉRMINO: 26/06/2026									
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: 360 DÍAS CALENDARIO									
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: A PRECIOS UNITARIOS									
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 360 DÍAS CALENDARIO									
VALOR REFERENCIAL (SIN IGV): S/ 27,238,966.25									
VALOR REFERENCIAL (CON IGV): S/ 32,141,980.18									
FACTOR DE RELACION: 0.99500									
MONTO CONTRATADO (SIN IGV): S/ 27,102,771.42									
MONTO CONTRATADO (CON IGV): S/ 31,981,270.28									
FECH BASE: Julio-2024									
DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%
COSTO DIRECTO	21,992,833.80	S/ 2,144,044.34	9.75%	S/ 842,611.28	3.83%	S/ 2,986,655.62	13.58%	S/ 19,006,178.18	86.42%
TRABAJO PRELIMINARES	631,351.38	S/ 249,592.30	39.53%	S/ 32,584.43	5.16%	S/ 282,176.73	44.69%	S/ 349,174.65	55.31%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,327,199.85	S/ 1,479,406.84	34.19%	S/ 485,377.57	11.22%	S/ 1,964,784.41	45.41%	S/ 2,362,415.44	54.59%
SUB BASE - BASE	1,723,138.38	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 1,723,138.38	100.00%
PAVIMENTOS	3,667,502.35	S/ 34,172.46	0.93%	S/ 17,086.23	0.47%	S/ 51,258.69	1.40%	S/ 3,616,243.66	98.60%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	9,843,421.97	S/ 293,792.12	2.98%	S/ 236,014.07	2.40%	S/ 529,806.19	5.38%	S/ 9,313,615.78	94.62%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	936,424.50	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 936,424.50	100.00%
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	468,607.83	S/ 55,465.62	11.84%	S/ 39,933.98	8.52%	S/ 95,399.60	20.36%	S/ 373,208.23	79.64%
FLETE	395,187.54	S/ 31,615.00	8.00%	S/ 31,615.00	8.00%	S/ 63,230.00	16.00%	S/ 331,957.54	84.00%
TOTAL COSTO DIRECTO (CD)	21,992,833.80	S/ 2,144,044.34		S/ 842,611.28		S/ 2,986,655.62		S/ 19,006,178.18	
GASTOS GENERALES (16.853826631473%)	3,706,634.08	S/ 361,353.52		S/ 142,012.24		S/ 503,365.76		S/ 3,203,268.32	
UTILIDAD(6.38073087907352%)	1,403,303.54	S/ 136,805.70		S/ 53,764.76		S/ 190,570.46		S/ 1,212,733.08	
SUBTOTAL	27,102,771.42	S/ 2,642,203.56	9.75%	S/ 1,038,388.28	3.83%	S/ 3,680,591.84	13.58%	S/ 23,422,179.58	86.42%
IGV(18%)	4,878,498.86	S/ 475,596.64		S/ 186,909.89		S/ 662,506.53		S/ 4,215,992.33	
TOTAL INCLUIDO IGV	31,981,270.28	S/ 3,117,800.20		S/ 1,225,298.17		S/ 4,343,098.37		S/ 27,638,171.91	



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1045

**VI. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA**

1	AVANCE EJECUTADO DEL MES	:	3.83%
2	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	:	13.58%
3	AVANCE PROGRAMADO DEL MES	:	0.76%
4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	:	3.59%
5	PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRAZO	:	9.99%
6	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	:	378.43%
7	SITUACIÓN DE LA OBRA	:	ADELANTADA

VII. UTILIZACIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA**1. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO**

Se cuenta con la presencia de todo el personal técnico propuesto según bases integradas de la obra según el siguiente cuadro:

PERSONAL CLAVE

CARGO:	APELLIDOS Y NOMBRES:
Ingeniero Residente de Obra	Vásquez Regalado Alex Hildebrando
Ingeniero especialista en Estructuras	Ramírez Mestanza Jhon Pool
Ingeniero Geólogo y/o Geotécnico	Leiva Salirrosas Dilkar Elvis
Ingeniero de Control de Calidad	Marín Gutiérrez Andy Michel
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Deysi M. Vásquez Balcázar.

PERSONAL NO CLAVE

Ingeniero Ambiental	Valdivia Perales Nilton Iban
Técnico en seguridad y prevención de riegos	Cieza Caruajulca Diego Jhordan
Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño Vial)	Bardales Vásquez Yover
Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte	Abanto Plasencia Cristian Amauri

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**

OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



Ingeniero Asistente	Cabrera Gonzales Franco Vicmark
---------------------	---------------------------------

2. PERSONAL OBRERO

Se cuenta con la presencia de personal en obra según el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD
Capataz	1
Maestro de Obras	1
Topógrafo	1
Asistente de topógrafo	2
Ayudante de Topógrafo	2
Operadores	3
Operadores de Maquinaria Pesada	18
Puntero de Excavadora	2
Cuadrador	2
Gasfitero	1
Oficiales	2
Peones	23
Vigías	5
Guardianes	6
Cocinero	1
Jefe de Almacén	1

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADO

Se cuenta con las siguientes Maquinarias y Equipos pesados en obra que se detalla en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS	CANTIDAD
Rodillo Liso Vibr. Autop	1
Camioneta Doble tracción	2
Camión Cisterna	1
Camión Baranda	1
Retroexcavadora	2
Excavadora	3
Motoniveladora	1
Camión Volquete 15 m3	9

4. MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO

Se cuenta con las siguientes Maquinarias y Equipos livianos en obra que se detalla en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA Y EQUIPOS LIVIANOS	CANTIDAD
GNSS	3
Estación Total	2

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**
Oscar Berly Cueva Rodríguez
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



Mezcladora de concreto	1
Motobomba	1
Motosierra	1
Salitrin Compactador	2
Grupo Electrónico	2
Cierra circular	1
Vibrador de Concreto	2
Zaranda	1
Nivel Topográfico	2

B) INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

- Con fecha 09 de julio del 2025, el comité de selección adjudica la buena pro del CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-GRCAJ - primera convocatoria, adjudicó la Buena Pro al Contratista CONSORCIO SUPERVISOR MC con domicilio legal En Jr. Cinco Esquinas N° 1581, Urb. San Luis II etapa - Cajamarca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, con correo electrónico cuevarooscar@hotmail.com, representado por su representante Común el Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez.
- Con fecha 15 de agosto del 2025, se firma el CONTRATO N° 060-2025-GRCAJ-GGR entre el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y CONSORCIO SUPERVISOR MC para la **SUPERVISIÓN** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857.
- Con fecha 18 de agosto del 2025, se realiza la entrega de terreno por parte de los representantes del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA al CONSORCIO SUPERVISOR MC dando inicio al plazo contractual por parte de la Supervisión con fecha 19/08/2025.

Descripción del Contrato de Supervisión:

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857.

Tipo de Proceso : CONCURSO PUBLICO 001-2025-GR.CAJ

 **CONSORCIO SUPERVISOR MC**
Oscar Berly Cueva Rodríguez
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil, CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.



Primera Convocatoria

Contrato N° : N° 060-2025-GRCAJ - GGR
Fecha suscripción de Contrato : 15 de agosto del 2025
Sistema de Contratación : Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada)
Ubicación : Departamento: Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito: Jesús - Namora
Localidades : Palturo, Laguna San Nicolas y Chilacat.
Entidad : Gobierno Regional de Cajamarca
Contratista : Consorcio Supervisor MC
Representante Legal : Oscar Berly Cueva Rodríguez.
Supervisor : Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez
Monto Referencial : S/. 1'139,360.38 (inc. IGV) a febrero 2025.
Monto de contrato : S/. 1'025,424.35 (inc. IGV).
Factor de Relación : 0.90
Fecha de Presupuesto Base : febrero-25
Plazo de prestación del servicio : 390 días calendario.
360 d.c. (supervisión de ejecución de obra)
30 d.c. (recepción de obra y liquidación de
supervisión)
Fecha de entrega de cargo : 18/08/2025
Fecha inicio servicio de supervisión : 19/08/2025
Fecha fin del servicio de supervisión : 14/08/2026 (supervisión de ejecución de obra)
: 13/09/2026 (incluido recepción y liquidación de
supervisión).

CONSULTAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO

No se han realizado.

AMPLIACIONES DE PLAZO

No se han realizado.

ADICIONALES DE OBRA

No se han realizado.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ME
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.




i) RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

RELACIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS

- Camioneta pick up cabina doble 4x4
- Computadora/ laptop
- Estación total
- Nivel topográfico

ORGANIGRAMA DE SUPERVISIÓN

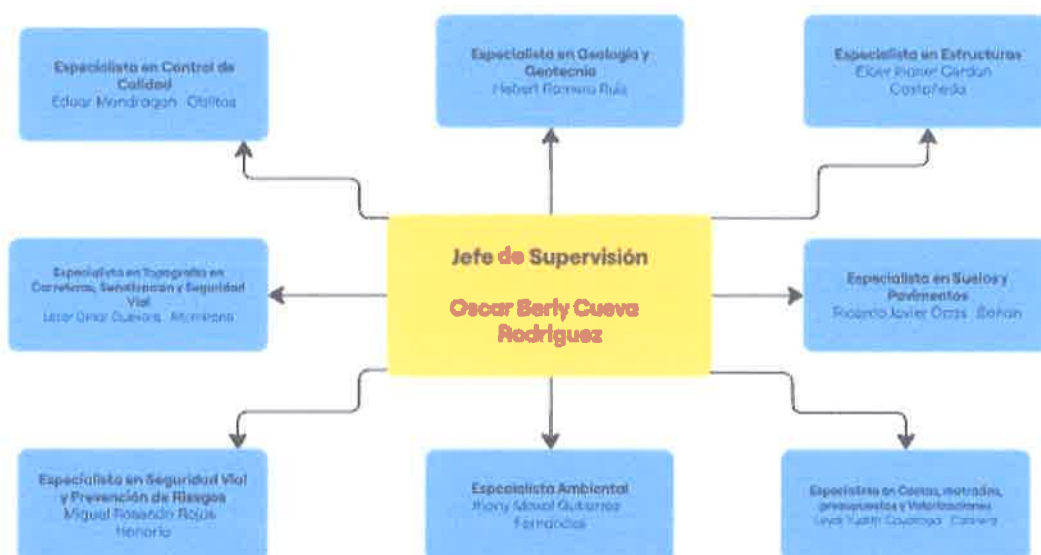

En el cuadro siguiente se indica el personal clave que se encuentra en obra.

PERSONAL PROFESIONAL-TÉCNICO EN OBRA

N°	CARGO	NOMBRE	CIP N°
1	Jefe de Supervisión	Oscar Berly Cueva Rodríguez	19818
2	Especialista en Estructuras	Elder Jhoner Cerdán Castañeda	305727
3	Especialista en Geología y Geotecnia	Hebert Romero Ruiz	216717
4	Especialista en Control de Calidad	Eduar Mondragón Oblitas	287902
5	Especialista en Suelos y Pavimentos	Ricardo Javier Ocas Bañón	129863
6	Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial	Lotar Omar Guevara Altamirano	342436
7	Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Miguel Rosendo Rojas Honorio	222060
8	Especialista Ambiental	Jhony Maxol Gutiérrez Fernández	96788
9	Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	Leydi Yudith Cayotopa Cabrera	328822

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodríguez
Ing. Civil CIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El inicio de obra comienza el día 15 de abril del 2025, con término de actividades contractuales el día 26 de junio del 2026, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios según Expediente Técnico (Cronograma de ejecución de Obra).
- ✓ El CONSORCIO SUPERVISOR MC a cargo de la supervisión de obra, ha iniciado su función formalmente desde el 19 de agosto del 2025. Contando como JEFE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA A PARTIR DE LA FECHA EL ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ.
- ✓ La valorización N° 05 del mes de setiembre (Del 01 al 30) del año 2025; presenta un avance programado Acumulado de 3.83 %, y se cuenta con una Avance Ejecutado acumulado de 13.58 %, encontrándose la obra ADELANTADA en 9.99%.
- ✓ El monto a cobrar el contratista en la siguiente valorización es de millón ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta con 08/100 soles (S/ 1,104,460.08).
- ✓ Se recomienda a la entidad tramitar dicha valorización dentro de los plazos que lo establece el R.L.C.E.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil OIP N° 19818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.
