1591

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Cajamarca, 10 de agosto de del 2026.

CARTA N° 111-2026-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
Atención:
Ingeniero : MORALES NOVOA, Elías Noel
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

DE : Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SUPERVISOR MC

Presente:
ASUNTO : ALCANZO VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026
REFERENCIA : 1. CARTA N° 112 -2026-JLYV-RC-CVN
2. OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente, y a la vez presentarle la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 14** (de la empresa contratista - **CONSORCIO VIAL DEL NORTE**) correspondiente al mes de agosto (01 al 31) del 2026, en dos originales con su respectivo CD y una copia, tal como se indica a continuación:

ORIGINAL 01	ORIGINAL 02	COPIA 01
Archivador 01(TOMO III/III): 001 a los 500 folios	Archivador 01(TOMO III/III): 001 a los 500 folios	Archivador 01(TOMO III/III): 001 a los 500 folios
Archivador 02 (TOMO II/III): 501 a los 1000 folios	Archivador 02 (TOMO II/III): 501 a los 1000 folios	Archivador 02 (TOMO II/III): 501 a los 1000 folios
Archivador 03 (TOMO I/III): 1001 a los 1591 folios +01 CD	Archivador 03 (TOMO I/III): 1001 a los 1591 folios +01 CD	Archivador 03 (TOMO I/III): 1001 a los 1591 folios

la obra se encuentra con un avance mensual ejecutado del **1.46 %** y un avance ejecutado acumulado del **50.56 %**, el Avance de Obra Programado Acumulado Vigente es de **89.89 %**, lo que significa que la obra está atrasada en **-39.33 %** respecto a lo programado, según Expediente de Valorización de obra N° 14, enviada a su despacho, dicha valorización N° 14 ha sido **revisada por la supervisión**, dicha documentación que forma parte de la misma está en función a lo requerido en las bases y el RLCE, por lo cual la supervisión da **CONFORMIDAD** de la misma, por consiguiente se le hace llegar a usted para su aprobación y trámite correspondiente.
Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.
Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

CC.
Archivo

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

Jefe de Supervisión:

Oscar Berly Cueva Rodriguez

CIP N° 219818

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1589

INFORME N° 047–2026- CSMC/ OBCR /SO

A : ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO SUPERVISOR MC

ATENCIÓN : ING. SANCHEZ RUIZ, MONICA DEL CARMEN
Sub Gerente
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES

DE : ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°14- MES AGOSTO 2026.

REFERENCIA : 1.- CARTA N° 112 -2026-JLYV-RC-CVN
2.- Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS EMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA"- CUI 2384857.

FECHA : Cajamarca, 09 setiembre del 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente y a la vez, visto la carta de la referencia 1 y revisado toda la documentación que forma parte de la misma, hacerle llegar el informe de revisión de la valorización de obra N° 14 de la empresa contratista, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, dicha valorización ha sido revisada por mi persona, por lo cual, como Jefe de Supervisión, doy **CONFORMIDAD** a la misma; la obra "Mejoramiento de la ruta Tramo: Namora - Laguna San Nicolás Empalme PE – 3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca"- CUI 2384857, viene siendo ejecutada por el CONSORCIO VIAL DEL NORTE según CONTRATO DE OBRA N.° 006-2025-GRCAJ-GGR, derivado del proceso de selección A.L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

I. FICHA RESUMEN

1.1. ANTECEDENTES

- Mediante LICITACIÓN PÚBLICA N.° 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA, el Órgano Encargado de las Contrataciones, con fecha 05 de diciembre del 2024, adjudicó la Buena Pro al contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE
- Con fecha 13 de enero del 2025 se firma el Contrato de Obra N.° 006-2025-GRCAJ-GGR entre el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO VIAL DEL NORTE y la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
- Con fecha 28 de enero de 2025, la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA realiza la entrega de terreno a la empresa contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE.
- Con fecha 15 de abril de 2025 se da inicio al plazo de ejecución de obra.
- El 07 de mayo del 2025 se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, que rige a partir del 02 de mayo del 2025.
- El 19 de julio del 2025 se suscribe el Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución, la cual rige a partir del 19 de julio del 2025, fecha de la cual se computa el plazo.
- El día 23 de enero del 2026 se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, por mutuo acuerdo entre la Entidad y el contratista, suspendiendo el plazo a partir del 23 de enero del 2026. Dicha suspensión fue motivada por condiciones climáticas desfavorables que originaron la paralización de los trabajos.
- El día 21 de abril del 2026, la ENTIDAD (Gobierno Regional de Cajamarca) suscribe el Acta de Acuerdos de Levantamiento de la Suspensión de la Obra N°02.
- El nuevo término de plazo contractual es el 22 de septiembre del 2026.
- El 22 de mayo del 2026, se aprobó el adicional de obra N°01, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D231-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 30 de junio del 2026, se aprobó el adicional de obra N°02, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D288-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 21 de julio del 2026, se aprobó el adicional de obra N°03, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D313-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 03 de agosto del 2026, se aprobó el adicional de obra N°04, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D323-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 105 días calendarios. El día 04 de agosto se ha notificado a la supervisión con OFICIO N° D1126-2026-GR.CAJ/SG.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.2. DATOS GENERALES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA EJECUTOR

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
TIPO DE PROCESO	: A L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATO N°	: N°006-2025-GRCAJ-GGR
FECHA DEL CONTRATO	: 13 de enero del 2025

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1597

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A PRECIOS UNITARIOS
UBICACIÓN	
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CAJAMARCA
DISTRITO	: JESÚS - NAMORA
LOCALIDADES	: NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
REPRESENTANTE COMUN	: LIC. JOSE LUIS YOPLA VERGARA
RESIDENTE	: ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	: ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ (DESDE EL 19/08/25)
VALOR REFERENCIAL SIN IGV	: S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL CON IGV	: S/ 32,141,980.18
MONTO DEL CONTRATO, SIN IGV	: S/ 27,102,771.42
MONTO DEL CONTRATO, CON IGV	: S/ 31,981,270.28
FACTOR DE RELACION	: 0.995
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	: Julio-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 360 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 28/01/2025
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 15/04/2025
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 09/04/2026
ADICIONALES DE OBRA	: Si existe - Adicional N°01 aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D231-2026-GR.CAJ/GGR - Adicional N° 02 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D288-2026-GR.CAJ.GGR - Adicional N° 03 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D313-2026-GR.CAJ.GGR - Adicional N° 04 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D323-2026-GR.CAJ/GGR
DEDUCTIVOS DE OBRA	: Si existe
AMPLIACIONES DE PLAZO	: Si existe (Adicional N°04- en trámite)
ATRASO JUSTIFICADO	: No aprobado por la supervisión
PLAZO VIGENTE DE EJECUCIÓN	: 360 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSION DE PLAZO N°01	: INICIO 02/05/2025 FIN 18/07/2025

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1526

FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N°01	: 19/07/2025
FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	: 26/06/2026
SUSPENSION DE PLAZO N°02	: INICIO 23/01/2026 FIN 21/04/2026
NUEVA FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	: 22/09/2026

1.3. CONTROL DE CARTAS FIANZAS

1.3.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO PRINCIPAL	**Monto Inc. IGV:**	S/ 3,198,127.03	**Número de fianza:**	N°3002024037117-3
	Aseguradora:	ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento:	19/11/2026	**Estado Actual:**	Vigente -

1.3.2. CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO

CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO	**Monto Inc. IGV:**	S/ 3,198,127.02	**Número de fianza:**	3002024037118-6
	Aseguradora:	ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento:	05/10/2026	**Estado Actual:**	Vigente

1.3.3. CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES

CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES	**Monto Inc. IGV:**	S/ 3,198,127.02	**Número de fianza:**	3002025042339-3
	Aseguradora:	ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento:	25/09/2026	**Estado Actual:**	Vigente

1.4. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO

AVANCE EJECUTADO DEL MES	0.72%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	50.56%
AVANCE PROGRAMADO DEL MES	24.61%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	89.89%
PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRASO	-39.33%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	56.3%
SITUACIÓN DE LA OBRA	ATRASADA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUE
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR
Oscar Berly Cueva Rodrig
REPRESENTANTE COMÚ

1.5. ASPECTO ECONÓMICO

Valorizaciones tramitadas:	13
Valorizaciones pagadas:	11
Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 Sin IGV:	195,231.76
Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 Con IGV:	230,373.48
Reajuste Sin IGV:	5,856.95
Reajuste Con IGV:	6,911.20
Amortización del adelanto directo Sin IGV:	19,523.18
Amortización del adelanto directo con IGV:	23,037.35

Amortización adelanto materiales Sin IGV:	161,866.19
Amortización adelanto materiales Con IGV:	191,002.10
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Sin IGV:	308.06
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Con IGV:	363.51
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Sin IGV:	-5,406.41
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Con IGV:	-6,379.56
Monto neto a facturar Sin IGV:	24,797.69
Monto neto a facturar Con IGV:	29,261.27

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1.6. LAS METAS EL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1.00
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	KM	19.76
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	mes	8.00
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	TERRAPLENA O RELLENO P/SUBRASANTE		
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49
02.01.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27
02.01.03	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08
02.01.04	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36
02.01.05	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES		
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10
02.02.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76
03	SUB BASE – BASE		
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06
04	PAVIMENTOS		
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)		
04.01.01	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	M2	123,551.70
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56
04.02	VARIOS		
04.02.01	NIVELACIÓN DE TECHO DE BUZONES	und	7.00
04.02.02	REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	und	36.00
04.02.03	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	306.03
04.02.04	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	1,228.87
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
05.01	BADENES		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	877.31
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20
05.01.03	CONCRETO SIMPLE		
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +30% PG	M3	397.03

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78
05.01.03.03	CONCRETO EN EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA f'c=140 kf/cm2	M3	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	591.27
05.02	ALCANTARILLAS		
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76
05.02.01.04	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	2,110.02
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	253.06
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	2,638.35
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	716.34
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68
05.02.03	INSTALACIÓN TMC		
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=60"	m	11.92
05.02.03.04	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31
05.02.03.05	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93
05.02.03.06	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=60"	m	17.89
05.02.04	CONCRETO SIMPLE		
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABEZALES	M3	111.95

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA EMBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50
05.03	MURO DE CONTENCIÓN		
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE	M2	7,686.15
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	7,363.90
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	8,030.45
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	2,572.40
05.03.03	CONCRETO SIMPLE		
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25
05.03.04	CONCRETO ARMADO		
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02
05.03.05	MISCELÁNEO		
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64
05.04	CUNETAS		
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M		
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.04.01.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,110.64

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACIÓN	M2	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACIÓN.	M3	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1"	m	9,348.03
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
06.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		
06.01.01	LÍNEAS CONTINUAS	m	71,437.00
06.01.02	LÍNEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00
06.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00
06.02.05	GUARDAVÍAS METÁLICOS	m	1,265.10
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	GLB	1.00
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		
07.01.06.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GLB	1.00
07.01.06.02	PARTICIPACIÓN DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA		
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES.	GLB	1.00
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTILES	und	10.00
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00
07.04	PLAN DE ABANDONO		
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00
07.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00
08	FLETE		
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

- Con fecha 09 de julio del 2025, el comité de selección adjudico la buena pro del CONCURSO PUBLICO Nº 001-2025-GRCAJ - primera convocatoria, adjudicó la Buena Pro al Contratista CONSORCIO SUPERVISOR MC con domicilio legal En Jr. Cinco Esquinas Nº 1581, Urb. San Luis II etapa - Cajamarca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, con correo electrónico cuevarooscar@hotmail.com, representado por su representante Común el Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez.
- Con fecha 15 de agosto del 2025, se firma el CONTRATO N° 060-2025-GRCAJ-GGR entre el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y CONSORCIO SUPERVISOR MC para la **SUPERVISIÓN** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA R
Ing. Civil - CIP N° 2
JEFE DE SUPERVIS

CONSORCIO S
Oscar Berly C
REPRESEN

- Con fecha 18 de agosto del 2025, se realiza la entrega de terreno por parte de los representantes del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA al CONSORCIO SUPERVISOR MC dando inicio al plazo contractual por parte de la Supervisión con fecha 19/08/2025.
- La nueva fecha de fin del servicio de supervisión es el 10/11/2026 (Supervisión de Ejecución de Obra) y el 10/12/2026 (Incluido recepción y liquidación de supervisión).

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857.
Tipo de Proceso	: CONCURSO PUBLICO 001-2025-GR.CAJ Primera Convocatoria
Contrato N°	: N° 060-2025-GRCAJ - GGR
Fecha suscripción de Contrato	: 15 de agosto del 2025
Sistema de Contratación	: Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada)
Ubicación	: Departamento: Cajamarca Provincia : Cajamarca Distrito : Jesús - Namora Localidades : Palturo, Laguna San Nicolas y Chilacat.
Entidad	: Gobierno Regional de Cajamarca
Contratista	: Consorcio Supervisor MC
Representante Legal	: Oscar Berly Cueva Rodríguez.
Supervisor	: Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez
Monto Referencial	: S/. 1´139,360.38 (inc. IGV) a febrero 2025.
Monto de contrato	: S/. 1´025,424.35 (inc. IGV).
Factor de Relación	: 0.90
Fecha de Presupuesto Base	: febrero-25
Plazo de prestación del servicio	: 390 días calendario. 360 d.c. (supervisión de ejecución de obra) 30 d.c. (recepción de obra y liquidación de supervisión)
Fecha de entrega de cargo	: 18/08/2025
Fecha inicio servicio de supervisión	: 19/08/2025
Fecha fin del servicio de supervisión	: 14/08/2026 (supervisión de ejecución de obra) : 13/09/2026 (incluido recepción y liquidación de supervisión).
Nueva Fecha fin del servicio de supervisión	: 10/11/2026 (supervisión de ejecución de obra) : 10/12/2026 (incluido recepción y liquidación de supervisión).

III. GRÁFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VERSUS EJECUTADO.

✓ ***Comparación del Avance Físico***



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRÍGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1578

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
(15/04/25 - 30/04/25)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/25 - 01/05/25)	MES 02		14,883.94	0.00%	0.05%	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%
(01/06/25 - 30/06/25)		SUSPENSION DE OBRA N°01							
(01/07/25 - 18/07/25)									
(19/07/25 - 31/07/25)	MES 03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%
(01/08/25 - 31/08/25)	MES 04	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/25 - 30/09/25)	MES 05	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/25 - 31/10/25)	MES 06	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%
(01/11/25 - 30/11/25)	MES 07	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%
(01/12/25 - 31/12/25)	MES 08	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%
(01/01/26 - 22/01/26)	MES 09	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%	1,247,453.48	10,628,005.79	4.60%	39.21%
(23/01/26 - 31/01/26)		SUSPENSION DE OBRA N°02							
(01/02/26 - 28/02/26)									
(01/03/26 - 31/03/26)									
(01/04/26 - 20/04/26)									
(21/04/26 - 30/04/26)	MES 10	508,394.39	11,136,400.17	1.88%	41.09%	91,773.11	10,719,778.90	0.34%	39.55%
(01/05/26 - 31/05/26)	MES 11	1,819,683.82	12,956,083.99	6.71%	47.80%	1,558,930.97	12,278,709.87	5.75%	45.30%
(01/06/26 - 30/06/26)	MES 12	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%	833,100.40	13,111,810.27	3.07%	48.38%
(01/07/26 - 31/07/26)	MES 13	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%	395,803.10	13,507,613.37	1.46%	49.84%
(01/08/26 - 31/08/26)	MES 14	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%	195,231.76	13,702,845.13	0.72%	50.56%
(01/09/26 - 22/09/26)	MES 15	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		13,702,845.12		50.56%	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

157

✓ ***Comparación del Avance Financiero***



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PARCIAL %	ACUMUL. %	PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PARCIAL %	ACUMUL. %
(15/04/25 - 30/04/25)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/25 - 01/05/25)	MES 02	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%
(01/06/25 - 30/06/25)	MES 00	SUSPENSION DE OBRA N°01							
(01/07/25 - 18/07/25)	MES 00								
(19/07/25 - 31/07/25)	MES 03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%
(01/08/25 - 31/08/25)	MES 04	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/25 - 30/09/25)	MES 05	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/25 - 31/10/25)	MES 06	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%
(01/11/25 - 30/11/25)	MES 07	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%
(01/12/25 - 31/12/25)	MES 08	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%
(01/01/26 - 22/01/26)	MES 09	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%
(23/01/26 - 31/01/26)		SUSPENSION DE OBRA N°02							
(01/02/26 - 28/02/26)									
(01/03/26 - 31/03/26)									
(01/04/26 - 20/04/26)									
(21/04/26 - 30/04/26)	MES 10	508,394.39	11,136,400.17	1.88%	41.09%	91,773.11	10,719,778.89	0.34%	39.55%
(01/05/26 - 31/05/26)	MES 11	1,819,683.82	12,956,083.99	6.71%	47.80%	1,558,930.97	12,278,709.86	5.75%	45.30%
(01/06/26 - 30/06/26)	MES 12	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%	833,100.40	13,111,810.26	3.07%	48.38%
(01/07/26 - 31/07/26)	MES 13	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%	395,803.10	13,507,613.36	1.46%	49.84%
(01/08/26 - 31/08/26)	MES 14	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%	195,231.76	13,702,845.12	0.72%	50.56%
(01/09/26 - 22/09/26)	MES 15	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		13,702,845.12		50.56%	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1574

IV. INFORMACIÓN DE LA OBRA

4.1. INFORMACIÓN FÍSICO DE LA OBRA

- Con fecha 18 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 003-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita acceso al cuaderno de obra digital.
- Con fecha 22 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 004-2025-OBCR /RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita se haga llegar el Programa de Ejecución de Obra - Calendario de Avance de Obra, Adquisición de Materiales, Utilización de Equipo y Programación PERT-CPM, juntamente con el documento de aprobación de los mismos.
- Con fecha 25 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 005-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°010-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 25 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 006-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°021-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 26 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 007-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento la opinión del inspector de obra sobre la CARTA N°012-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 26 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 008-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía opinión sobre documentos remitidos mediante CARTA N°D461-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL
- Con fecha 27 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 009-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía la contestación a la carta N°004-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 28 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 010-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza evaluación sobre cambio del ingeniero de suelos y pavimentos solicitado por la empresa contratista Consorcio Vial del Norte.
- Con fecha 28 de agosto de 2025, mediante CARTA N° 011-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se informa sobre la participación de personal adicional al acreditado por parte de la empresa contratista.
- Con fecha 04 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 012-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°04 correspondiente al mes de agosto de la contratista (Consorcio Vial del Norte).
- Con fecha 05 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 013-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de supervisión respecto a la valorización N°01 correspondiente al periodo del mes de agosto (19-31 de agosto)
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 014-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita autorización de extracción de material para sub base de la cantera Samaday y Chilacat.
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 015-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite advertencia sobre el conocimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto.
- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 016-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite cumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE - 3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".

- Con fecha 09 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 017-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza levantamiento de observaciones del plan de seguridad y salud ocupacional de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- Con fecha 15 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 018-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía advertencia sobre aspectos identificados en la supervisión ambiental rutinaria.
- Con fecha 17 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 019-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite documentación solicitada mediante oficio N° 000681-2025-CG/OC5336.
- Con fecha 17 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 020-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía resultado de análisis de cantera San José – Llimbe.
- Con fecha 19 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 021-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía contestación a la carta N° D489-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL en relación al informe N° D145-2025-GR.CAJ-GRE-SGE/RIC, sobre cuantificación de volúmenes de mayores metrados de roca suelta y roca fija.
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 022-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía contestación respecto a solicitud de liberación de tendido eléctrico subterráneo en la progresiva 01+210.
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 023-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita gestión urgente del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), para incorporar nuevas áreas auxiliares no contempladas en la DIA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA -REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA-PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 024-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita informe de acciones de prevención y acciones tomadas en campo.
- Con fecha 22 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 025-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía para conocimiento sobre contestación respecto a solicitud de liberación de tendido eléctrico subterráneo en la progresiva 01+210.
- Con fecha 23 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 026-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N° 01 de la supervisión correspondiente al mes de agosto (periodo del 19 al 31) del 2025.
- Con fecha 23 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 027-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía solicitud de cierre inmediato de botadero no autorizado en progresiva 7+600.
- Con fecha 24 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 028-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza observaciones en relación a los informes presentados mediante carta N° 023-2025-AHVR/RO, por falta de sustento técnico de las consultas para absolución de las mismas.
- Con fecha 25 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 029-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza copia de la carta N° 021-2025-OBCR/RC/CONSORCIO SUPERVISOR MC, para conocimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Con fecha 25 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 030-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza copia de la carta N° D547-2025-GR.CAJ-GRI-SGSL para conocimiento.
- Con fecha 29 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 031-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite información de canteras y nuevo almacén.
- Con fecha 29 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 032-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza observaciones a la carta N° 027-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 30 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 033-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía devolución de expediente sobre necesidad de adicional de obra en redes de agua potable.
- Con fecha 30 de septiembre de 2025, mediante CARTA N° 034-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza informe de especialista de suelos y pavimentos de la supervisión.
- Con fecha 01 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 035-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza carta N° D559-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha 01 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 036-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza carta N° D561-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha 03 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 037-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se envía aprobación a solicitud de adelanto de materiales.
- Con fecha 06 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 038-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de setiembre 2025.
- Con fecha 06 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 039-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza la valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de setiembre del 2025 del contratista (Consorcio Vial del Norte).
- Con fecha 06 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 040-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se comunica sobre la necesidad de ejecución de mayores metrados.
- Con fecha 06 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 041-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se comunica consultas sobre la necesidad de adicional de la obra en redes de agua potable.
- Con fecha 08 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 042-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe de hito de control N° 046-2025-OCI/5336-SCC.
- Con fecha 09 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 043-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar el informe de descargo.
- Con fecha 14 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 044-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza descargo al informe de hito de control N° 046-2025-OCCI/5336-SCC.
- Con fecha 14 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 045-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se devuelve el plan de seguridad y salud en el trabajo para perforación y voladura.
- Con fecha 15 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 046-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza la valorización de la supervisión correspondiente al mes de setiembre (Periodo del 01 al 30) del 2025.
- Con fecha 15 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 047-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza documentación solicitada y confirmación de veracidad y autenticidad de documentación presentada para firma de contrato de Concurso Público N° 001-2025-GR.CAJ – Primera Convocatoria.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1571

- Con fecha 15 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 048-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza copia legalizada de contrato.
- Con fecha 20 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 049-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace observaciones sobre la adecuación del eje de la carretera en el tramo KM 14+380 al KM 14+880.
- Con fecha 21 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 050-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar acciones de prevención planteadas por el contratista sobre taludes de torres de alta tensión progresivas 07+860 KM y 08+190 KM.
- Con fecha 21 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 051-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace observaciones al informe N° 040-2025-AHVR/RO, sobre liberación de tramos para mejoramiento de sub rasante.
- Con fecha 23 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 052-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar descargo a la carta N° D609-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha 27 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 053-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace devolución del expediente sobre cambio del ingeniero especialista en estructuras.
- Con fecha 27 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 054-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace observaciones identificadas por el Especialista Ambiental de la supervisión.
- Con fecha 28 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 055-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe con las medidas y controles de seguridad para la utilización del equipo densímetro nuclear.
- Con fecha 29 de octubre de 2025, mediante CARTA N° 056-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe de trabajos ejecutados por parte de la empresa contratista.
- Con fecha 05 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 057-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de octubre 2025.
- Con fecha 05 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 058-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanzó la valorización de obra N° correspondiente al mes de octubre del 2015 del contratista (Consorcio Vial del Norte).
- Con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 059-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar acciones de prevención planteadas por el contratista sobre taludes en progresivas 3+020, 7+220, 8+100 y 10+530.
- Con fecha 06 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 060-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanzó evaluación sobre el cambio de ingeniero especialista en estructuras solicitado por la empresa contratista Consorcio Vial del Norte.
- Con fecha 11 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 061-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza expediente adicional de obra N° 01.
- Con fecha 12 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 062-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanzó valorización N° 03 de la supervisión correspondiente al mes de octubre (Periodo del 01 al 31) del 2025.
- Con fecha 12 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 063-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se da la aceptación de cambio de Personal clave – Ingeniero Especialista en Estructuras.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Con fecha 12 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 064-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe para conocimiento e implementación de recomendaciones.
- Con fecha 18 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 065-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución de expediente de adicional de obra N° 01 para levantamiento de observaciones.
- Con fecha 21 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 066-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe técnico que respalda las consultas del cuaderno de obra formuladas por el contratista.
- Con fecha 21 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 067-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza documentación solicitada y confirmación de veracidad y autenticidad de documentación presentada para firma de contrato del Concurso Público N° 001-2025-GR.CAJ – Primera Convocatoria.
- Con fecha 25 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 068-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la contestación a la carta N° 055-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 26 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 069-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar diseño de cantera para la reutilización del material para basse
- Con fecha 28 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 070-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar solicitud de apoyo de la I.E.N° 82195 Palturo – L.S. NICOLÁS.
- Con fecha 28 de noviembre de 2025, mediante CARTA N° 071-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar el sustento técnico que respalda a las consultas formuladoras por el contratista sobre taludes críticos, en relación al pronunciamiento del proyectista (Consorcio Vial Jesús).
- Con fecha 02 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 072-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza expediente de adicional de obra N° 01, con observaciones corregidas.
- Con fecha 02 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 073-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe respecto a los valores admisibles de reflectometría para las capas de sub rasante, sub base, base granular y bicapa.
- Con fecha 03 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 074-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite documentación solicitada mediante PROVEIDO N° D3752-2025-GR.CAJ-GRI/SGL.
- Con fecha 05 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 075-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N° 07 correspondiente al mes de noviembre del 2025 del contratista (Consorcio Vial del Norte).
- Con fecha 05 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 076-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de noviembre del 2025.
- Con fecha 06 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 077-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza pronunciamiento sobre consultas formuladas mediante CARTA N°053-2025-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha 10 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 078-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización n°04 de la supervisión correspondiente al mes de noviembre (Periodo del 01 al 30) de 2025.
- Con fecha 12 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 079-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe de verificación de geometría y estabilidad de taludes desde la progresiva KM 0+000 hasta km 6+300.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Con fecha 16 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 080-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe acerca de los resultados de combinación de materiales presentados por la residencia y comparados con los datos de supervisión.
- Con fecha 17 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 081-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra de mayores metrados N° 01.
- Con fecha 22 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 082-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe de respuesta de verificación de geometría y estabilidad de taludes desde la progresiva Km 0+000 hasta Km 6+300.
- Con fecha 24 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 083-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra mayores metrados N° 01 con observaciones subsanadas.
- Con fecha 29 de diciembre de 2025, mediante CARTA N° 084-2025-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza carta fianza renovada por adelanto de materiales.
- Con fecha de 06 enero de 2026, mediante CARTA N° 001-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza la Valorización de Obra N° 08 correspondiente al mes de diciembre 2025 del Contratista, Consorcio Vial del Norte.
- • Con fecha de 07 enero de 2026, mediante CARTA N° 002-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe mensual de supervisión correspondiente al mes de diciembre 2025.
- Con fecha de 08 enero de 2026, mediante CARTA N° 003-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza contestación a la CARTA N° 02-2026-CR-AI-GRI/GSRL.
- Con fecha de 12 enero de 2026, mediante CARTA N° 004-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza informe de estudio de Depósitos de material excedente (DME's) y botaderos, planificado de la saturación de áreas afectadas y solicitud de iniciar con su restauración de las áreas afectadas.
- Con fecha de 13 enero de 2026, mediante CARTA N° 005-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza contestación a la CARTA N° 01-2026-GR.AI-GRI/GSRL.
- Con fecha de 14 enero de 2026, mediante CARTA N° 006-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N° 05 de la supervisión correspondiente al mes de diciembre (Periodo del 01 al 31) del 2025.
- Con fecha de 19 enero de 2026, mediante CARTA N° 007-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar respuesta a informe de verificación geométrica y estabilidad de taludes desde la progresiva KM 0+000 hasta KM 6+300.
- Con fecha de 21 enero de 2026, mediante CARTA N° 008-2026-OBC/RRC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe de solicitud de suspensión de plazo de ejecución de obra N° 02 por eventos no atribuibles a las partes.
- Con fecha de 05 febrero de 2026, mediante CARTA N° 009-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza Valorización de obra N°09, correspondiente al mes de enero del 2026 del contratista (Consorcio Vial Del Norte).
- Con fecha de 05 febrero de 2026, mediante CARTA N° 010-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar el Informe de la Supervisión, correspondiente al mes de enero 2026.
- Con fecha de 12 febrero de 2026, mediante CARTA N° 011-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace de conocimiento denuncia contra de la supervisión.
- Con fecha de 12 febrero de 2026, mediante CARTA N° 012-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar Valorización N°06, correspondiente al mes de enero del 2026.

1563

- Con fecha de 05 marzo de 2026, mediante CARTA N° 013-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar el expediente del adicional N°02.
- Con fecha de 05 marzo de 2026, mediante CARTA N° 014-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar expediente del adicional N°03.
- Con fecha de 09 marzo de 2026, mediante CARTA N° 015-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar contestación a la CARTA N°D44-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha de 09 marzo de 2026, mediante CARTA N° 016-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar propuesta de solicitud de informe sobre la construcción del muro de contención de la I.E. Inicial N°786, de la comunidad de Palturo.
- Con fecha de 17 marzo de 2026, mediante CARTA N° 017-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la contestación a la CARTA N°D44-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha de 17 marzo de 2026, mediante CARTA N° 018-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la devolución del expediente de adicional de obra N°03, para su corrección respectiva.
- Con fecha de 20 marzo de 2026, mediante CARTA N° 019-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la contestación a la CARTA N°D63-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL. , relacionado al adicional de obra N°02- Deductivo vinculante N°01.
- Con fecha de 23 marzo de 2026, mediante CARTA N° 020-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la contestación a la CARTA N°D64-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha de 23 marzo de 2026, mediante CARTA N° 021-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace de conocimiento respecto a las condiciones de reinicio de obra en atención al PROVEIDO N°D604-2026-GR.CAJ/SGSL.
- Con fecha de 25 marzo de 2026, mediante CARTA N° 022-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar expediente de adicional de obra N° 03- con observaciones subsanadas.
- Con fecha de 13 abril de 2026, mediante CARTA N° 023-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita el reinicio de obra- levantamiento de la suspensión de plazo urgente.
- Con fecha de 22 abril de 2026, mediante CARTA N° 024-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la contestación a la CARTA N° 020-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la contestación a la CARTA N°D101-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha de 22 abril de 2026, mediante CARTA N° 025-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se da respuesta a la CARTA N°021-2026-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha de 27 abril de 2026, mediante CARTA N° 024-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita hacer llegar la relación y el cronograma de permanencia de personal clave y no clave en obra.
- Con fecha de 27 abril de 2026, mediante CARTA N° 025-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe de verificación de geometría y estabilidad de taludes desde la progresiva KM 06+300 hasta KM 15+880 (tramo principal) y progresiva KM 00+000 hasta KM 02+355 (variante).
- Con fecha de 27 abril de 2026, mediante CARTA N° 026-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita informe de especialista de topografía a la fecha de reinicio de obra.
- Con fecha de 28 abril de 2026, mediante CARTA N° 029-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se da respuesta a la CARTA N°007-2026-JLYV-RC-CVN.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1567

- Con fecha de 28 abril de 2026, mediante CARTA N° 030-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de calendarios de avance de obra actualizados al reinicio de obra.
- Con fecha de 28 abril de 2026, mediante CARTA N° 031-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de adicional de obra N°02.
- Con fecha de 28 abril de 2026, mediante CARTA N° 032-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del adicional de obra N°03.
- Con fecha de 30 abril de 2026, mediante CARTA N° 033-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita informe complementario sobre adicional de obra N° 01 en función al OFICIO N° D248-2026-GR.CAJ/DRAJ Y OFICIO N°D265-2026-GR.CAJ/DRAJ.
- Con fecha de 30 abril de 2026, mediante CARTA N° 034-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita rectificación y complementación en obra de la PARTIDA 01.03.00 TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN.
- Con fecha de 04 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 035-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe de conformidad de Programa de Ejecución de Obra (Calendario Valorizado de Avance de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Utilización de E quipo y Programación PERT-CPM) actualizado al Reinicio de Obra.
- Con fecha de 08 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 036-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°10 correspondiente al mes de abril (del 21 al 30) del 2026 del contratista (consorcio vial del norte).
- Con fecha de 08 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 037-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de abril (del 21 al 30) 2026.
- Con fecha de 12 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 038-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite conformidad a la valorización N°01 de trabajos ejecutados durante la suspensión N°02 de obra (del 23/01/2026 al 20/04/2026) por parte de la empresa contratista.
- Con fecha de 12 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 039-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de la supervisión correspondiente a trabajos verificados durante la suspensión N°02 (del 23/01/2026 al 20/04/2026).
- Con fecha de 12 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 040-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe N°016-2025-OBCR/JS/CONSORCIO SUPERVISOR MC, de sustento de adicional de obra N°01.
- Con fecha de 14 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 041-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar ratificación respecto a la necesidad de ejecutar la prestación de adicional (Adicional de obra N°02).
- Con fecha de 15 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 042-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar ratificación respecto a la necesidad de ejecutar la prestación de adicional (Adicional de obra N°03).
- Con fecha de 15 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 043-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se devuelve expediente de valorización N° 01 – por trabajos ejecutados durante la suspensión de plazo N°02, para levantamiento de observaciones.
- Con fecha de 18 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 044-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar documento de aprobación de cronogramas de obra actualizados al reinicio de obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Con fecha de 18 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 045-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N°07 de la supervisión correspondiente al mes de abril (periodo del 21 al 30) del 2026.
- Con fecha de 20 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 046-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se comunica sobre la necesidad de ejecución de mayores metrados en muros de contención.
- Con fecha de 21 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 047-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente del adicional de obra N°02 con deductivo vinculante N°01.
- Con fecha de 21 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 048-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente del adicional de obra N°03.
- Con fecha de 27 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 049-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar consultas formuladas por el contratista para opinión del proyectista.
- Con fecha de 27 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 050-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace advertencia sobre el cumplimiento de medidas de mitigación ambiental.
- Con fecha de 28 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 051-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza expediente técnico del adicional de obra N°02 con deductivo vinculante N°01.
- Con fecha de 28 de mayo de 2026, mediante CARTA N° 052-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza expediente técnico del adicional de obra N°03.
- Con fecha de 01 de junio de 2026, mediante CARTA N° 053-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar Informe de conformidad de programa de ejecución de obra (Calendario Valorizado de Avance de obra, Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos y Programación PERT-CPM), de la ejecución del Adicional de Obra N°01.
- Con fecha de 01 de junio de 2026, mediante CARTA N° 054-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la remisión de informe y opinión sobre solicitud de ampliación de plazo N°01.
- Con fecha de 02 de junio de 2026, mediante CARTA N° 055-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace notificación nueva dirección de oficina y nueva numero de celular del representante común del Consorcio Supervisor MC.
- Con fecha de 03 de junio de 2026, mediante CARTA N° 056-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°11, correspondiente al mes de mayo del 2026.
- Con fecha de 03 de junio de 2026, mediante CARTA N° 057-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de mayo (del 01 al 31) del 2026.
- Con fecha de 03 de junio de 2026, mediante CARTA N° 058-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe de precisión sobre mayores metrados N°02- muros de contención.
- Con fecha de 05 de junio de 2026, mediante CARTA N° 059-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza descargo al informe de HITO de control N°017-2026-OCI/5336-SCC.
- Con fecha de 06 de junio de 2026, mediante CARTA N° 060-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite conformidad a la valorización N°01 de trabajos de contingencia

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 219818

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

ejecutados durante la suspensión de plazo de ejecución de obra N°02 (del 23/01/2026 al 20/04/2026) por parte de la empresa contratista.

- Con fecha de 09 de junio de 2026, mediante CARTA N° 061-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace contestación al inofrme sobre aplicación de penalidad por incumplimiento de funciones.
- Con fecha de 09 de junio de 2026, mediante CARTA N° 062-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza conformidad a la valorización de la supervisión N°01 de trabajos de contingencia ejecutados durante la suspensión de plazo de ejecución de obra N°02 (del 23/01/2026 al 20/04/2026)
- Con fecha de 09 de junio de 2026, mediante CARTA N° 063-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar la evaluación de combinaciones propuesta para preparar material para la capa base.
- Con fecha de 10 de junio de 2026, mediante CARTA N° 064-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N°08 de la supervisión correspondiente al mes de mayo (periodo del 01 al 31) del 2026.
- Con fecha de 15 de junio de 2026, mediante CARTA N° 065-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe técnico respecto a las consultas formuladas por el contratista.
- Con fecha de 15 de junio de 2026, mediante CARTA N° 066-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe técnico de ratificación respecto a la necesidad de ejecutar una prestación de adicional de obra N°04 y deductivo vinculante N°02 en relación al material que va ser utilizado como base.
- Con fecha de 17 de junio de 2026, mediante CARTA N° 067-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la contestación sobre la reiteración de copia legalizada de constancia.
- Con fecha de 22 de junio de 2026, mediante CARTA N° 068-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se presenta solicitud de aceptación de cambio de especialista en control de calidad de la supervisión.
- Con fecha de 30 de junio de 2026, mediante CARTA N° 069-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza descargo al informe de Hito de control N°023-2026-OCI/5336-SCC.
- Con fecha de 30 de junio de 2026, mediante CARTA N° 070-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita aceptación del camio de especialista en topografía en carreteras, señalización y seguridad vial de la supervisión.
- Con fecha de 02 de julio de 2026, mediante CARTA N° 071-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza expediente técnico del Adicional de Obra N°04 con Deductivo Vinculante N°02.
- Con fecha de 03 de julio de 2026, mediante CARTA N° 072-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se realiza la devolución del informe técnico de propuesta de mayores metrados.
- Con fecha de 03 de julio de 2026, mediante CARTA N° 073-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución de la CARTA N° N°D188-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL.
- Con fecha de 06 de julio de 2026, mediante CARTA N° 074-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza la valorización de obra N°12 correspondiente al mes de julio del 2026.
- Con fecha de 06 de julio de 2026, mediante CARTA N° 075-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza Valorización N°01 del Adicional de Obra N°01.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1564

- Con fecha de 06 de julio de 2026, mediante CARTA N° 076-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de junio (del 01 al 30) del 2026.
- Con fecha de 10 de julio de 2026, mediante CARTA N° 077-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se toma acciones sobre afectaciones descritas en la Carta 001-2026.
- Con fecha de 13 de julio de 2026, mediante CARTA N° 078-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N°09 de la supervisión correspondiente al mes de junio (periodo del 01 al 30) del 2026.
- Con fecha de 15 de julio de 2026, mediante CARTA N° 079-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe de acciones correctivas durante la ejecución de la obra.
- Con fecha de 16 de julio de 2026, mediante CARTA N° 080-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza contestación a la CARTA N° N°D194-2026-GR.CAJ-GRI/SGSL
- Con fecha de 16 de julio de 2026, mediante CARTA N° 081-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite respuesta a notificación reiterada.
- Con fecha de 16 de julio de 2026, mediante CARTA N° 082-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se reitera información técnica de la especialidad de topografía.
- Con fecha de 16 de julio de 2026, mediante CARTA N° 083-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite no conformidad sobre material ingresado a obra.
- Con fecha de 16 de julio de 2026, mediante CARTA N° 084-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace llegar informe técnico respecto a las consultas formuladas por el contratista sobre deductivo de partidas relacionado a muros de contención.
- Con fecha de 17 de julio de 2026, mediante CARTA N° 085-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace devolución del informe técnico sobre consulta técnica relacionada al tratamiento superficial bicapa para corrección o aclaración.
- Con fecha de 24 de julio de 2026, mediante CARTA N° 086-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de junio (del 01 al 30) del 2026, con observaciones subsanadas.
- Con fecha de 24 de julio de 2026, mediante CARTA N° 087-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita tramitación de pago de la valorización de la supervisión correspondiente al periodo de suspensión del plazo de ejecución de obra (del 23/01/2026 al 20/04/2026)
- Con fecha de 24 de julio de 2026, mediante CARTA N° 088-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita se haga llegar información solicitada mediante Informe N° 002-2026-CSMC/JII/ET, relacionado a la especialidad de topografía.
- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 089-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, realiza la contestación a la CARTA N° D213-2026-GR.CAJ/SGSL, sobre la afectación del ancho de calzada del acceso del rellmo sanitario de la MPC.
- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 090-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se comunica sobre la necesidad de ejecución de mayores metrados N°03.
- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 091-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se realiza la devolución de la CARTA N°072-2026-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 092-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita documentos de densidades de campo, ensayos de suelos de calicatas y canteras entre otros de calidad, correspondientes al laboratorio de suelos de la obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1583

- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 093-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita implementar protocolos de calidad y liberación / frecuencia de ensayos en la especialidad de suelos y pavimentos.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 094-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°13, correspondiente al mes de julio del 2026.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 095-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de julio.
- Con fecha de 07 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 096-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe de opinión sobre solicitud de ampliación de plazo N°02.
- Con fecha de 13 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 097-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N°10 de la supervisión, correspondiente al mes de julio del 2026.
- Con fecha de 17 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 098-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se realiza la devolución de la CARTA N°081-2026-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha de 19 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 099-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de la supervisión correspondiente al periodo de suspensión del plazo de ejecución de obra N°02, con observaciones subsanadas.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 100-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de solicitud de ampliación de plano N°04.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 101-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de solicitud de ampliación de plazo N°03.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 102-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita copia de plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial aprobado.
- Con fecha de 25 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 103-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se devuelve expediente de solicitud de ampliación de plazo N°02, para ampliación de pronunciamiento.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 104-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe y opinión sobre sustento de atraso justificado y afectaciones a la ruta crítica por demora de la entidad en la atención de consultas y adicionales.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 105-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe y opinión sobre solicitud de ampliación de plazo N°03.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 106-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe y opinión sobre Solicitud de absolución de consulta técnica y pronunciamiento sobre incompatibilidad en el componente 04.01 tratamiento superficial bicapa (T3S) de 1" y propuesta de especificación técnica.
- Con fecha de 27 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 107-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, devolución de expediente de valorización del adicional de obra n002 con deductivo vinculante N° 01para el levantamiento de observaciones.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

4.2. CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO

MES	VAL. N°	PROGRAMADO (Sin. IGV)			EJECUTADO (Sin. IGV)			% EJEC./ PROG.
		AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO	
(15/04/25 - 30/04/25)	01	14,883.94	14,883.94	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	100.00%
(01/05/25 - 01/05/25)	02	SUSPENSION DE OBRA N°01						
(01/06/25 - 30/06/25)								
(01/07/25 - 18/07/25)								
(19/07/25 - 31/07/25)	03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.40%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.40%	100.00%
(01/08/25 - 31/08/25)	04	1,450,070.18	2,642,203.56	9.75%	1,450,070.18	2,642,203.56	9.75%	100.00%
(01/09/25 - 30/09/25)	05	1,038,388.28	3,680,591.84	13.58%	1,038,388.28	3,680,591.84	13.58%	100.00%
(01/10/25 - 31/10/25)	06	1,355,916.99	5,036,508.83	18.58%	1,355,916.99	5,036,508.83	18.58%	100.0%
(01/11/25 - 30/11/25)	07	2,298,502.63	7,335,011.46	27.06%	2,298,502.63	7,335,011.46	27.06%	100.0%
(01/12/25 - 31/12/25)	08	2,045,540.84	9,380,552.30	34.61%	2,045,540.84	9,380,552.30	34.61%	100.0%
(01/01/26 - 22/01/26)	09	1,247,453.48	10,628,005.78	39.21%	1,247,453.48	10,628,005.78	39.21%	100.0%
(23/01/26 - 31/01/26)		SUSPENSION DE OBRA N°02						
(01/02/26 - 28/02/26)								
(01/03/26 - 31/03/26)								
(01/04/26 - 20/04/26)								
(21/04/26 - 30/04/26)	10	508,394.39	11,136,400.17	41.09%	91,773.11	10,719,778.89	39.55%	96.3%
(01/05/26 - 31/05/26)	11	1,819,683.82	12,956,083.99	47.80%	1,558,930.97	12,278,709.86	45.30%	94.8%
(01/06/26 - 30/06/26)	12	3,371,710.27	16,327,794.26	60.24%	833,100.40	13,111,810.26	48.38%	80.3%
(01/07/26 - 31/07/26)	13	1,366,032.31	17,693,826.57	65.28%	395,803.10	13,507,613.36	49.84%	76.3%
(01/08/26 - 31/08/26)	14	6,668,689.39	24,362,515.96	89.89%	195,231.76	13,702,845.12	50.56%	56.3%
(01/09/26 - 22/09/26)	15	2,740,255.46	27,102,771.42	100.00%				
TOTAL		S/. 27,102,771.42			S/ 13,702,845.12			

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MES

Los trabajos realizados por el contratista en el periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026; se verifican con la participación de los especialistas de supervisión las siguientes partidas:

05. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.02. BADENES
05.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO (M2)

METRADO EJECUTADO: 879.81
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 53.67%

DESCRIPCIÓN
Se procedió con los trabajos del replanteo de la obra, Con el equipo topográfico se demarco con precisión todos los puntos necesarios para la excavación, así mismo todos los elementos de la construcción en forma segura y permanente de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

05.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)

METRADO EJECUTADO: 677.11
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Consiste en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.
La excavación se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de sub-rasante, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel de sub-rasante de acuerdo a los planos de diseño y a las recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos EMS.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

No deberán excavarse con demasiada anticipación a los trabajos motivo del Expediente Técnico. El material proveniente de los cortes deberá ser retirado fuera de la obra para seguridad y limpieza del trabajo, en un plazo máximo de 24 horas. Las operaciones de excavación no deberán iniciarse mientras no se cuente con un Plan de Desvió y Señalización comprobado

05.01.02.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM (M3)

METRADO EJECUTADO: 283.47
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

DESCRIPCIÓN
Se considero el transporte y posterior eliminación del material excedente menor a un kilómetro procedente de los trabajos de la obra, dichos materiales son eliminados a los DME autorizados.

05.01.02.04. CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (M3)

METRADO EJECUTADO: 75.94
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 84.05%

DESCRIPCIÓN
Se realizo la colocación de una capa de base con material de préstamo, el cual fue cernido con un tamiz menor al de 4 cm, y debidamente compactado, este material sirvió como "cama o asiento". El fondo se encuentro a nivel, seco y firme y en todos los conceptos fue aceptable como fundación de la estructura a soportar.

05.01.02.05. PERFILADO Y COMPACTACIÓN (M2)

METRADO EJECUTADO: 764.44
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 47.61%

DESCRIPCIÓN
Este trabajo fue afinado y terminado a mano, poco antes de realizar la subsiguiente partida. Este trabajo se realizó en el área que soportará directa o indirectamente la estructura del pavimento.
Se perfilo y compacto de acuerdo al origen de la zona:

- Como resultado de corte de material suelto.
- Como resultado de corte en roca suelta.
- Como resultado de corte en roca fija.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Se suministro y se usó plantillas que controlaron las dimensiones de este trabajo. En los casos de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al pavimento, se consideró las tolerancias de la subrasante, ajustándose a la cota del perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. Se trabajo Treinta (30) centímetros por debajo de la cota de subrasante el material suelto fue compactado a 95% de la máxima densidad seca.

05.01.03. CONCRETO SIMPLE
05.01.03.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG (M3)

METRADO EJECUTADO: 188.17
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 65.17%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se suministro los diferentes tipos de compuestos de cemento portland Tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparado y construido de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios forma, dimensiones y clases indicadas en los planos.
La clase de concreto que se utilizó se en las estructuras, se realizó de acuerdo a lo indicado en los planos o las especificaciones.

- Concreto Clase G,14MPa (f'c = 140 Kg/cm2)
- Concreto f'c = 175 Kg/cm2 + 30 % P.G.
- Concreto Clase E,17.5MPa (f'c = 175 Kg/ cm2)

Se realizo los trabajos de suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.
El concreto que se utilizó en el proyecto fue premezclado para sus diferentes resistencias a la compresión (f'c) a los 28 días.

05.01.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES (M2)
METRADO EJECUTADO: 186.23
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 45.46%

DESCRIPCIÓN
Se suministro, habilito, y se colocó las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida también incluye el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre.

05.04. CUNETAS
05.04.01. CUNETAS REVESTIDAS E=0.10M
05.04.01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.01.01.01. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)
METRADO EJECUTADO: 76.22
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 1.85%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizó en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluyendo el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.

05.04.01.01.02. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (M3)
METRADO EJECUTADO: 99.09
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 2.41%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se realizo el traslado del material procedente de los cortes del terreno natural y las excavaciones de zanjas al punto de acopio dentro de la

obra para su posterior utilización o eliminación. El acarreo de material se realizó periódicamente, evitando que se acumule y permanezca en obra más de un mes, excepcionalmente cunado el material que se usara en rellenos.

07. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

07.01. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

07.01.01. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 92.00%

DESCRIPCIÓN
Se realizaron los lineamientos generales para realizar la gestión de los residuos sólidos desde su generación, recolección, clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final, considerando los criterios de minimización en el origen y las opciones de reúso y/o reciclaje, según su aplicabilidad.

07.01.02. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 92.00%

DESCRIPCIÓN
Se dio cumplimiento a los límites de emisiones de material particulado, gases y generación de ruido, exigidas por la normatividad ambiental vigente, y establecer las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del aire durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.03. PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 93.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se dio las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del suelo durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.04. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 84.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se dio a conocer el uso adecuado y la importancia del recurso hídrico (agua) y se estableció las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del agua durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.05. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 76.00%

DESCRIPCIÓN
Se estableció los procedimientos adecuados para la protección de los elementos fáunicos que pudieran verse afectados en desarrollo de la obra, garantizando el adecuado manejo de las especies de animales que se detecten dentro del área del proyecto (nidos, neonatos, etc).

07.01.06. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

07.01.06.01. PARTICIPACIÓN CIUDADANA (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

DESCRIPCIÓN
Se realizo las acciones correspondientes para lograr el objetivo de apoyar y fortalecer la gestión participativa de los pobladores y la contratista en materia de construcción de la vía con enfoque territorial, disponiendo de información para la planificación, seguimiento y derivación coordinada de la interacción con los pobladores, comunidades y territorios, donde se garantizó el cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y ciudadanos.

07.01.06.02. PARTICIPACIÓN DE EMPELO LOCAL (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

DESCRIPCIÓN
Se logro diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo a los pobladores de las zonas aledañas, que comprendan la adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias, agua potable y transporte.

07.01.06.03. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 93.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se estableció condiciones para que haya un ambiente cordial entre la población del área de influencia y trabajadores, así como trabajadores y el medio ambiente, todo ello para que no se generen conflictos y que haya una relación directa y organizada en pro del desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente.

07.01.06.04. MONITOREO DE DEUDAS LOCALES (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 77.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se aseguro el cumplimiento de los pagos contraídos durante el periodo de ejecución de la obra por la provisión de alimentos y/o servicios por proveedores locales.

1557

07.02. PLAN DE CONTINGENCIA

07.02.01. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENOMENOS NATURALES (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

DESCRIPCIÓN
Se realizo una planificación ante posibles amenazas por conflictos, violencia y desastres naturales, debido sobre todo a su inherente vulnerabilidad. Mediante una base coordinada y creíble en obra, así mismo se incluyó medidas para la reducción de riesgos.

07.02.04. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 99.00 %

DESCRIPCIÓN
Se cumplieron con todas las exigencias de seguridad y se le proveerá a los trabajadores de todos los equipos de protección personal (EPPs) requeridos para el desarrollo de sus actividades, así como uniformes que los identifiquen.

07.02.05. EQUIPO DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES (UND)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 89.50 %

DESCRIPCIÓN
Se abasteció el campamento con una provisión adecuada de materiales y equipos para el control y limpieza de derrames de productos químicos. manteniendo un stock actualizado de estos equipos y materiales. Se dispone de un plan de prevención de derrames y fugas en la empresa logrando disminuir, o incluso eliminar, el riesgo de materialización de dicho suceso. Para lo cual se identificó factores de riesgo en cada área del proyecto en particular.

07.03. PLAN DE ABANDONO

07.04.02. RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 32.00 %

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se ejecuto el Plan de restauración de áreas deforestadas recuperando las áreas degradadas y apostando por un desarrollo sostenido siguiendo los protocolos de trabajo de las áreas intervenidas por las actividades del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA" debido al emplazamiento de la infraestructura, constituida por los siguientes componentes principales: tajos y depósitos de desmontes, canteras, área de acumulación de suelo orgánico, depósito de desmonte reconstrucción y tormentas, camino de acarreo, talleres, almacenes, oficinas, campamento, comedores y caminos internos.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


1556

Se adjunta hoja de metrados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE	
			ACTUAL METRADO	ACUMULADO METRADO
05.01	BADENES			
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	879.81	1022.96
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	677.11	877.31
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	283.47	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	75.94	105.2
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	764.44	907.59
05.01.03	CONCRETO SIMPLE			
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	188.17	258.75
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	186.23	264.63
05.04	CUNETAS			
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M			
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.04.01.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	76.22	76.22
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	99.09	99.09
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES			
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	0.08	0.92
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	0.08	0.92
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	0.08	0.93
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	GLB	0.08	0.84
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	GLB	0.08	0.76
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES			
07.01.06.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GLB	0.08	0.85
07.01.06.02	PARTICIPACIÓN DE EMPLEO LOCAL	GLB	0.08	0.85
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	0.08	0.93
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	0.08	0.77
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA			
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES.	GLB	0.08	0.85
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	0.08	0.99
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	UND	0.08	7.16
07.04	PLAN DE ABANDONO			
07.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS	GLB	0.08	0.32


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRI
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

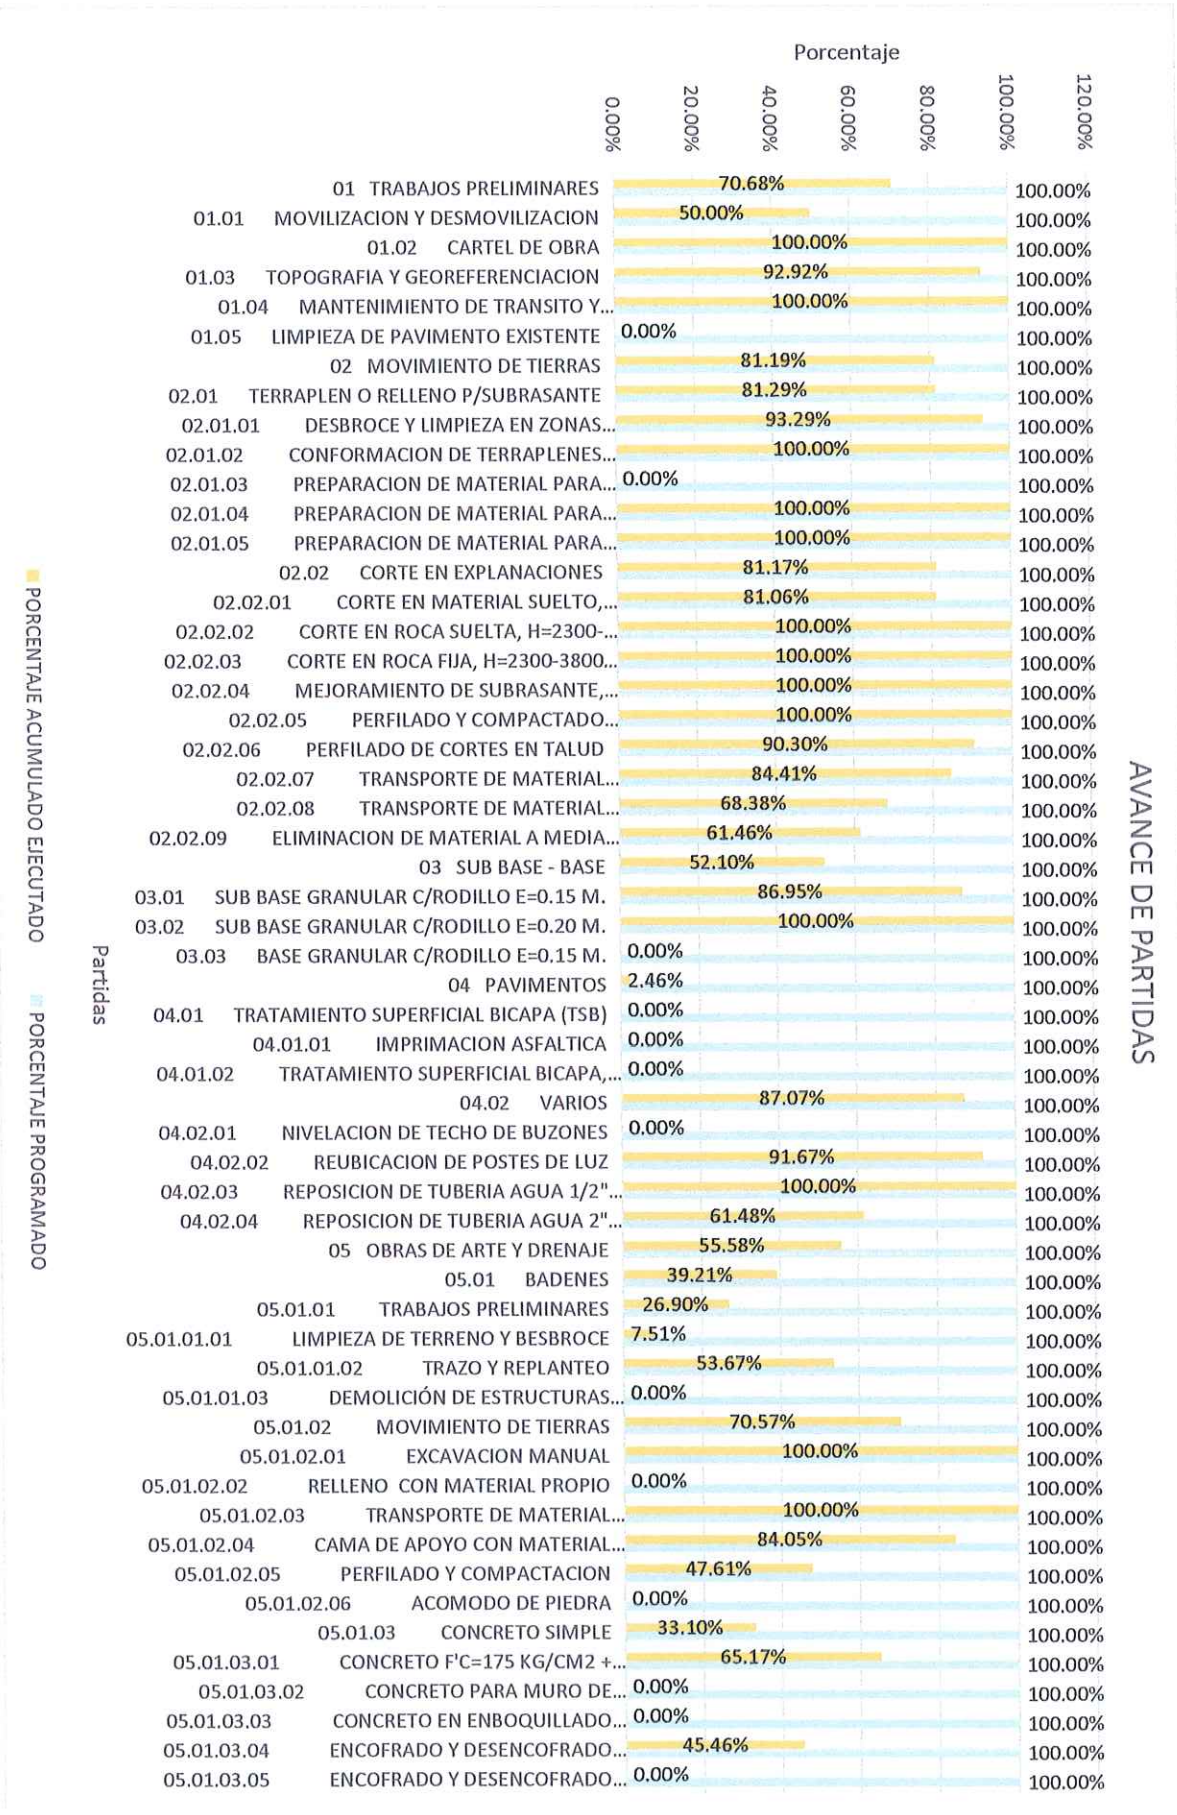


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

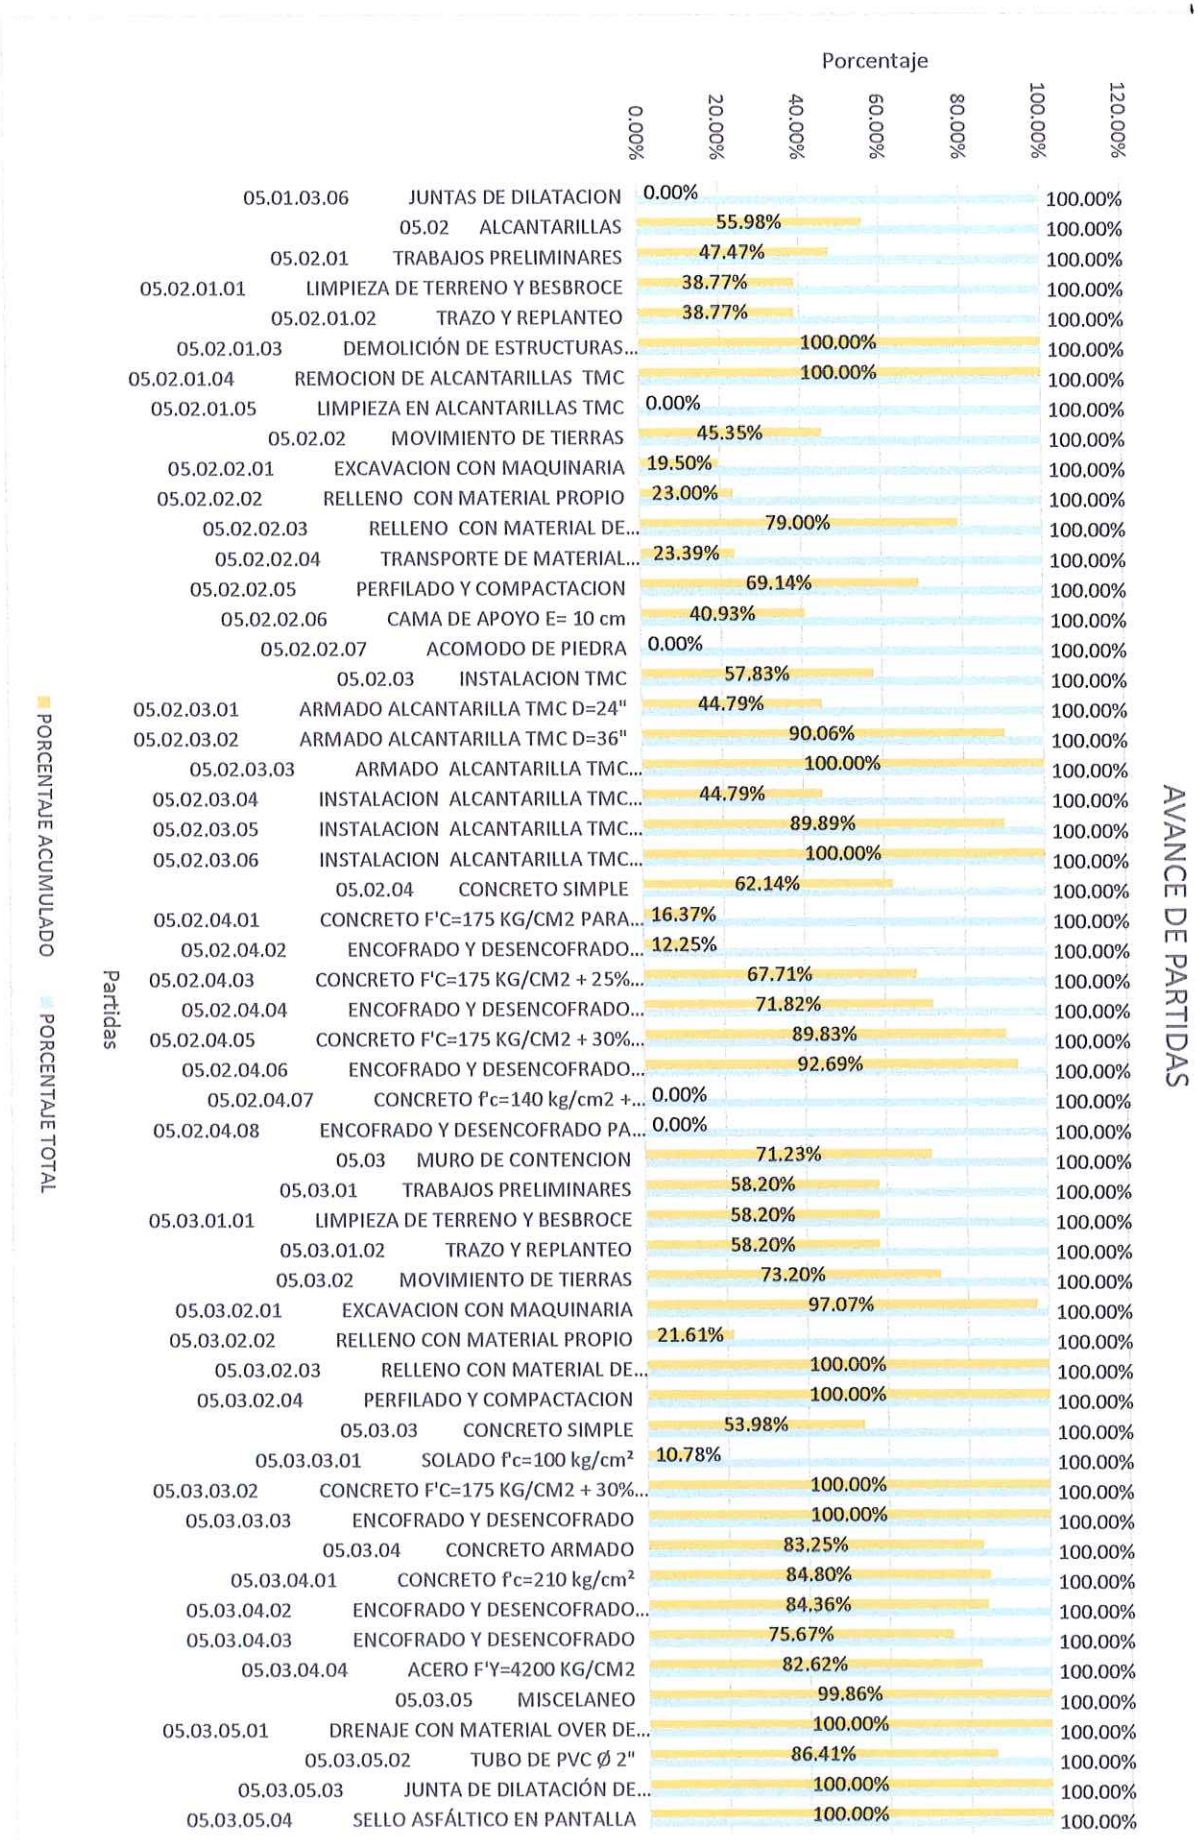

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

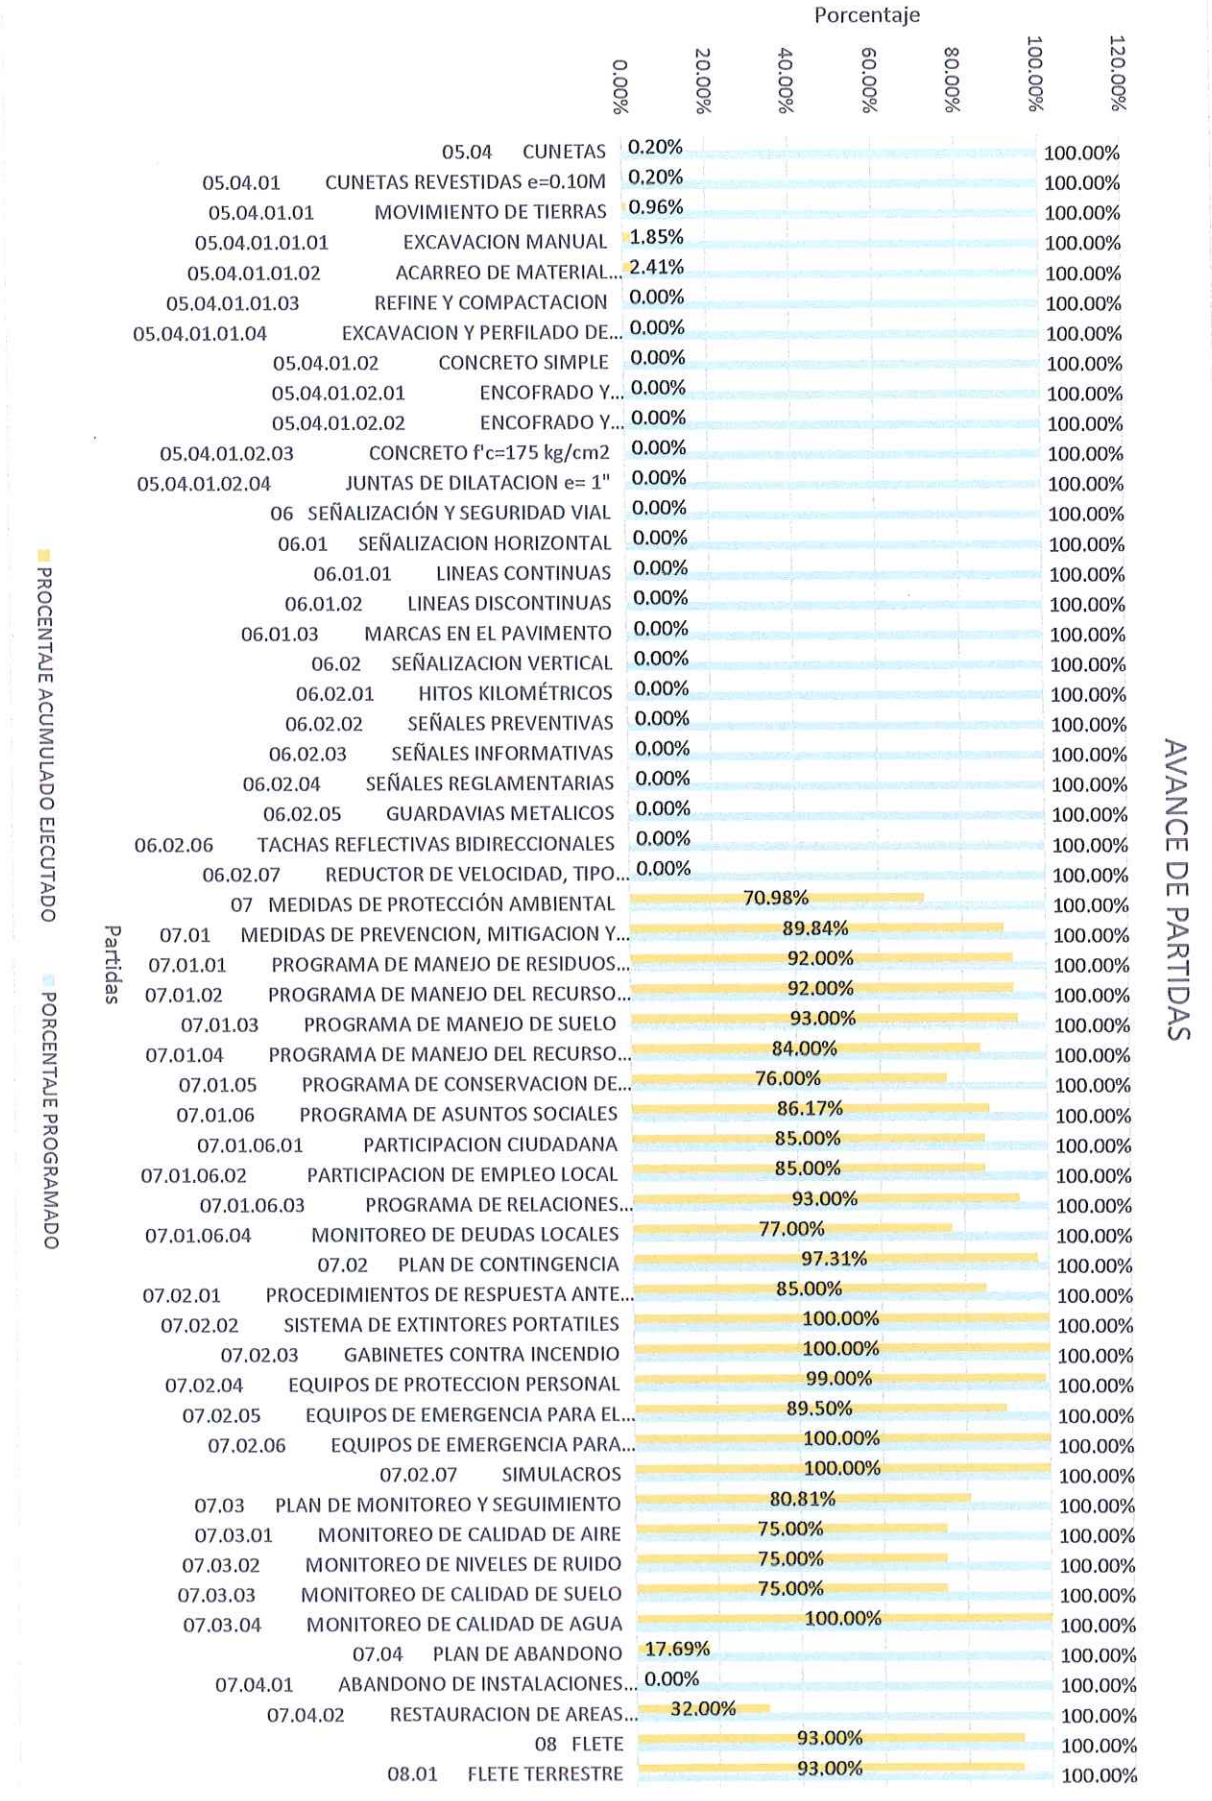

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

4.4. RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN MES DE AGOSTO

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS - EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.		
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO	VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ	FACTOR DE RELACION:	0.99500
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025	MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025	MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025	FECH BASE:	Julio-2024
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025 0	FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026		
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		

DESCRIPCIÓN	MONTO VIGENTE (SIN IGV)	VALORIZACION				SALDO (S/)
		ANTERIOR ACUM. (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	% AVANCE ACUMULADO	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL						
MONTO VALORIZADO SIN IGV	S/ 27,102,771.42	S/ 13,507,613.37	S/ 195,231.76	S/ 13,702,845.13	50.56%	S/ 13,399,926.29
TOTAL	S/ 27,102,771.42	S/ 13,507,613.37	S/ 195,231.76	S/ 13,702,845.13		S/ 13,399,926.29
AVANCE FISICO DE LA OBRA		49.84%	0.72%	50.56%		49.44%
CONTROL DE LINEA BASE						
Monto de Avance físico acumulado			f =	S/ 13,702,845.13		
Monto de avance programado acum.			g=	S/ 24,362,515.96		
Cumplimiento de monto programado (f/g)				56.3%	ATRASADA	
B. REAJUSTES						
Reajuste contrato principal		S/ 19,541.14	S/ 5,856.95	S/ 25,398.09		
TOTAL		S/ 19,541.14	S/ 5,856.95	S/ 25,398.09		
C. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo		-S/ 16,722.43	S/ 308.06	-S/ 16,414.37		
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales		S/ 0.00	-S/ 5,406.41	-S/ 5,406.41		
TOTAL		-S/ 16,722.43	-S/ 5,098.35	-S/ 21,820.78		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A+B-C)		S/ 13,543,876.94	S/ 206,187.06	S/ 13,750,064.00		
D. AMORTIZACIONES						
Amortización de adelanto directo		S/ 1,350,761.33	S/ 19,523.18	S/ 1,370,284.51		
Amortización de adelanto de material		S/ 1,629,074.69	S/ 161,866.19	S/ 1,790,940.88		
TOTAL		S/ 2,979,836.02	S/ 181,389.37	S/ 3,161,225.39		
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB-D)		S/ 10,564,040.92	S/ 24,797.69	S/ 10,588,838.61		
MONTO POR I.G.V. (VN x 18%)		S/ 1,901,527.37	S/ 4,463.58	S/ 1,905,990.95		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		S/ 12,465,568.29	S/ 29,261.27	S/ 12,494,829.56		
TOTAL A FACTURAR PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			S/ 29,261.27			
DESCUENTOS (RETENCIONES, PENALIDADES) INCLUIDO IGV						
RETENCIONES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
PENALIDADES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
MONTO DE PAGOS CON I.G.V.	S/ 0.00	S/ 12,465,568.29	S/ 29,261.27	S/ 12,494,829.56		
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			S/ 29,261.27			

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

V. ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA

5.1. AVANCE ECONÓMICO POR PARTIDA- VALORIZACIÓN MES DE AGOSTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	PRESUPUESTO OFERT.			AVANCE									SALDOS		
						ANTERIOR ACUMULADO			ACTUAL			ACUMULADO					
			METRADO	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARC.	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES				631,351.38	-	446,236.23	70.68%	-				446,236.23	70.68%		185,115.15	29.32%
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00	362,491.23	362,491.23	0.50	181,245.62	50.00%	-			0.5	181,245.62	50.00%	0.50	181,245.61	50.00%
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00	3,514.15	7,028.30	2.00	7,028.30	100.00%	-			2	7,028.30	100.00%			
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	19.76	1,654.33	32,689.56	18.36	30,373.51	92.92%	-			18.36	30,373.51	92.92%	1.40	2,316.05	7.08%
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	8.00	28,448.60	227,588.80	8.00	227,588.80	100.00%	-			8	227,588.80	100.00%			
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86	0.63	1,553.49	-			-						2,465.86	1,553.49	100.00%
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,327,199.85	-	3,514,178.39	81.21%	-	-724.17	-0.02%		3,513,454.22	81.19%		813,745.63	18.81%
02.01	TERRAPLEN O RELLENO P/SUBRASANTE				902,100.74	-	733,344.16	81.29%	-				733,344.16	81.29%		168,756.58	18.71%
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49	4,787.83	7,133.87	1.39	6,655.08	93.29%	-			1.39	6,655.08	93.29%	0.10	478.79	6.71%
02.01.02	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27	10.77	331,805.07	30,808.27	331,805.07	100.00%	-			30808.27	331,805.07	100.00%			
02.01.03	PREPARACION DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08	7.28	168,277.78	-			-						23,115.08	168,277.78	100.00%
02.01.04	PREPARACION DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36	7.28	206,397.90	28,351.36	206,397.90	100.00%	-			28351.36	206,397.90	100.00%			
02.01.05	PREPARACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95	7.28	188,486.12	25,890.95	188,486.11	100.00%	-			25890.95	188,486.11	100.00%		0.01	0.00%
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES				3,425,099.11	-	2,780,834.23	81.19%	-	-724.17	-0.02%		2,780,110.06	81.17%		644,989.05	18.83%
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57	7.33	1,208,765.16	133,746.90	980,364.78	81.10%	-76.22	-558.69	-0.05%	133670.68	979,806.09	81.06%	31,235.89	228,959.07	18.94%
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75	28.79	86,247.64	2,995.75	86,247.64	100.00%	-			2995.75	86,247.64	100.00%			
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15	47.06	75,914.84	1,613.15	75,914.84	100.00%	-			1613.15	75,914.84	100.00%			
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99	34.74	411,251.77	11,837.99	411,251.81	100.00%	-			11837.991	411,251.81	100.00%	0.00	-0.04	0.00%
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70	2.01	248,338.92	123,551.70	248,338.92	100.00%	-			123551.7	248,338.92	100.00%			
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85	3.77	29,793.74	7,135.88	26,902.27	90.30%	-			7135.88	26,902.27	90.30%	766.97	2,891.47	9.70%
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06	1.67	186,009.71	94,115.63	157,173.10	84.50%	-99.09	-165.48	-0.09%	94016.54	157,007.62	84.41%	17,366.52	29,002.09	15.59%
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10	7.21	1,013,467.16	96,122.84	693,045.69	68.38%	-			96122.84	693,045.69	68.38%	44,441.26	320,421.47	31.62%
02.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76	2.77	165,310.17	36,676.96	101,595.18	61.46%	-			36676.96	101,595.18	61.46%	23,001.80	63,714.99	38.54%
03	SUB BASE - BASE				1,723,138.38	-	897,815.98	52.10%	-				897,815.98	52.10%		825,322.40	47.90%
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00	39.76	235,339.44	5,146.40	204,620.86	86.95%	-			5146.4	204,620.86	86.95%	772.60	30,718.58	13.05%
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09	41.35	693,195.12	16,764.09	693,195.12	100.00%	-			16764.09	693,195.12	100.00%			
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06	42.97	794,603.82	-			-						18,492.06	794,603.82	100.00%

04	PAVIMENTOS				3,667,502.35	-	90,331.41	2.46%	-				90,331.41	2.46%		3,577,170.94	97.54%
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)				3,563,754.36	-			-							3,563,754.36	100.00%
04.01.01	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	123,551.70	10.23	1,263,933.89	-			-						123,551.70	1,263,933.89	100.00%
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56	18.25	2,299,820.47	-			-						126,017.56	2,299,820.47	100.00%
04.02	VARIOS				103,747.99	-	90,331.41	87.07%	-				90,331.41	87.07%		13,416.58	12.93%
04.02.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	und	7.00	155.77	1,090.39	-			-						7.00	1,090.39	100.00%
04.02.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	36.00	2,440.89	87,872.04	33.00	80,549.37	91.67%	-			33	80,549.37	91.67%	3.00	7,322.67	8.33%
04.02.03	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	306.03	5.87	1,796.40	306.03	1,796.40	100.00%	-			306.03	1,796.40	100.00%			
04.02.04	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	1,228.87	10.57	12,989.16	755.50	7,985.64	61.48%	-			755.5	7,985.64	61.48%	473.37	5,003.52	38.52%
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				9,843,421.97	-	5,338,364.97	54.23%	-	132,974.97	1.35%		5,471,339.94	55.58%		4,372,082.03	44.42%
05.01	BADENES				481,040.42	-	49,457.73	10.28%	-	139,176.13	28.93%		188,633.86	39.21%		292,406.56	60.79%
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,251.70	-	1,017.80	7.14%	-	2,815.39	19.75%		3,833.19	26.90%		10,418.51	73.10%
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13	3.91	7,452.97	143.15	559.72	7.51%	-			143.15	559.72	7.51%	1,762.98	6,893.25	92.49%
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13	3.20	6,099.62	143.15	458.08	7.51%	879.81	2,815.39	46.16%	1022.96	3,273.47	53.67%	883.17	2,826.15	46.33%
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45	8.69	699.11	-			-						80.45	699.11	100.00%
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				80,843.92	-	13,293.89	16.44%	-	43,757.94	54.13%		57,051.83	70.57%		23,792.09	29.43%
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31	44.73	39,242.08	200.20	8,954.95	22.82%	677.11	30,287.13	77.18%	877.31	39,242.08	100.00%			
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05	26.09	11,976.61	-			-						459.05	11,976.61	100.00%
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543.73	1.67	908.03	260.26	434.63	47.87%	283.47	473.39	52.13%	543.73	908.02	100.00%		0.01	0.00%
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17	97.77	12,237.87	29.26	2,860.75	23.38%	75.94	7,424.65	60.67%	105.2	10,285.40	84.05%	19.97	1,952.47	15.95%
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13	7.29	13,895.69	143.15	1,043.56	7.51%	764.44	5,572.77	40.10%	907.59	6,616.33	47.61%	998.54	7,279.36	52.39%
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20	195.73	2,583.64	-			-						13.20	2,583.64	100.00%
05.01.03	CONCRETO SIMPLE				385,944.80	-	35,146.04	9.11%	-	92,602.80	23.99%		127,748.84	33.10%		258,195.96	66.90%
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397.03	444.42	176,448.07	70.58	31,367.16	17.78%	188.17	83,626.51	47.39%	258.75	114,993.67	65.17%	138.28	61,454.40	34.83%
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78	590.59	51,841.99	-			-						87.78	51,841.99	100.00%
05.01.03.03	CONCRETO EN ENBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA f'c=140 kf/cm2	M3	225.90	502.28	113,465.05	-			-						225.90	113,465.05	100.00%
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16	48.20	28,060.11	78.40	3,778.88	13.47%	186.23	8,976.29	31.99%	264.63	12,755.17	45.46%	317.53	15,304.94	54.54%
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73	62.20	10,370.61	-			-						166.73	10,370.61	100.00%
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACION	m	591.27	9.74	5,758.97	-			-						591.27	5,758.97	100.00%
05.02	ALCANTARILLAS				452,394.75	-	263,110.52	58.16%	-	-9,863.16	-2.18%		253,247.36	55.98%		199,147.39	44.02%
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				12,011.58	-	5,702.56	47.48%	-	-0.08	0.00%		5,702.48	47.47%		6,309.10	52.53%
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96	3.91	5,497.30	545.03	2,131.05	38.77%	-			545.027	2,131.05	38.77%	860.93	3,366.25	61.23%
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96	3.20	4,499.07	545.03	1,744.08	38.77%	-			545.027	1,744.08	38.77%	860.93	2,754.99	61.23%
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76	8.69	849.53	97.76	849.53	100.00%	-			97.76	849.53	100.00%			
05.02.01.04	REMOCION DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68	39.62	977.82	24.68	977.90	100.01%	-0.00	-0.08	-0.01%	24.68	977.82	100.00%			
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00	62.62	187.86	-			-						3.00	187.86	100.00%

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				105,434.23	-	54,161.37	51.37%	-	-6,347.09	-6.02%		47,814.28	45.35%		57,619.95	54.65%
05.02.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	2,110.02	11.06	23,336.82	411.50	4,551.22	19.50%	-			411.5029	4,551.22	19.50%	1,698.52	18,785.60	80.50%
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52	26.09	2,100.77	63.27	1,650.77	78.58%	-44.75	-1,167.53	-55.58%	18.52219	483.24	23.00%	62.00	1,617.53	77.00%
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	253.06	97.47	24,665.76	253.05	24,664.99	100.00%	-53.14	-5,179.56	-21.00%	199.9121016	19,485.43	79.00%	53.15	5,180.33	21.00%
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	2,638.35	1.67	4,406.04	617.21	1,030.74	23.39%	-			617.207617	1,030.74	23.39%	2,021.14	3,375.30	76.61%
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	716.34	7.29	5,222.12	495.28	3,610.62	69.14%	-			495.2833	3,610.62	69.14%	221.06	1,611.50	30.86%
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09	97.77	45,569.62	190.78	18,653.03	40.93%	-			190.7848	18,653.03	40.93%	275.31	26,916.59	59.07%
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68	195.73	133.10	-			-						0.68	133.10	100.00%
05.02.03	INSTALACION TMC				195,024.12	-	116,304.18	59.64%	-	-3,515.99	-1.80%		112,788.19	57.83%		82,235.93	42.17%
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	337.92	104,184.12	138.09	46,663.37	44.79%	-			138.09	46,663.37	44.79%	170.22	57,520.75	55.21%
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	448.05	26,403.59	58.93	26,403.59	100.00%	-5.86	-2,625.57	-9.94%	53.07	23,778.02	90.06%	5.86	2,625.57	9.94%
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=60"	m	11.92	1,109.70	13,227.62	11.92	13,227.62	100.00%	-			11.92	13,227.62	100.00%			
05.02.03.04	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	124.54	38,396.93	138.09	17,197.73	44.79%	-			138.09	17,197.73	44.79%	170.22	21,199.20	55.21%
05.02.03.05	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	149.40	8,804.14	58.93	8,804.15	100.00%	-5.96	-890.42	-10.11%	52.97	7,913.73	89.89%	5.96	890.41	10.11%
05.02.03.06	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=60"	m	17.89	224.02	4,007.72	17.89	4,007.72	100.00%	-			17.89	4,007.72	100.00%			
05.02.04	CONCRETO SIMPLE				139,924.82	-	86,942.41	62.14%	-				86,942.41	62.14%		52,982.41	37.86%
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32	538.43	11,479.33	3.49	1,879.12	16.37%	-			3.49	1,879.12	16.37%	17.83	9,600.21	83.63%
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77	55.20	11,303.30	25.09	1,384.97	12.25%	-			25.09	1,384.97	12.25%	179.68	9,918.33	87.75%
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABEZALES	M3	111.95	554.67	62,095.31	75.80	42,044.85	67.71%	-			75.801568	42,044.85	67.71%	36.15	20,050.46	32.29%
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94	55.20	38,912.69	506.28	27,946.80	71.82%	-			506.2826	27,946.80	71.82%	198.66	10,965.89	28.18%
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99	444.42	7,995.12	16.16	7,181.83	89.83%	-			16.16	7,181.83	89.83%	1.83	813.29	10.17%
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14	62.03	7,018.07	104.87	6,504.84	92.69%	-			104.866	6,504.84	92.69%	8.27	513.23	7.31%
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80	502.28	904.10	-			-						1.80	904.10	100.00%
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA ENBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50	48.20	216.90	-			-						4.50	216.90	100.00%
05.03	MURO DE CONTENCION				7,055,743.24	-	5,025,796.72	71.23%	-				5,025,796.72	71.23%		2,029,946.52	28.77%
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				54,648.53	-	31,806.94	58.20%	-				31,806.94	58.20%		22,841.59	41.80%
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	7,686.15	3.91	30,052.85	4,473.55	17,491.58	58.20%	-			4473.55	17,491.58	58.20%	3,212.60	12,561.27	41.80%
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15	3.20	24,595.68	4,473.55	14,315.36	58.20%	-			4473.55	14,315.36	58.20%	3,212.60	10,280.32	41.80%
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,340,570.93	-	981,345.91	73.20%	-				981,345.91	73.20%		359,225.02	26.80%
05.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	7,363.90	11.06	81,444.73	7,148.05	79,057.13	97.07%	-			7148.045	79,057.13	97.07%	215.86	2,387.60	2.93%
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90	61.82	455,236.30	1,591.70	98,398.90	21.61%	-			1591.7	98,398.90	21.61%	5,772.20	356,837.40	78.39%
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8,030.45	97.77	785,137.10	8,030.45	785,137.10	100.00%	-			8030.45	785,137.10	100.00%			
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	2,572.40	7.29	18,752.80	2,572.40	18,752.78	100.00%	-			2572.4	18,752.78	100.00%		0.02	0.00%
05.03.03	CONCRETO SIMPLE				2,523,501.01	-	1,362,088.67	53.98%	-				1,362,088.67	53.98%		1,161,412.34	46.02%
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80	473.58	1,301,776.70	296.39	140,364.38	10.78%	-			296.39	140,364.38	10.78%	2,452.41	1,161,412.32	89.22%
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16	537.54	1,002,060.57	1,864.16	1,002,060.56	100.00%	-			1864.16	1,002,060.56	100.00%		0.01	0.00%
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25	62.03	219,663.74	3,541.25	219,663.73	100.00%	-			3541.25	219,663.73	100.00%		0.01	0.00%
05.03.04	CONCRETO ARMADO				2,902,908.73	-	2,416,762.68	83.25%	-				2,416,762.68	83.25%		486,146.05	16.75%
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74	646.78	1,326,377.62	1,738.94	1,124,711.60	84.80%	-			1738.94	1,124,711.60	84.80%	311.80	201,666.02	15.20%
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80	95.05	205,764.24	1,826.29	173,588.86	84.36%	-			1826.29	173,588.86	84.36%	338.51	32,175.38	15.64%
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05	62.03	202,841.20	2,474.38	153,485.79	75.67%	-			2474.38	153,485.79	75.67%	795.67	49,355.41	24.33%
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02	5.64	1,167,925.67	171,095.11	964,976.43	82.63%	-			171095.113	964,976.43	82.63%	35,982.91	202,949.24	17.38%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

05.03.05	MISCELANEO				234,114.04	-	233,792.52	99.86%	-				233,792.52	99.86%		321.52	0.14%
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73	184.48	173,545.87	940.73	173,545.13	100.00%	-			940.726	173,545.13	100.00%	0.00	0.74	0.00%
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59	5.42	2,360.90	376.41	2,040.13	86.41%	-			376.41	2,040.13	86.41%	59.18	320.77	13.59%
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36	13.96	13,462.47	964.36	13,462.47	100.00%	-			964.36	13,462.47	100.00%			
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64	25.78	44,744.80	1,735.64	44,744.79	100.00%	-			1735.64	44,744.79	100.00%		0.01	0.00%
05.04	CUNETAS				1,854,243.56	-			-	3,662.00	0.20%		3,662.00	0.20%		1,850,581.56	99.80%
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M				1,854,243.56	-			-	3,662.00	0.20%		3,662.00	0.20%		1,850,581.56	99.80%
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				381,155.79	-			-	3,662.00	0.96%		3,662.00	0.96%		377,493.79	99.04%
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	44.73	183,868.93	-			76.22	3,409.32	1.85%	76.22	3,409.32	1.85%	4,034.42	180,459.61	98.15%
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64	2.55	10,482.13	-			99.09	252.68	2.41%	99.09	252.68	2.41%	4,011.55	10,229.45	97.59%
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACION	M2	24,890.36	7.29	181,450.72	-			-						24,890.36	181,450.72	100.00%
05.04.01.01.04	EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACION.	M3	85.50	62.62	5,354.01	-			-						85.50	5,354.01	100.00%
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE				1,473,087.77	-			-							1,473,087.77	100.00%
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09	33.09	27,467.68	-			-						830.09	27,467.68	100.00%
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92	55.03	229,580.76	-			-						4,171.92	229,580.76	100.00%
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45	527.31	1,124,989.52	-									2,133.45	1,124,989.52	100.00%
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION e= 1"	m	9,348.03	9.74	91,049.81	-									9,348.03	91,049.81	100.00%
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				936,424.50	-										936,424.50	100.00%
06.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				408,010.09	-										408,010.09	100.00%
06.01.01	LINEAS CONTINUAS	m	71,437.00	5.41	386,474.17	-									71,437.00	386,474.17	100.00%
06.01.02	LINEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00	11.27	20,962.20	-									1,860.00	20,962.20	100.00%
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00	13.66	573.72	-									42.00	573.72	100.00%
06.02	SEÑALIZACION VERTICAL				528,414.41	-										528,414.41	100.00%
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00	193.09	3,668.71	-									19.00	3,668.71	100.00%
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00	476.10	61,893.00	-									130.00	61,893.00	100.00%
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00	736.27	33,132.15	-									45.00	33,132.15	100.00%
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00	850.03	57,802.04	-									68.00	57,802.04	100.00%
06.02.05	GUARDAVIAS METALICOS	m	1,265.10	213.54	270,149.45	-									1,265.10	270,149.45	100.00%
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00	14.41	71,502.42	-									4,962.00	71,502.42	100.00%
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00	3,783.33	30,266.64	-									8.00	30,266.64	100.00%
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL				468,607.83	-	306,445.98	65.39%	-	26,172.10	5.59%		332,618.08	70.98%		135,989.75	29.02%
07.01	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES				143,099.80	-	117,118.93	81.84%	-	11,447.98	8.00%		128,566.91	89.84%		14,532.89	10.16%
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00	45,760.00	45,760.00	0.84	38,438.40	84.00%	0.08	3,660.80	8.00%	0.92	42,099.20	92.00%	0.08	3,660.80	8.00%
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00	30,186.38	30,186.38	0.84	25,356.56	84.00%	0.08	2,414.91	8.00%	0.92	27,771.47	92.00%	0.08	2,414.91	8.00%
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00	21,000.00	21,000.00	0.85	17,850.00	85.00%	0.08	1,680.00	8.00%	0.93	19,530.00	93.00%	0.07	1,470.00	7.00%
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	GLB	1.00	11,000.00	11,000.00	0.76	8,360.00	76.00%	0.08	880.00	8.00%	0.84	9,240.00	84.00%	0.16	1,760.00	16.00%
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00	3,600.00	3,600.00	0.68	2,448.00	68.00%	0.08	288.00	8.00%	0.76	2,736.00	76.00%	0.24	864.00	24.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Betly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
INGENIERO CIVIL - CIP N° 219818
Ing. OSCAR BETLY CUEVA RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISION

1543

07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES				31,553.42	-	24,665.97	78.17%	-	2,524.27	8.00%		27,190.24	86.17%		4,363.18	13.83%
07.01.06.01	PARTICIPACION CIUDADANA	GLB	1.00	7,430.00	7,430.00	0.77	5,721.10	77.00%	0.08	594.40	8.00%	0.85	6,315.50	85.00%	0.15	1,114.50	15.00%
07.01.06.02	PARTICIPACION DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00	9,500.00	9,500.00	0.77	7,315.00	77.00%	0.08	760.00	8.00%	0.85	8,075.00	85.00%	0.15	1,425.00	15.00%
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00	9,623.42	9,623.42	0.85	8,179.87	85.00%	0.08	769.87	8.00%	0.93	8,949.74	93.00%	0.07	673.68	7.00%
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	0.69	3,450.00	69.00%	0.08	400.00	8.00%	0.77	3,850.00	77.00%	0.23	1,150.00	23.00%
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA				130,747.11	-	118,149.17	90.36%	-	9,077.72	6.94%		127,226.89	97.31%		3,520.22	2.69%
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENOMENOS NATURALES.	GLB	1.00	12,000.00	12,000.00	0.77	9,240.00	77.00%	0.08	960.00	8.00%	0.85	10,200.00	85.00%	0.15	1,800.00	15.00%
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTATILES	und	10.00	153.56	1,535.60	10.00	1,535.60	100.00%	-			10	1,535.60	100.00%			
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00	1,340.00	1,340.00	1.00	1,340.00	100.00%	-			1	1,340.00	100.00%			
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	100,621.51	100,621.51	0.91	91,565.57	91.00%	0.08	8,049.72	8.00%	0.99	99,615.29	99.00%	0.01	1,006.22	1.00%
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00	850.00	6,800.00	7.08	6,018.00	88.50%	0.08	68.00	1.00%	7.16	6,086.00	89.50%	0.84	714.00	10.50%
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00	1,250.00	1,250.00	1.00	1,250.00	100.00%	-			1	1,250.00	100.00%			
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00	1,200.00	7,200.00	6.00	7,200.00	100.00%	-			6	7,200.00	100.00%			
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				67,120.92	-	54,238.68	80.81%	-				54,238.68	80.81%		12,882.24	19.19%
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00	1,226.79	29,442.96	18.00	22,082.22	75.00%	-			18	22,082.22	75.00%	6.00	7,360.74	25.00%
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00	879.58	10,554.96	9.00	7,916.22	75.00%	-			9	7,916.22	75.00%	3.00	2,638.74	25.00%
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00	1,441.38	11,531.04	6.00	8,648.28	75.00%	-			6	8,648.28	75.00%	2.00	2,882.76	25.00%
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00	1,732.44	15,591.96	9.00	15,591.96	100.00%	-			9	15,591.96	100.00%			
07.04	PLAN DE ABANDONO				127,640.00	-	16,939.20	13.27%	-	5,646.40	4.42%		22,585.60	17.69%		105,054.40	82.31%
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00	57,060.00	57,060.00	-			-						1.00	57,060.00	100.00%
07.04.02	RESTAURACION DE AREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00	70,580.00	70,580.00	0.24	16,939.20	24.00%	0.08	5,646.40	8.00%	0.32	22,585.60	32.00%	0.68	47,994.40	68.00%
08	FLETE				395,187.54	-	367,524.40	93.00%	-				367,524.40	93.00%		27,663.14	7.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1547

5.2. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA MES DE AGOSTO DEL 2026

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°14

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:	28/01/2025
FECHA DE INICIO:	15/04/2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026
FECHA DE TÉRMINO:	22/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	360 DÍAS CALENDARIO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
FACTOR DE RELACION:	0.99500
MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECH BASE:	Julio-2024

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%
COSTO DIRECTO	**21,992,833.80**	**S/ 10,960,897.36**	**49.84%**	**S/ 158,422.90**	**0.72%**	**S/ 11,119,320.26**	**50.56%**	**S/ 10,873,513.54**	**49.44%**
TRABAJOS PRELIMINARES	631,351.38	S/ 446,236.23	70.68%	S/ 0.00	0.00%	S/ 446,236.23	70.68%	S/ 185,115.15	29.32%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,327,199.85	S/ 3,514,178.39	81.21%	-S/ 724.17	-0.02%	S/ 3,513,454.22	81.19%	S/ 813,745.63	18.81%
SUB BASE - BASE	1,723,138.38	S/ 897,815.98	52.10%	S/ 0.00	0.00%	S/ 897,815.98	52.10%	S/ 825,322.40	47.90%
PAVIMENTOS	3,667,502.35	S/ 90,331.41	2.46%	S/ 0.00	0.00%	S/ 90,331.41	2.46%	S/ 3,577,170.94	97.54%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	9,843,421.97	S/ 5,338,364.97	54.23%	S/ 132,974.97	1.35%	S/ 5,471,339.94	55.58%	S/ 4,372,082.03	44.42%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	936,424.50	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 936,424.50	100.00%
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	468,607.83	S/ 306,445.98	65.39%	S/ 26,172.10	5.59%	S/ 332,618.08	70.98%	S/ 135,989.75	29.02%
FLETE	395,187.54	S/ 367,524.40	93.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 367,524.40	93.00%	S/ 27,663.14	7.00%
TOTAL COSTO DIRECTO (CD)	**21,992,833.80**	**10,960,897.36**		**158,422.90**		**S/ 11,119,320.26**		**10,873,513.54**	
GASTOS GENERALES (16.853826631473%)	3,706,634.08	1,847,330.65		26,700.32		S/ 1,874,030.97		S/ 1,832,603.11	
UTILIDAD(6.38073087907352%)	1,403,303.54	699,385.36	**49.84%**	10,108.54	**0.72%**	S/ 709,493.90	**50.56%**	S/ 693,809.64	**49.44%**
SUBTOTAL	**27,102,771.42**	**13,507,613.37**		**S/ 195,231.76**		**S/ 13,702,845.13**		**S/ 13,399,926.29**	
IGV(18%)	4,878,498.86	2,431,370.41		S/ 35,141.72		S/ 2,466,512.13		S/ 2,411,986.73	
TOTAL INCLUIDO IGV	**31,981,270.28**	**15,938,983.78**		**S/ 230,373.48**		**S/ 16,169,357.26**		**S/ 15,811,913.02**	

1546

5.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA

SITUACIÓN DE LA OBRA (CONDICIÓN DE ATRASO O ADELANTO)

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

I SITUACIÓN DE LA OBRA			
1	AVANCE EJECUTADO DEL MES	:	0.72%
2	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	:	50.56%
3	AVANCE PROGRAMADO DEL MES	:	24.61%
4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	:	89.89%
5	PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRAZO	:	-39.33%
6	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	:	56.3%
7	SITUACIÓN DE LA OBRA	:	ATRASADA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

VI. UTILIZACIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

6.2. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO

Se cuenta con la presencia de todo el personal técnico propuesto según bases integradas de la obra según el siguiente cuadro:

PERSONAL CLAVE

CARGO:	APELLIDOS Y NOMBRES:
Ingeniero Residente de Obra	Vásquez Regalado Alex Hildebrando
Ingeniero especialista en Estructuras	Corcuera Céspedes, María Kathia
Ingeniero de Control de Calidad	Marín Gutiérrez Andy Michel
Ingeniero de Suelos y Pavimentos	Deysi M. Vásquez Balcázar

PERSONAL NO CLAVE

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES
Ingeniero Ambiental	Valdivia Perales Nilton Iban
Técnico en seguridad y prevención de riesgos	Cieza Curayluca Diego Jhonatan
Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño Vial)	Bardales Vásquez Yover
Especialista Hidrología y Obras de arte	Abanto Plasencia Cristian Amau
Ingeniero Asistente	Cabrera Gonzales Franco Vicmark

6.2. PERSONAL OBRERO

Se cuenta con la presencia de personal en obra según el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD
Capataz	1
Maestro de Obras	1
Topógrafo	1
Asistente de topógrafo	2
Ayudante de Topógrafo	2
Operadores	13
Operadores de Maquinaria Pesada	12
Puntero de Excavadora	2
Cuadrador	2
Gasfitero	1
Oficiales	2
Peones	16
Vigías	3
Guardianes	6
Cocinero	1
Jefe de Almacén	1

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

6.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS

Se cuenta con las siguientes Maquinarias y Equipos pesados en obra que se detalla en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS	CANTIDAD
Rodillo Liso Vibr.	2
Camioneta Doble tracción	2
Camión Cisterna	2
Camión Baranda	1
Retroexcavadora	2
Excavadora	3
Motoniveladora	2
Camión Volquete 15 m3	9
Cargador frontal	1

6.4. MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIANO

Se cuenta con las siguientes Maquinarias y Equipos livianos en obra que se detalla en el siguiente cuadro:

MAQUINARIA Y EQUIPOS LIVIANOS	CANTIDAD
GNSS	3
Estación Total	2
Mezcladora de concreto	1

Motobomba	1
Motosierra	1
Saltarín Compactador	2
Grupo Electrógeno	2
Sierra circular	1
Vibrador de Concreto	2
Zaranda	1
Nivel Topográfico	2

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

VII. DOCUMENTOS TRAMITADOS DURANTE EL MES

- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 089-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, realiza la contestación a la CARTA N° D213-2026-GR.CAJ/SGSL, sobre la afectación del ancho de calzada del acceso del relleno sanitario de la MPC.
- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 090-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se comunica sobre la necesidad de ejecución de mayores metrados N°03.
- Con fecha de 04 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 091-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se realiza la devolución de la CARTA N°072-2026-JLYV-RC-CVN.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 092-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita documentos de densidades de campo, ensayos de suelos de calicatas y canteras entre otros de calidad, correspondientes al laboratorio de suelos de la obra.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 093-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita implementar protocolos de calidad y liberación / frecuencia de ensayos en la especialidad de suelos y pavimentos.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 094-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de obra N°13, correspondiente al mes de julio del 2026.
- Con fecha de 06 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 095-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe mensual de la supervisión correspondiente al mes de julio.
- Con fecha de 07 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 096-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe de opinión sobre solicitud de ampliación de plazo N°02.
- Con fecha de 13 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 097-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización N°10 de la supervisión, correspondiente al mes de julio del 2026.
- Con fecha de 17 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 098-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se realiza la devolución de la CARTA N°081-2026-JLYV-RC-CVN.

- Con fecha de 19 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 099-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se alcanza valorización de la supervisión correspondiente al periodo de suspensión del plazo de ejecución de obra N°02, con observaciones subsanadas.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 100-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de solicitud de ampliación de plano N°04.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 101-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se hace la devolución del expediente de solicitud de ampliación de plazo N°03.
- Con fecha de 21 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 102-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se solicita copia de plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial aprobado.
- Con fecha de 25 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 103-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se devuelve expediente de solicitud de ampliación de plazo N°02, para ampliación de pronunciamiento.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 104-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite el informe y opinión sobre sustento de atraso justificado y afectaciones a la ruta crítica por demora de la entidad en la atención de consultas y adicionales.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 105-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe y opinión sobre solicitud de ampliación de plazo N°03.
- Con fecha de 26 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 106-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, se remite informe y opinión sobre Solicitud de absolución de consulta técnica y pronunciamiento sobre incompatibilidad en el componente 04.01 tratamiento superficial bicapa (T3S) de 1" y propuesta de especificación técnica.
- Con fecha de 27 de agosto de 2026, mediante CARTA N° 107-2026-OBCR/RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, devolución de expediente de valorización del adicional de obra n002 con deductivo vinculante N° 01para el levantamiento de observaciones.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1541

VIII. PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

- **ORGANIGRAMA**

En el cuadro siguiente se indica el personal clave que se encuentra en obra.

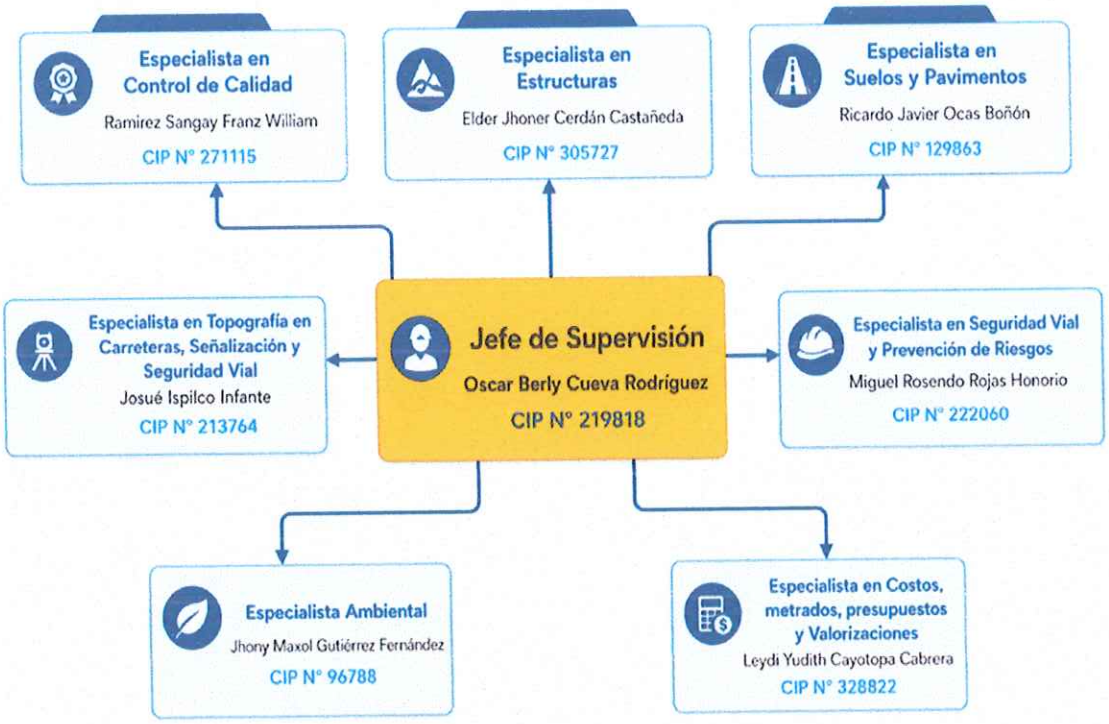

- **PERSONAL PROFESIONAL-TÉCNICO EN OBRA**

N°	CARGO	NOMBRE	CIP N°
1	Jefe de Supervisión	Oscar Berly Cueva Rodríguez	219818
2	Especialista en Estructuras	Elder Jhoner Cerdán Castañeda	305727
3	Especialista en Control de Calidad	Ramirez Sangay Franz William	271115
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Ricardo Javier Ocas Boñón	129863
5	Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial	Josué Ispilco Infante	213764
6	Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	Miguel Rosendo Rojas Honorio	222060
7	Especialista Ambiental	Jhony Maxol Gutiérrez Fernández	96788
8	Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	Leydi Yudith Cayotopa Cabrera	328822

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

IX. PENALIDADES

Penalidades según contrato:

CONTRATO N°006 - 2025 – GRCAJ – GGR.

L.P. 011-2024-GRCAJ primera convocatoria.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS-EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857; que celebran de una parte: el GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351, Urb. La Alameda, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, representado por la Gerente General Regional Doctora Rocío Elizabeth Portal Vásquez, identificada con DNI Nº 26693922, designada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº D330-2024-GR.CAJ/GR, de fecha 13 de septiembre del 2024 y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº D000367-2023-GR.CAJ/GR, de fecha 03 de agosto de 2023, modificada por la Resolución Ejecutiva Regional N° D549-2023-GR.CAJ/GR de fecha 11 de diciembre del año 2023, se delega a la Gerencia General Regional la atribución para suscribir contratos conforme a Ley, en adelante LA ENTIDAD; y de otra parte: CONSORCIO VIAL DEL NORTE, integrado por: Consultora & Constructora UBR E.I.R.L., con RUC N° 20491552981 (50% de participación) y Geoandina Inversiones & Obras S.R.L., con RUC N° 20570698304 (50% de participación); Operador Tributario: Geoandina Inversiones & Obras S.R.L., con RUC N° 20570698304; representante común del Consorcio señor Ulises Bobadilla Romero, identificado con DNI N° 26958927; domicilio para efectos de notificación durante la ejecución contractual en Avenida Luis Rebaza Neyra N° 670, Urb. Villa Universitaria, distrito, provincia y departamento de Cajamarca; correo electrónico para notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo: info@ubr.com.pe, teléfono de contacto: 990014600, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Ulises Bobadilla Romero
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Dónde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan ocurrir en obra por razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se aplicará las penalidades mostradas en la tabla N°08 – Otras Penalidades, la Fórmula de cálculo de estas penalidades están en función de Unidades Impositivas Tributarias U.I.T (vigente al año fiscal en el que se realiza la convocatoria) o el

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

	será.		
11	PERSONAL STAFF EN OBRA Cuando alguno de los profesionales propuestos por el contratista (que no sea el residente de obra) que componen el equipo de ingeniería en obra tanto el	0.5 x U.I.T. por cada día de ausencia del personal en obra.	Según Informe del Supervisor de Obra

N°	PENALIDADES A APLICAR POR	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
	personal clave y personal de apoyo señalado en los gastos generales (Ingenieros Asistentes de Residente, Ingenieros Especialistas, Ingenieros de Seguridad en Obra, Ingenieros de Control de Calidad, etc.) no se encuentre en forma permanente en la obra, la multa diaria será: **Nota:** La presencia en obra del personal con participación parcial se coordinará con la supervisión de obra, para ello el contratista presentará un histograma mensual del personal, así mismo, la participación de los especialistas puede variar a solicitud de la Entidad y/o Supervisión, respetando el porcentaje de participación.		

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La supervisión en cumplimiento de sus funciones hace mención que la empresa contratista ha incurrido en la siguiente penalidad:

Personal STAFF en obra no se ha encontrado en obra según su cronograma programado por la empresa contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE, relacionado al Ingeniero Aimé Karolina Salazar Regalado - Especialista en Señalización y Seguridad Vial, revisando su cronograma presentado adjunto a su informe N°002-2026-CVDN/IESYSV/AKSC, en dicho cronograma es que su permanencia en obra en el mes de julio es de 13 días, en el mes de agosto es de 25 días, y lo cual no ha cumplido con dicho cronograma, su asistencia registrada por la supervisión de dicho profesional en el mes de julio es de 1 día (17/07/2026) y en el mes de agosto es de 1 día (19/08/2026), por lo cual los días que no ha asistido a obra son:

Mes de Julio: 12 días

Mes de Agosto: 24 días

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Total de días de Inasistencia: 36 días

Penalidad según estipulado en la clausula Decima quinta del contrato N°006-2025-GRCAJ-GGR. L.P. 011-2024-GRCAJ primera convocatoria es de 0.5 XU.I.T, entonces la penalidad será de: **36 x 0.5 x 5,500.00= 99,000.00** (son noventa y nueve mil con 00/100 soles).

Por el monto valorizado y el monto neto a cobrar en esta valorización es imposible que se haga efectivo el deductivo del monto de dicha penalidad, por lo cual la supervisión solicita que se haga el deductivo en la liquidación final de la obra o del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

X. CONCLUSIONES

- El inicio de obra comienza el día 15 de abril del 2025, con término de actividades contractuales el día 26 de junio del 2026, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios según Expediente Técnico (Cronograma de ejecución de Obra).
- El CONSORCIO SUPERVISOR MC, a cargo de la supervisión de obra, ha iniciado su función formalmente desde el 19 de agosto del 2025. Contando como JEFE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA a partir de la fecha el Ing. OSCAR BERLY CUEVA RODRÍGUEZ.
- Con fecha 21 de abril del 2026 se suscribe el Acta de Reinicio de Obra N.° 02, que rige a partir del 21 de abril del 2026.
- La valorización N° 14 del mes de agosto (Del 01 al 31) del año 2026; presenta un avance programado Acumulado de 89.89 %, y se cuenta con una Avance Ejecutado acumulado de 50.56 %, encontrándose la obra ATASADA en -39.33 %. La supervisión mediante cuaderno de obra N°758 y N°821, ha solicitado el nuevo cronograma de obra acelerado. En la actual valorización nuevamente el avance acumulado ejecutado está por debajo del 80% respecto del avance programado acumulado. A la fecha la supervisión no ha podido verificar el avance acumulado ejecutado al mes de agosto respecto al cronograma acelerado solicitado debido a que la empresa contratista no ha hecho llegar dicho cronograma.

SITUACIÓN DE LA OBRA (CONDICIÓN DE ATRASO O ADELANTO)

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

I SITUACIÓN DE LA OBRA

1	AVANCE EJECUTADO DEL MES	:	0.72%
2	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	:	50.56%
3	AVANCE PROGRAMADO DEL MES	:	24.61%
4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	:	89.89%
5	PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRAZO	:	-39.33%
6	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	:	56.3%
7	SITUACIÓN DE LA OBRA	:	**ATRASADA**

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Se realizó el deductivo por adelanto de materiales en CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 CON CEMENTO T-I correspondiente al deductivo de concreto en muros cuyo monto asciende a S/23,012.69. El saldo de S/. 403,656.79 se considerará en la próxima valorización.

- Se realiza el deductivo por adelanto de materiales en ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 valorizado que corresponde a S/ 138,866.19. Siendo amortizado en su totalidad.
- El total amortizado para la valorización N°14, correspondiente al mes de agosto es de: S/ 161,866.19.
- El pago a favor del contratista incluido IGV correspondiente a la Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 es S/. 29,261.27 (Veintinueve mil doscientos sesenta y uno con 27/100 soles).
- La penalidad según estipulado en la cláusula Decima quinta del contrato N°006-2025-GRCAJ-GGR. L.P. 011-2024-GRCAJ primera convocatoria es de 0.5 X U.I.T, entonces la penalidad será de: **36 x 0.5 x 5,500.00= 99,000.00** (son noventa y nueve mil con 00/100 soles).

XI. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda a la Entidad tramitar dicha valorización dentro de los plazos que lo establece el R.L.C.E.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1535

ANEXOS:

- INFORME N° 002-2026-CVDN/IESYSV/AKSC

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO VIAL DEL NORTE

536-C

INFORME N°002-2026-CVDN/IESYSV/AKSC 1534

A	:	Ing. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO **Residente de Obra**
DE	:	Ing. AIME KAROLINA SALAZAR CARRASCO **Ingeniero Especialista en Señalización y Seguridad Vial**
ASUNTO	:	INFORME DE VALORIZACIÓN N.º 14 **PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026**
REFERENCIA:		CONTRATO Nº006-2025-GRCAJ-GGR; CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.
FECHA	:	Namora, 31 de agosto del 2026

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA
REPRESENTANTE COMÚN

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez hacer llegar el **Informe Mensual N°02**, correspondiente al Ingeniero Especialista en Señalización y Seguridad Vial, comprendido entre el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE PEREZ INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213784
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

Atentamente,

Ing. Alex Vasquez Regalado
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 136162
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

Ing. Aime Karolina Salazar Carrasco
Ingeniero Especialista en Señalización y Seguridad Vial
CIP. 282879
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

José Luis Yopla Vergara
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

- CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO VIAL DEL NORTE

1532

XVI. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN:

CRONOGRAMA DE PROFESIONAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Ing.Aime Karolina Salazar Carrasco

abr-25	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
may-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jun-25		SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01																												
jul-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ago-25	SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 01																													
sept-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
oct-25																														
nov-25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
dic-25																														
ene-26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
feb-26																							SUSPENSION DE PLAZO DE								
mar-26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
abr-26	EJECUCION N° 02																						SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02								
may-26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
jun-26																														
jul-26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ago-26	SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02																													
sept-26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									

✓ Asistencia | ✗ No Asistencia | Suspensión de obra

N° de días Totales: 60
N° de Meses Totales: 2 MESES

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N°43241123

Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Karolina Salazar Carrasco
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
CIP: [illegible]
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

Ing. Alex Vasquez Regalado
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 136162
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

José Luis Yopla Vergara
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO VIAL DEL NORTE

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ESPINOZA INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

- ASISTENCIA DEL MES DE JULIO-EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA	01 / 07 / 2026		
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

1530

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		02 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 210816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1529

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		03 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aimé Karolina	Especialista en Señalización y Seguridad Vial.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1529

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		04 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		06 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		07 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1525

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		08 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m	
10	Salazar Carrasco Anne Karolina	Especialista en señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

157

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		09 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		10 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10.	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 7[illegible]
JEFE DE SUPERVISIÓN

1572

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		11 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Arnauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISION

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		13 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10.	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1520

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		14 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodríguez
Ing. CIP N° 299818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1519

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		15 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		16 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1517

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		17 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y Seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		18 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		20 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalizacion y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43471123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil / CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1514

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN — **FECHA** 21 / 07 / 2026

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
	PERSONAL CLAVE					
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
	PERSONAL NO CLAVE					
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		22 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
ING. CIVIL - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1512

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN — **FECHA** 23 / 07 / 2026

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
	PERSONAL CLAVE					
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
	PERSONAL NO CLAVE					
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 218618
JEFE DE SUPERVISIÓN

1511

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJECUCIÓN			FECHA		24 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y Seguridad Vial.				

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 199816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1510

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		25 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.	—	1:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.	-	1:00 p.m.	-
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 119116
JEFE DE SUPERVISIÓN

1579

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		27 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Civil - CIP N° 219316
JEFE DE SUPERVISIÓN

1508

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		30 / 07 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219811
JEFE DE SUPERVISIÓN

1507

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		31 / 07 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Especialista en señalización y seguridad vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
CIP N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 211111
JEFE DE SUPERVISOR

1596

- ASISTENCIA DEL MES DE AGOSTO-EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		01 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP Nº 219618
JEFE DE SUPERVISIÓN

1574

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		03 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
CIVIL - CIP N° 219615
JEFE DE SUPERVISION

1573

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		04 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N 298818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1502

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		05 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

1501

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		06 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP N° 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

1500

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		07 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		08 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219116
JEFE DE SUPERVISIÓN

1498

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJECUCIÓN — **FECHA**: 10 / 08 / 2026

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

1497

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJECUCIÓN			FECHA		11 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 278816
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

1496

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJECUCIÓN			FECHA		12 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP N° 219015
JEFE DE SUPERVISIÓN

1495

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		13 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP Nº 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		14 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISION

1493

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		15 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Arnauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1432

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		17 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.	NO ASISTIO	5:00 p.m.	NO ASISTIO

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1491

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		18 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.	NO ASISTIO	5:00 p.m.	NO ASISTIO

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil / CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1490

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		19 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Arnauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISION

1489

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		20 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.	—	5:00 p.m.	—
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.	— NO ASISTIO	5:00 p.m.	— NO ASISTIO

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE(A) SUPERVISIÓN

1488

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJECUCIÓN			FECHA		21 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.	NO ASISTIÓ	5:00 p.m.	NO ASISTIÓ

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1487

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		22 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. OSCAR Berly Cueva Rodriguez
Ing. CIVIL - CIP N° 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1480

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		24 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219816
JEFE DE SUPERVISIÓN

1485

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		25 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219814
JEFE DE SUPERVISIÓN

1881

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		26 / 08 / 2026	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
CIP Nº 219010
JEFE DE SUPERVISIÓN

1483

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA	27 / 08 / 2026		
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219018
JEFE DE SUPERVISIÓN

1482

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN — **FECHA**: 28 / 08 / 2026

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	INGRESO		SALIDA	
			HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Oscar Berly Cueva Rodriguez
CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1481

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		29 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1480

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA EJCUCIÓN			FECHA		31 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
		PERSONAL CLAVE				
1	Vásquez Regalado Alex Hildelbrando	Ingeniero Residente de Obra	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
2	Corcuera Céspedes María Kathia	Ingeniero especialista en Estructuras	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
3	Marin Gutierrez Andy Michel	Ingeniero de Control de Calidad	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
4	Vásquez Balcázar Deysi Magali	Ingeniero de Suelos y Pavimentos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
		PERSONAL NO CLAVE				
5	Valdivia Perales Niton Iban	Ingeniero Ambiental	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
6	Cieza Caruajulca Diego Jhordan	Técnico en seguridad y prevención de riesgos	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
7	Ramos Correa William Adelmo	Topógrafo Especialista en Carreteras (Trazo y Diseño)	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
8	Albanto Plasencia Cristian Amauri	Especialista Hidráulico Hidrología y Obras de arte.	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
9	Cabrera Gonzales Franco Vicmark	Ingeniero Asistente	7:30 a.m.		5:00 p.m.	
10	Salazar Carrasco Aime Karolina	Ingeniero de Señalización y Seguridad Vial	7:30 a.m.		5:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1479

ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

ASISTENCIA DIARIA DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN			FECHA		21 / 08 / 2026	
			INGRESO		SALIDA	
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO/ESPECIALISTA	HORA	FIRMA	HORA	FIRMA
PERSONAL CLAVE						
1	Cueva Rodríguez Oscar Berly	Jefe de Supervisión	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
2	Cerdán Castañeda Elder Jhoner	Especialista en Estructuras	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
4	Ramírez Sangay Franz William	Especialista en Control de Calidad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
5	Ocas Boñón Ricardo Javier	Especialista en Suelos y Pavimentos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
6	Ispilco Infante Josué	Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
7	Rojas Honorio Miguel Rosendo	Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
8	Gutiérrez Fernández Jhony Maxol	Especialista Ambiental	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
9	Cayotopa Cabrera Leydi Yudith	Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones	7:00 a.m.		1:00 p.m.	
PERSONAL NO CLAVE						
10	Idrogo Saldaña Ronald Iván	Operador Cad	7:00 a.m.		1:00 p.m.	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1479

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0234857

Certificado de Habilidad

1477

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): CUEVA RODRIGUEZ OSCAR BERLY

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 219818 Fecha de Incorporación: 08/11/2018

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA , 16 de ABRIL del 2026

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
Consejera Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Especialista en Estructuras:

Elder Jhoner Cerdán Castañeda

CIP N° 305727

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

1475

Cajamarca, 08 de septiembre del 2026.

CARTA N°019-2026-EJCC/E. E

A : Ing. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
JEFE DE SUPERVISIÒN DE OBRA

DE : Ing. ELDER JHONER CERDÀN CASTAÑEDA
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS – CONSORCIO SUPERVISOR MC

ASUNTO : INFORME DE CONFORMIDAD DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2026 – VALORIZACIÒN DE OBRA N°14.

REFERENCIA : **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" CON CUI N.° 2384857**

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y mediante la presente el Informe de conformidad de las partidas valorizadas correspondiente al mes de agosto del 2026 – INFORME N°018-2026 – EJCC/E.E, correspondiente a las actividades realizadas del 01 al 31 de agosto de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" CON CUI N.° 2384857,** dicho informe se está presentando en cumplimiento al contrato de la supervisión de obra.

Es todo cuanto hago de conocimiento, para los fines correspondientes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

C.C
Archivo

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" 147

INFORME N°019

AGOSTO -2026

OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" CON CUI N.° 2384857.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Timemark
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP N° 305727

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

I. ANTECEDENTES.

- Con fecha 09 de julio de 2025, el comité de selección adjudico la buena pro concurso público N° 001-2025-GR.CAJ – primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolas- Empalme PE -3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca"

- El 18 de agosto del 2025 se diò el Inicio oficial del plazo contractual

II. OBJETIVO.

El objetivo del Proyecto es el "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" y de esta manera mejorar las condiciones de transitabilidad que incrementarán el comercio, turismo y el grado de desarrollo de la zona. El presente informe tiene como finalidad detallar las actividades en la especialidad de Estructuras en campo durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026 y dar la conformidad , enfocándose en la ejecución de las obras de arte a lo largo de la carretera.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

III. NORMAS TÉCNICAS

- Contrato N°006-2025-GRCAJ-GGR
- Expediente técnico de la obra "Mejoramiento de la ruta tramo: Namora – Laguna San Nicolás – empalme PE – 3N, - distrito de Jesús – provincia de Cajamarca – región Cajamarca, distrito de Namora – provincia de Cajamarca – región Cajamarca" cui 2384857.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Directivas del OSCE
- Ley N° 2744. Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG – 2013.
- Manual de Seguridad Vial.
- Manual de Ensayos de Materiales.
- Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
- Manual de Diseño Geométrico DG – 2018.
- Manual de Mantenimiento y Conservación Vial.
- Manual de inventarios Viales.
- Manual de Carreteras: Suelos Geología, Geotecnia y Pavimentos.
- Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje.
- Reglamento Nacional de Gestión de infraestructura Vial
- ACI - American Concrete Institute
- AASHTO - American Association of State Highway and Transport Officials

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONES CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

IV. DESCRIPCIÓN Y METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

El proyecto en el componente de estructuras comprende las siguientes metas. Muro de contención:

ITEM	COMPONENTES	UND	META FISICA
05.03	MURO DE CONTENCION		
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	7,686.15
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	7,363.90
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8,030.45
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	2,572.40
05.03.03	CONCRETO SIMPLE		
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25
05.03.04	CONCRETO ARMADO		
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02
05.03.05	MISCELANEO		
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ALDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil - CIP N° 205727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Badenes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
05.01.00	BADENES		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE	M2	1906.13
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1906.13
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1906.13
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20
05.01.03.	CONCRETO SIMPLE		
05.01.03.01	CONCRETO f'c=175 kf/cm2+30%PG	M3	397.03
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78
05.01.03.03	CONCRETO EN ENBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA f'c=140 kf/cm2	M3	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73
05.01.03.06	JUNTA DE DILATACIÓN	M	591.27

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil - CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

Cunetas:

ITEM	COMPONENTES	UND	META FISICA
05.04	CUNETAS		
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M		
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACION	M2	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACION.	M3	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION e= 1"	m	9,348.03

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

V. DETALLE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS COMPONENTE DE ESTRUCTURAS.

1.- OBRA PRINCIPAL.

05.00.00 OBRAS DE ARTE

05.01.00 BADENES.

TRAMO PRINCIPAL.
4+846.5 - 4+859.5
5+256 - 5+276
11+969 - 11+985
12+468 - 12+480.95
12+560 - 12+580
12+795 - 12+808
TRAMO VARIANTE.
0+478 - 0+491
1+271 - 1+284
1+477 - 1+490

➢ **Partidas Ejecutadas Respecto a Badenes.**

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE			
BADENES			
TRABAJOS PRELIMINARES			
TRAZO Y REPLANTEO	M2	1.906,13	879,81
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
EXCAVACION MANUAL	M3	877,31	677,11
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543,73	283,47
CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125,17	75,94
PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1.906,13	764,44
CONCRETO SIMPLE			
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397,03	188,17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582,16	186,23

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil - CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

05.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

- **05.01.01.01 Limpieza de Terreno y Desbroce:**

  Se ejecutaron las labores de remoción de capa vegetal, maleza y material orgánico en el área destinada a la ubicación de los badenes, garantizando una superficie de trabajo limpia para la delimitación topográfica.

- **05.01.01.02 Trazo y Replanteo:**

  Se realizó la transferencia de los planos al terreno mediante equipos topográficos, fijando ejes, niveles, pendientes y alineamientos definitivos para el correcto encauzamiento del flujo de agua.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

- **05.01.02.01 Excavación Manual:**

  Se efectuaron las excavaciones hasta alcanzar las cotas de cimentación y dimensiones geométricas indicadas en los planos de detalle, adaptando el perfil de la zanja con uñas y losas del badén.

- **05.01.02.03 Transporte de Material Excedente a Botadero D<= 1.80 km:**

  Se realizó el cargado y acarreo del material no apto producto de la excavación hacia el botadero autorizado ubicado a un radio menor o igual a 1.80 km, manteniendo limpia la zona de trabajo.

- **05.01.02.04 Cama de Apoyo con Material de Préstamo:**

  Se colocó y niveló una capa de material seleccionado (préstamo) para conformar una base uniforme de apoyo que garantice la estabilidad estructural de la losa de concreto.

- **05.01.02.05 Perfilado y Compactación:**

  Se ejecutaron los trabajos de perfilado de la rasante del badén y la compactación mecánica de la subrasante/cama de apoyo, asegurando la densidad óptima para prevenir asentamientos diferenciales.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. CERDAN CASTAÑEDA
Especialista en Estructuras

05.01.02 CONCRETO SIMPLE

- **05.01.03.01 Concreto f'c = 175 kg/cm^2 + 30% P.G.:**

  Se procedió con el vaciado del concreto ciclópeo de resistencia especificada f'c = 175 kg/cm^2, incorporando hasta un 30% de piedra grande (P.G.) según las especificaciones técnicas. Se garantizaron las labores de vibrado, acabado de la superficie y curado correspondiente.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

- **05.01.03.04 Encofrado y Desencofrado de Badenes:**

  Se habilitaron e instalaron los encofrados metálicos/de madera para dar forma a los sardineles, uñas y losa del badén, asegurando la alineación y verticalidad. Tras cumplirse los tiempos de fraguado especificados, se procedió al desencofrado cuidadoso de las estructuras.

05.04.00 CUNETAS

05.04.01 CUNETAS REVESTIDAS e = 0.10 m

05.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.01.01.01 Excavación Manual

Esta partida corresponde al movimiento de tierras inicial para la apertura de la sección de las cunetas revestidas. Registra un metrado ejecutado de 76.22 M3, lo cual sustenta las labores de corte manual del terreno necesarias para dar la forma de diseño a las cunetas.

05.04.01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D< 1 KM

Esta partida contempla la eliminación y el traslado del material proveniente de las excavaciones manuales hacia los botaderos o zonas de acopio autorizadas dentro de una distancia menor o igual a un kilómetro. Registra un volumen acumulado de 99.09 m3.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- **Partidas Ejecutadas respecto a cunetas.**

CUNETAS			
CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M			
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
EXCAVACION MANUAL	M3	4.110,64	76,22
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4.110,64	99,09

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil - CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

XIX. CONCLUSIONES

Con respecto a los trabajos realizados durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, se concluye lo siguiente:

- **Cumplimiento de Trabajos Programados en Badenes:** Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2026, se ejecutaron las actividades correspondientes a la partida de **Badenes (05.01.00)** en las progresivas establecidas del Tramo Principal (km 4+846.5–4+859.5, 5+256–5+276, 11+969–11+985, 12+468–12+481, 12+460–12+480.95, 12+795–12+808) y Tramo Variante (km 0+478–0+491, 1+271–1+284, 1+477–1+490).
- **Ejecución Técnica y Control de Proceso:** Se completaron conforme a los planos y especificaciones técnicas los trabajos correspondientes a:
  - **Trabajos Preliminares y Movimiento de Tierras:** Limpieza de terreno, desbroce, trazo, replanteo topográfico, excavación manual, colocación de cama de apoyo con material de préstamo, así como el perfilado y compactación de subrasante/cama de apoyo.
  - **Manejo de Material Excedente:** Se realizó el cargado, acarreo y eliminación del material no apto hacia los botaderos autorizados dentro del radio estipulado (D <= 1.80km).
  - **Estructuras de Concreto:** Se ejecutó la instalación de encofrados metálicos/de madera asegurando niveles, alineamiento y pendientes. Asimismo, se realizó el vaciado de concreto ciclópeo f'c = 175kg/cm^2 + 30%P.G. garantizando los procesos de vibrado, acabado, curado y desencofrado oportuno.
  - Se concluye que, durante el periodo evaluado del mes de agosto de 2026, los trabajos correspondientes al sistema de drenaje longitudinal en la partida **05.04.00 CUNETAS** se concentraron netamente en la fase de **Movimiento de Tierras**, registrando un avance físico real de **76.22 m³** en excavación manual y **99.09 m³** en eliminación de material excedente. Esto evidencia que el frente se encuentra técnicamente liberado a nivel de subrasante, dejando las secciones preparadas para iniciar las actividades secuenciales de refine, compactación y el posterior revestimiento con concreto simple programado para los periodos siguientes.
  - Por lo tanto, se da conformidad respecto al cumplimiento de dichas partidas reportados en su informe.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

PANEL FOTOGRÀFICO.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONEX CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil - CIP N° 305727
Especialista en Estructuras



FOTOGRAFÌA N.º 01.- Trabajo de Trazo, Nivelación trazo y replanteo de badenes.

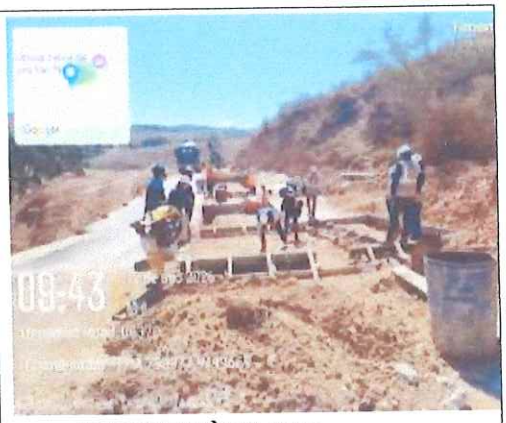

FOTOGRAFÌA N.º 02.- Encofrado de badén.




FOTOGRAFÌA N.º 03.- Trabajo de Densidades de Campo, para determinar el grado de Compactación.



FOTOGRAFÌA N.º 04.- Trabajos de vaciado de concreto f'c 175 kg/cm2 + 30% PG en badén.




FOTOGRAFÌA N.º 05.- Realizando la prueba de Slump.

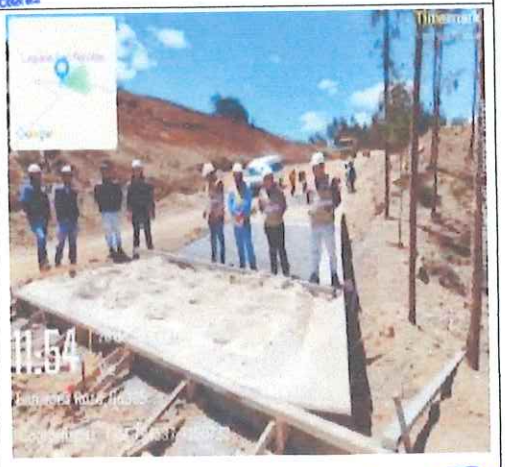

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodríguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

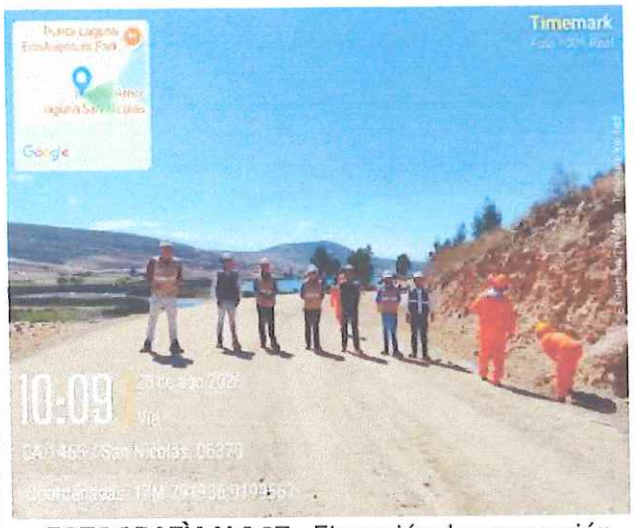

FOTOGRAFÌA N.º 07.- Ejecución de excavación manual en cunetas.

FOTOGRAFÌA N.º 06.- Curado de concreto en badenes.

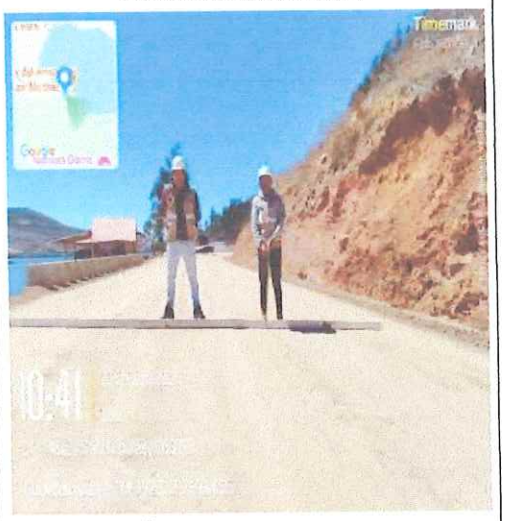

FOTOGRAFÌA N.º 08.- Ejecución de trabajos en cunetas.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ELDER JHONER CERDAN CASTAÑEDA
Ing. Civil – CIP N° 305727
Especialista en Estructuras

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Beny Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
OSCAR BENY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N°.-A - 0404668 3

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): CERDÀN CASTAÑEDA ELDER JHONER

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 305727 Fecha de Incorporación: 29/03/2023

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÀBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA, 10 de JUNIO del 2026

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
DIRECTOR SECRETARIO (E)

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1462

Especialista en Control de Calidad:

Ramirez Sangay Franz William

CIP N° 271115

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

1461

Cajamarca,08 de setiembre del 2026.

CARTA Nº 007-2026-RSFW /ECC

A : **Ing. Oscar B. Cueva Rodríguez**
Supervisor de obra – Consorcio Supervisor MC

DE : **Ing. Ramirez Sangay Franz William**
Especialista en control de calidad – Consorcio Supervisor MC

ASUNTO : **HAGO LLEGAR INFORME CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2026 AL 31/08/2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD**

REFERENCIA : **OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA"**
(1) CARTA 0013-2026/AMMG/ICC

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez infórmale que la empresa: "CONSORCIO VIAL DEL NORTE" ha elaborado, **INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026** EN LA ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2026 AL 31/08/2026– VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 con respecto del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA"**.

Asimismo, en virtud al documento de la referencia (1), en calidad de especialista de control de calidad de la supervisión, se ha procedido a la REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN del mencionado Informe mensual de la ejecución, que está acorde con los estándares técnicos vigentes y los criterios de diseño considerados dentro del expediente técnico del proyecto.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930758673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas Nº 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA",

1460

INFORME Nº 007-2026-RSFW /ECC

A : **Ing. Oscar B. Cueva Rodríguez**
Supervisor de obra – Consorcio Supervisor MC

DE : **Ing. Ramírez Sangay Franz William**
Especialista en control de calidad – Consorcio Supervisor MC

ASUNTO : **HAGO LLEGAR INFORME CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2026 AL 31/08/2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD**

REFERENCIA : **OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA"**

FECHA : **07 de septiembre del 2026.**

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez infórmale que la empresa: "CONSORCIO VIAL DEL NORTE" ha elaborado, **INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026** EN LA ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2026 AL 31/08/2026– VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 con respecto del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA"**.

Asimismo, en virtud al documento de la referencia (1), en calidad de especialista de control de calidad de la supervisión, ha procedido a la REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN del mencionado Informe mensual de la ejecución, que está acorde con los estándares técnicos vigentes y los criterios de diseño considerados dentro del expediente técnico del proyecto.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1459

INFORME TÉCNICO N°007

SETIEMBRE -2026

OBRA:

"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE-3N-DISTRITO DE JESUS-PROVINCIA DE CAJAMARCA-REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA-PROVINCIA DE CAJAMARCA-REGION CAJAMARCA"



ING. FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
CIP N° 271115

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930758673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

INFORME TÉCNICO N° 007-2026- RSFW /ECC 1458

I. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 15 de agosto del 2025, el Gobierno Regional de Cajamarca y el CONSORCIO SUPERVISOR MC, suscribieron el contrato N° 060-2025-GRCAJ-GGR, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.
- ✓ Con fecha 18 de agosto del 2025, la entidad realizó la entrega del terreno a CONSORCIO SUPERVISOR MC, suscribiendo el acta de entrega de terreno.
- ✓ Con fecha 19 de agosto del 2025, el CONSORCIO SUPERVISOR MC toma la supervisión de la obra.
- ✓ El día 23 de enero del 2026 se suscribe el acta de suspensión de plazo de ejecución de la obra, por mutuo acuerdo entre la entidad y el contratista, suspendiendo el plazo a partir del 23 de enero del 2026. Dicha suspensión fue motivada por condiciones climáticas desfavorables que originaron la paralización de los trabajos.
- ✓ El día 21 de abril del 2026, la entidad (Gobierno Regional de Cajamarca) suscribe el acta de acuerdos de levantamiento de la suspensión de la obra N°02.
- ✓ El día 03 de julio del 2026 la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante CARTA N° D117-2026-GR.CAJ/GRI, remite su pronunciamiento de cambio de personal clave en el cual declara procedente el cambio solicitado
- ✓ El día 15 de julio del 2026 el área de calidad de la supervisión emite el INFORME N.º 001-2026-RSFW /ECC teniendo como asunto **INFORME DE ACCIONES CORRECTVAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA**
- ✓ El día 16 de julio del 2026 el área de calidad de la supervisión emite con **CARTA Nº 001-2026-RSFW /ECC** en donde se hace llagar la conformidad don el material OVER.
- ✓ El día 22 de julio del 2026 el contratista emite la CARTA N° 064-2026-JLYV-RC-CVN donde hace llegar el **DESCARGO Y ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A NO CONFORMIDAD SOBRE MATERIAL OVER E INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS**
- ✓ El día 31 de julio del 2026 el contratista emite la **CARTA 009-2026/AMMG/ICC** donde hace llegar el **INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA**
- ✓ El 24 de agosto del 2026 el contratista emite la **CARTA 0011-2026/AMMG/ICC** donde hace llegar el **INFORME SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA N°02.**

CONSORCIO SUPERVISOR MC
CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247129

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1457

- ✓ El 31 de agosto del 2026 el especialista de control de calidad del CONSORCIO VIAL DEL NORTE emite la CARTA N° 012- 2026 /AMMG / ICCdonde hace llegar el DE LA VALORIZACIÓN N°01 DEL MAYOR METRADO N°02.
- ✓ El 31 de agosto del 2026 el especialista de control de calidad del CONSORCIO VIAL DEL NORTE emite la CARTA N° 013- 2026 /AMMG / ICC donde hace llegar el informe de control de calidad DE LA VALORIZACIÓN N°014.

II. OBJETIVO

- El presente informe tiene por objetivo la verificación en campo de los trabajos ejecutados en el periodo del **01/08/2026 AL 31/08/2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14 DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD**, los cuales deben estar acorde al presupuesto de obra, las especificaciones técnicas, planos y más documentos que forman parte del expediente técnico, además del cumplimiento de las normas internacionales como la ASTM y las normas nacionales como la NTP, también contar con los certificados de calidad de los materiales e insumos usados en obra.

III. NORMAS TÉCNICAS

Las normas técnicas a tener en cuenta en la ejecución del proyecto se describen a continuación:

- ➢ Norma Técnica de Edificación E-060 (Concreto Armado)
- ➢ Norma Técnica de Edificación E-020 (Cargas)
- ➢ Manual de geología, geotecnia, suelos y pavimentos MTC
- ➢ Seguridad durante la Construcción – Norma G 050.
- ➢ American Concrete Institute
- ➢ Norma ASTM – C – 172: Método Para muestrear concreto fresco
- ➢ Norma ASTM – C – 31: Método para preparar y curar testigos de concreto para pruebas de compresión y flexión en campo.
- ➢ Norma ASTM – C – 39: Método para ensaya cilindros moldeados de concreto, para resistencia de compresión.
- ➢ Norma Técnica Peruana
- ➢ Reglamento Nacional de Construcciones - Norma E.050 Suelos y cimentaciones.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil - CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS Y/O TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

05. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.02. BADENES
05.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO (M2)
METRADO EJECUTADO: 879.81

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 53.67%

Descripción

Se procedió con los trabajos del replanteo de la obra, Con el equipo topográfico se demarco con precisión todos los puntos necesarios para la excavación, así mismo todos los elementos de la construcción en forma segura y permanente de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

05.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)

METRADO EJECUTADO: 677.11

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

Descripción

Consiste en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.

La excavación se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de sub-rasante, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel de sub-rasante de acuerdo a los planos de diseño y a las recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos EMS.

No deberán excavarse con demasiada anticipación a los trabajos motivo del Expediente Técnico. El material proveniente de los cortes deberá ser retirado fuera de la obra para seguridad y limpieza del trabajo, en un plazo máximo de 24 horas. Las operaciones de excavación no deberán iniciarse mientras no se cuente con un Plan de Desvió y Señalización comprobado

05.01.02.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM (M3)

METRADO EJECUTADO: 283.47

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

Descripción

Se considero el transporte y posterior eliminación del material excedente menor a un kilómetro procedente de los trabajos de la obra, dichos materiales son eliminados a los DME autorizados.

05.01.02.04. CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO (M3)

METRADO EJECUTADO: 75.94

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 84.05%

Descripción

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219618
JEFE DE SUPERVISIÓN

Se realizo la colocación de una capa de base con material de préstamo, el cual fue cernido con un tamiz menor al de 4 cm, y debidamente compactado, este material sirvió como "cama o asiento". El fondo se encuentro a nivel, seco y firme y en todos los conceptos fue aceptable como fundación de la estructura a soportar.

05.01.02.05. PERFILADO Y COMPACTACION (M2)

METRADO EJECUTADO: 764.44

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 47.61%

Descripción

Este trabajo fue afinado y terminado a mano, poco antes de realizar la subsiguiente partida. Este trabajo se realizó en el área que soportará directa o indirectamente la estructura del pavimento.

Se perfilo y compacto de acuerdo al origen de la zona:

- Como resultado de corte de material suelto.
- Como resultado de corte en roca suelta.
- Como resultado de corte en roca fija.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

Se suministro y se usó plantillas que controlaron las dimensiones de este trabajo. En los casos de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al pavimento, se consideró las tolerancias de la subrasante, ajustándose a la cota del perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. Se trabajo Treinta (30) centímetros por debajo de la cota de subrasante el material suelto fue compactado a 95% de la máxima densidad seca.

05.01.03. CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG (M3)

METRADO EJECUTADO: 188.17

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 65.17%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

Descripción

Se suministro los diferentes tipos de compuestos de cemento portland Tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparado y construido de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios forma, dimensiones y clases indicadas en los planos.

La clase de concreto que se utilizó se en las estructuras, se realizó de acuerdo a lo indicado en los planos o las especificaciones.

- Concreto Clase G,14MPa (f'c = 140 Kg/cm2)
- Concreto f'c = 175 Kg/cm2 + 30 % P.G.
- Concreto Clase E,17.5MPa (f'c = 175 Kg/ cm2)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Se realizo los trabajos de suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de

acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

El concreto que se utilizó en el proyecto fue premezclado para sus diferentes resistencias a la compresión (f'c) a los 28 días.

05.01.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES (M2)

METRADO EJECUTADO: 186.23

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 45.46%

Descripción

Se suministro, habilito, y se colocó las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida también incluye el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre.

05.03. CUNETAS

05.03.01. CUNETAS REVESTIDAS E=0.10M

05.03.01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.03.1.1.1. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)

METRADO EJECUTADO: 76.22

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 1.85%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

Descripción

Se realizó en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluyendo el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.

05.03.1.1.2. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (M3)

METRADO EJECUTADO: 99.09

PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 2.41%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

Descripción

Se realizo el traslado del material procedente de los cortes del terreno natural y las excavaciones de zanjas al punto de acopio dentro de la obra para su posterior utilización o eliminación. El acarreo de material se realizó periódicamente, evitando que se acumule y permanezca en obra más de un mes, excepcionalmente cunado el material que se usara en rellenos.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

V. CONTROL DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS

Los instrumentos y/o equipos utilizados en obra son controlados verificando su integridad y fecha de calibración; de esta manera asegurar que los trabajos realizados que requieran la utilización de estos, sean confiables.

VI. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Todos los materiales empleados por el contratista cumplieron con las Especificaciones Técnicas del Proyecto, como también con las fichas técnicas entregadas y aprobadas por la Supervisión. Se verificó los certificados de calidad, y que cumplan fehacientemente con las propiedades físicas, mecánicas y químicas indicadas el proyecto, como también con la normativa vigente.

VII. CONTROL DEL PROYECTO DEFINITIVO (CONTROL DE CALIDAD ISO-9001).

a) CONTROL TÉCNICO

La contratista viene realizando el control técnico de la obra con personal profesional y técnico para que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra.

- Se ha verificado el cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se ha verificado la calidad del concreto y su correcta colocación y vibrado para tener una mejor distribución del concreto en la estructura.
- Se ha realizado ensayos al concreto fresco como medida de la temperatura y medida del asentamiento del concreto mediante el cono de Abramas.
- Se ha verificado los espesores y dimensiones de los muros de contención los cuales están acorde a lo indicado en los planos del proyecto.
- Se ha verificado el perfilado y compactación de la sub rasante para la construcción de muros de contención.
- Se ha verificado el grado de compactación en la conformación de terraplenes y también se ha verificado que el material cumpla con la granulometría requerida.
- Se ha verificado niveles y alineamientos topográficos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

b) CONTROL DE CALIDAD

- La supervisión durante el proceso de ejecución de la obra en el presente mes, ha llevado un estricto control del proceso constructivo de la obra, verificando que se ejecuten las partidas de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado, así como verificando que se utilicen la maquinaria y/o equipos adecuados.
- La verificación y el control de calidad de la Obra se están efectuando mediante ensayos de laboratorio como ensayos de consolidación al concreto fresco, ensayo de resistencia a compresión mediante testigos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil - CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

de concreto, ensayos de temperatura al concreto fresco, ensayos de densidades mediante cono de arena, dichos ensayos se muestran en los anexos del presente informe.

VIII. CONCLUSIONES

- Se da la conformidad a la CARTA 0013-2026/AMMG/ICC en el cual presenta el **INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026** del especialista de control de calidad de la contratista correspondiente al periodo del **01/08/2026 AL 31/08/2026.**
- Se realizo la verificación del informe del especialista en control de calidad por parte del contratista, donde se evidencia de todas las partidas ejecutadas durante el periodo **01/08/2026 AL 31/08/2026** del área de control de calidad y los controles de calidad realizados, por ende, se da la conformidad a dicho informe.
- Se realizó la supervisión de todos los materiales, herramientas y equipos en el proyecto a fin de cumplir con las especificaciones técnicas.
- Los equipos topográficos empleados tienen certificado de calibración vigente el cual garantiza la correcta ejecución del proyecto.
- Las partidas ejecutadas en obra se vienen realizando de la misma forma como indica las especificaciones técnicas del proyecto.
- Los insumos utilizados durante dicho periodo cuentan con certificado y fichas técnicas que aseguren la calidad de dichos materiales para el uso en obra.
- A la fecha los trazos y replanteos para la ejecución de las partidas lo están realizando de acuerdo a los planos y en coordinación con el jefe se Supervisión.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

IX. ANEXOS

PANEL FOTOGRÁFICO

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	
Foto Nº 01: VERIFICACIÓN DE SLUMP CONCRETO PREMEZCLADO F´C: 175 KG/CM2	
Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	
Foto Nº 02: REALIZACION DE ENSAYOS DE FRECUENCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	

Foto N° 03: ENSAYO DE CBR DE MATERIAL DE PRESTAMO

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	

Foto N° 04: CBR DE MATERIAL DE PRESTAMO – ENSAYO DE FRECUENCIA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N°
JEFE DE SUPERVISIÓN

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	

Foto Nº 05: VACIADO DE CONCRETO – VEIRIFICACIÓN DE SLUMP DE CONCREDTO PREMEZCLADO

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR MC **Contratista:** CONSORVIO VIAL DEL NORTE **Obra:** "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.	

Foto Nº 06: VACIADO DE CONCRETO F´C: 175 kg/cm2 + 30% PM

CONSORCIO SUPERVISOR MC
FRANZ WILLIAM RAMIREZ SANGAY
Ing. Civil – CIP N° 271115
Especialista en Control de Calidad

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N°
JEFE DE SUPERVISIÓN

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0233842

Certificado de Habilidad

N. 1449

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): RAMIREZ SANGAY FRANZ WILLIAM

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 271115 Fecha de Incorporación: 25/11/2021

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA, 19 de MARZO del 20 26

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS

1447

Especialista en Suelos y Pavimentos:

Ricardo Javier Ocas Boñón

CIP N° 129863

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

Namora, 07 de septiembre del 2026.

CARTA Nº 023-2026-RJOB /ESP/ CONSORCIO SUPERVISOR MC

Señor : **ING. OSCAR CUEVA RODRÍGUEZ**
Supervisor de Obra
CONSORCIO SUPERVISOR MC

Presente

Asunto : **HAGO LLEGAR INFORME N° 23-2026-ING-ES&P-RJOB CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14**

Referencia : **1.-** Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".

De mi especial consideración:

Por la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y mediante la presente hacerle llegar el INFORME N° 023-2026-ING-ES&P-RJOB, dicho informe corresponde a los trabajos realizados correspondiente al mes de agosto del 2026 de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo la atención a la presente, Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CC.
Archivo

1645

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES".
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 023-2026-ING-ES&P-RJOB

AL : **ING. OSCAR CUEVA RODRÍGUEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DEL : **ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON**
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS.

ASUNTO : **HAGO LLEGAR INFORME CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026 – VALORIZACIÓN INFORMATIVA DE OBRA N°14.**

REFERENCIA :**"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS EMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".**

FECHA : **NAMORA, 07 DE AGOSTO DEL 2026**

Por medio del presente es grato saludarlo cordialmente y a la vez presentar a su despacho el Informe de conformidad de metrados de la especialidad de Suelos y Pavimentos correspondiente al mes de agosto del 2026, periodo comprendido desde el 01 de agosto del 2026 al 31 de agosto del 2026, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857, en el cual se detallan actividades ejecutadas por la especialidad de suelos y pavimentos, cuyo contenido se detalla a continuación:

I. DATOS GENERALES

- PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- UBICACIÓN: DISTRITO : NAMORA.
  PROVINCIA : CAJAMARCA.
  REGIÓN : CAJAMARCA.
- UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
- CONTRATISTA : Empresa: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
- SUPERVISIÓN DE OBRAS : CONSORCIO SUPERVISOR MC

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

II. FICHA TÉCNICA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORALAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N, DISTRITOS DE JESÚS Y NAMORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CARRETERA : NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

EMPALME PE-3N	
LONGITUD	: TRAMO PRINCIPAL: 16+984 KM TRAMO VARIANTE: 2+356.31 KM
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: LICITACIÓN PUBLICA N° 011-2024-GR.CAJ - PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATO DE SERVICIO	: CONTRATO N°006-2025-GRCAJ-GGR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	: 13 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
REPRESENTANTE LEGAL	: LIC. JOSE LUIS YOPLA VERGARA
RESIDENTE DE OBRA	: ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION	: 15 DE AGOSTO DEL 2025
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
MONTO DE LA OBRA	: S/ 31,981.270.28
PLAZO DE LA OBRA	: TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 14 DE ABRIL DEL 2025
FECHA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01	: 30 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 19 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 26 DE JULIO DEL 2026
FECHA SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 02	: 26 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE REINICIO DE OBRA N° 02	: 19 DE ABRIL DEL 2026
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	: - SE CONSTRUIRÁN UNA CARPETA DE RODADURA CON TRATAMIENTO BICAPA EN UNA DISTANCIA DE: TRAMO PRINCIPAL 16+984 KM Y TRAMO VARIANTE 2+356.31 KM. - SE REALIZARÁ UN RECAPADO CON TSB SOBRE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE EN LA PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE NAMORA CON UNA DISTANCIA DE 354.24 KM. - SE REALIZARÁ LA NIVELACIÓN 7 TECHOS DE BUZONES. - SE CONSTRUIRÁN 11 BADENES. - SE CONSTRUIRÁN 3 TIPOS DE ALCANTARILLAS TMC Ø 24", 36" Y 60" - SE CONSTRUIRÁN DOS TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TODO EL TRAYECTO DE PROYECTO QUE SERÁN LOS SIGUIENTES: MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO Y MUROS DE

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

CONCRETO ARMADO
- SE CONSTRUIRÁN CUNETAS EN TODO EL TRAYECTO DE LA CARRETERA

III. ANTECEDENTES

- Con fecha 13 de enero del 2025, la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y Contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE, suscribieron el CONTRATO N° 006-2025- GRCAJ-GGR, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.
- Con fecha 13 de enero del 2025, la Entidad realizo la entrega del terreno a CONSORCIO VIAL DEL NORTE, suscribiendo el acta de entrega de terreno correspondiente.
- Con fecha 14 de abril del 2025, mediante carta N° D204-2025-GR.CAJ-GRI/SGSL la Entidad la hizo entrega del expediente técnico.
- Con fecha 15 de abril del 2025, Entidad y Contratista suscribieron el acta de inicio de obra.
- Con fecha 30 de abril del 2025, se suscribió entre la Entidad y Contratista el ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, la cual se reinició el 19 de agosto del 2025.
- Con fecha 19 de agosto del 2025, se reinició el plazo de ejecución de obra, reanudando CONSORCIO VIAL DEL NORTE, todas sus actividades contractuales.
- con fecha 15 de agosto del 2025 EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y el CONSORCIO SUPERVISOR MC, suscribieron el CONTRATO N° 060-2025-GRCAJ-GGR, cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁSEMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.
- Con fecha 18 de agosto del 2025 la Entidad realizo la entrega del terreno a CONSORCIO SUPERVISOR MC, suscribiendo el acta de entrega de terreno.
- Con fecha 19 de agosto toma el Consorcio Supervisor MC, la supervisión de obra
- Valorización informativa n° 14 de obra

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

IV. OBJETIVOS

Aprobación de los metrados ejecutados durante el mes de agosto del 2026 – periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1442

V. MARCO LEGAL

- Expediente Técnico de la obra "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo del 2019.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
- Directivas del OSCE • Ley N° 2744. Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG – 2013.
- Manual de Seguridad Vial. • Manual de Ensayos de Materiales.
- Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
- Manual de Diseño Geométrico DG – 2018.
- Manual de Mantenimiento y Conservación Vial.
- Manual de inventarios Viales.
- Manual de Carreteras: Suelos Geología y Pavimentos.
- Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje.
- Reglamento Nacional de Gestión de infraestructura Vial
- ACI - American Concrete Institute
- AASHTO - American Association of State Highway and Transport Officials

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BONON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

VI. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ESPECIALIDAD.

- A continuación, se describen algunos puntos de los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta en la revisión del expediente técnico, para lo cual se debe indicar lo siguiente:

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA

Conforme lo indica el Expediente Técnico de Obra en el CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA, ítem 15. METAS DEL PROYECTO en el folio 000257 la obra tiene las siguientes metas relacionadas con la especialidad:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PAVIMENTO

Carpeta de Rodadura con tratamiento superficial bicapa.

Se construirán una carpeta de rodadura con tratamiento bicapa con una distancia de: Tramo Principal: 16+984 km. Tramo Variante: 2+356.31 km.

Recapado sobre Pavimento Rígido existente.

Se realizará un recapado con TSB sobre la superficie del pavimento rígido existente en la proximidad de la ciudad de Namora con una distancia de 354.24 km (Extraído del expediente técnico folio 000257)

Para el cumplimiento de estas metas en el expediente técnico se ha contemplado una serie de partidas que se deben ejecutar, estas partidas están detalladas en el CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA, ítem 16. PARTIDAS CONSIDERADAS, folio 000256,

de todas las partidas que se deben ejecutar las siguientes están vinculadas a la especialidad de Suelos y Pavimentos, para el cumplimiento de las metas indicadas: Importante a considerar es que se ha contemplado la utilización de materiales provenientes de 02 canteras, cuyo estudio se presenta en el ESTUDIO DE CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA punto 1.4. CANTERA PROPUESTA folios 000527 al 000520, donde presenta el resumen de sus propiedades indicando que cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de diversas normativas para ser empleados como materiales para la obra, estas canteras son:

CANTERA	UBICACIÓN (KM)	ACCESO (m)	POTENCIA (m3)	COORDENADAS	
				ESTE	NORTE
LA BANDA	00+000 LD	7425	22736.25	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA
LLIMBE	00+000 LD	1325	71693.44	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA

De estas canteras se ha contemplado que la CANTERA LA BANDA sea empleada para la mezcla asfáltica, mientras que la CANTERA LLIMBE sea empleada como relleno, base y subbase.

Así mismo en los folios 668 al 661 se presentan los METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTO, y en el folio 665 se muestran las progresivas que han sido consideradas para realizar un mejoramiento de subrasante en un espesor e= 0.30 M, como se muestra a continuación.

MEJORAMIENTO DE LA SUB RAZANTE E=0.30 m		
PROGRESIVA INICIAL	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD (m)
00+000	01+750	1750
02+240	02+700	460
03+500	03+750	250
09+500	11+020	1520
11+740	13+500	1760
16+500	16+984	484
LONGITUD TOTAL DE MEJORAMIENTO		6224

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

De ha considerado la reevaluación de estos tramos, solicitando los ensayos de clasificación y CBR en el laboratorio instalado en obra, pues al realizar la inspección visual de los cortes realizados se ha detectado que es material rocoso y probablemente no requiera mejoramiento en todo el tramo como indica el expediente técnico, además se informa que se está recorriendo todo el tramo evaluando las zonas en donde se han realizado las calicatas para identificar la necesidad de mejorar la sub rasante y así cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.

6.2 CUMPLIMIENTO DE METAS DURANTE EL PRESENTE MES POR LA ESPECIALIDAD

Durante el mes de agosto del 2026, periodo del 01 de agosto del 2026 al 31 de agosto del 2026, se tiene un avanzase en la ejecución en la especialidad de suelos y pavimentos de las siguientes metas:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Trabajos ejecutados durante el mes de agosto respecto a la especialidad de suelos y pavimentos

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADO EN PERIODO VALORIZADO	
				MES 14 (01/10/25 - 31/10/25)	ACUMULADO
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
05.01	BADENES				
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13	879.81	1,022.96
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31	677.11	877.31
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17	75.94	105.20
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13	764.44	907.59
05.04	CUNETAS				
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M				
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	76.22	76.22

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

TABLA 01: Metrados ejecutados en el mes de agosto respecto a la especialidad de suelos y pavimentos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

6.3. TRABAJOS REALIZADOS

Conforme a nuestra Programación de Obra Aprobada, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026, se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la Especialidad de Suelos y Pavimentos.

- Verificar trabajos en cantera para la preparación de material para base.
- Se realizó la verificación de trabajos de control de compactación por el método de reemplazo de arena en la partida de mejoramientos de suelos en los badenes y cunetas.
- Se verifica los trabajos en mayores metrados n° 02, según la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO CONTRACTUAL	MAYOR METRADO	% VALORIZADO
05.00.00	OBRAS DE ARTE				
05.03.00	MURO DE CONTENCION				
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8030.45	2459.27	70.0
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	2572.40	353.90	90.0

TABLA 02: Metrados ejecutados de mayores metrados n° 02.

- Se verifica los trabajos del adicional de obra n° 02 con deductivo vinculante n° 01, trabajos que se describen en la siguiente tabla.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO EJECUTADO A LA FECHA	% DE AVANCE
01.00.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
01.01.	BADENES				
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	42.91	42.91	100
01.01.02.03	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	437.11	437.11	100
01.02.	ALCANTARILAS				
01.02.02.02.	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	554.32	515.02	92.92
01.02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	556.52	556.52	100
01.03.	MURO DE CONTENCION				
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	163.6	163.6	100
01.03.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	161.3	161.3	100

TABLA 03: Metrados ejecutados de adicional de obra n° 02 con deductivo vinculante n° 01.

Respecto al adicional de obra n° 04 en el cual se tiene las siguientes partidas:

ADICIONAL DE OBRA N°04			
Item	Descripción	Und.	Metrado
01	BASE GRANULAR		
01.01	PREPARACION DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA (SAMADAY)	M3	14,325.30
01.02	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA BASE DE LA CANTERA RIO CAJAMARQUINO	M3	9,550.20
01.03	COMBINACION DE MATERIAL (60% SAMADAY + 40% RIO CAJAMARQUINO)	M3	23,875.50
01.04	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	19,100.40

De los controles de compactación por el método de reemplazo de arena.

Se realizaron ensayos de frecuencia de materiales usados para la capa de base, estos ensayos se realizaron en le laboratorio de la obra, se realizo el seguimiento de estos ensayos, se adjunta una copia de estos en esta valorización.

La empresa contratista hace llegar los certificados de calibración de todos los equipos usados en laboratorio de la obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

6.4. RECURSOS EMPLEADOS

Durante el mes de agosto del 2026, la Supervisión Consorcio Supervisor MC, ha empleado los siguientes recursos para las actividades relacionadas a la especialidad de Suelos y Pavimentos:

RECURSOS EMPLEADOS POR LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE		
ÍTEM	RECURSO	CANTIDAD
1	Especialista de suelos y pavimentos	1
2	Técnico de suelos	1
3	Equipo de densidad de campo -cono de arena	1
4	Chofer de camioneta	1
5	Camionera pick Up 4 x 4	1
6	Operador de retro excavadora	1
7	Retroexcavadora	1
8	Herramientas manuales	1

VII. DIFICULTADES PRESENTADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante la ejecución de los trabajos se ha podido identificar las siguientes dificultades para el desarrollo de la especialidad:

- Al verificar los trabajos de compactación solo se ha podido trabajar solo por el método de reemplazo de arena y no con el densímetro nuclear equipo que se encuentra en los gastos generales de la obra.
- Los cambios bruscos de betas en la cantera han generado que la empresa contratista desarrolle la instalación de una chancadora primaria y una zaranda para la producción de material de base la cual corresponde al 60% de material de cerro aprobado para la base.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
...O JAVIER OCAS BOÑON
...ivil – CIP N° 129863
...Especialista en Suelos y Pavimentos

VIII. JUICIO CRÍTICO DE LA ESPECIALIDAD

La especialidad de Suelos y Pavimentos durante el mes de agosto del 2026, periodo del 01-08-2026 al 31-08-2026 ha venido realizando las actividades establecidas y programadas en el expediente técnico de obra y el cronograma de avance de obra presentado a la Entidad, teniendo en consideración las especificaciones técnicas y la normatividad dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de velar por la calidad y correcta ejecución de las partidas vinculadas directamente con la especialidad.

Así mismo se han venido realizando los análisis de los materiales de las canteras establecidas y aprobadas para el desarrollo de obra-ensayos de frecuencia de canteras y materiales preparados.

Se viene instalando la capa de base granular (adicional 4) las cuales se están realizando los controles de calidad indicados en el expediente técnico y la normativa peruana actual.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

 1438

IX. CONCLUSIONES

- Durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2026 la especialidad de Suelos y Pavimentos aprueba las partidas ejecutadas presentadas por la especialista de la empresa ejecutora.
- Durante el presente mes se han aprobado las siguientes partidas:

Valorización contractual.

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO BASE	METRADO EN PERIODO VALORIZADO	
				MES 14 (01/10/25 - 31/10/25)	ACUMULADO
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
05.01	BADENES				
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13	879.81	1,022.96
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31	677.11	877.31
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17	75.94	105.20
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13	764.44	907.59
05.04	CUNETAS				
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M				
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	76.22	76.22

Valorización mayores metrados n° 02

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO CONTRACTUAL	MAYOR METRADO	% VALORIZADO
05.00.00	OBRAS DE ARTE				
05.03.00	MURO DE CONTENCION				
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8030.45	2459.27	70.0
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	2572.40	353.90	90.0

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

Valorización adicional de obra n° 02 con deductivo vinculante n° 01

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	METRADO EJECUTADO A LA FECHA	% DE AVANCE
01.00.	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
01.01.	BADENES				
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	42.91	42.91	100
01.01.02.03	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	437.11	437.11	100
01.02.	ALCANTARILAS				
01.02.02.02.	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	554.32	515.02	92.92
01.02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	556.52	556.52	100
01.03.	MURO DE CONTENCION				
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	163.6	163.6	100
01.03.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO	M2	161.3	161.3	100

Respecto al adicional 04 aún no se ha presentado ninguna valorización pese a ello se están realizando los controles de calidad y afinando algunas dificultades encontradas en el tramo de prueba y casi los 4 km ejecutados ala fecha.

Para las cuales se han realizado todos los controles de calidad y de compactación por el método de reemplazo de arena.

- Se verifican los materiales que cumplan con los requisitos mínimos solicitados en el expediente técnico y la normativa peruana actual.
- Se indica que los trabajos que viene realizando la contratista CONSORCIO VIAL NORTE vienen realizando los trabajos programados de la especialidad se suelos y pavimentos de mamera coordinada y programada.

Es todo lo que informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,


CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Especialista de suelos y pavimentos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

PANEL FOTOGRÁFICO.

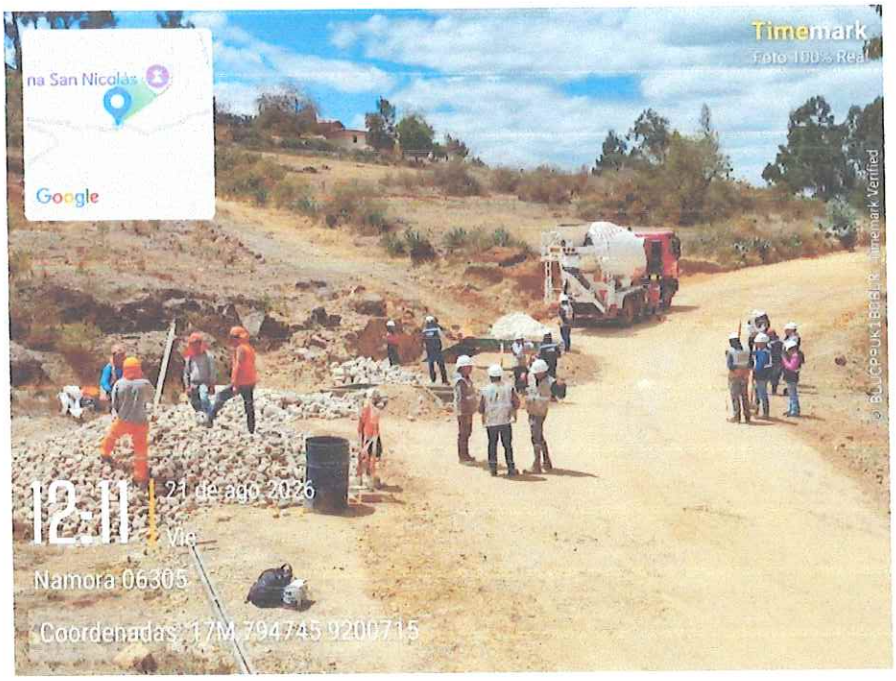

Fotografía 01: en la imagen apreciamos verificación de los trabajos de suelos antes de la instalación de concreto en badenes.

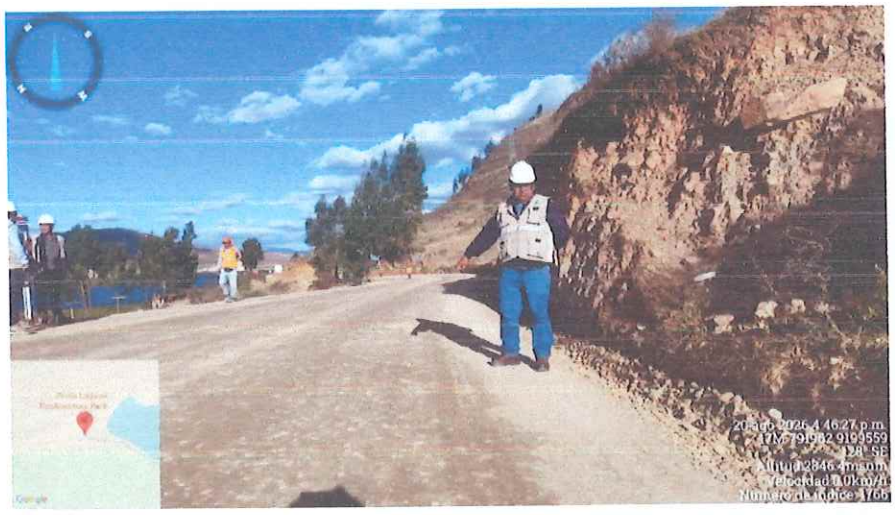


Fotografía 02: en la imagen apreciamos verificación de los trabajos instalación del nivel de base en el tramo de prueba.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1434

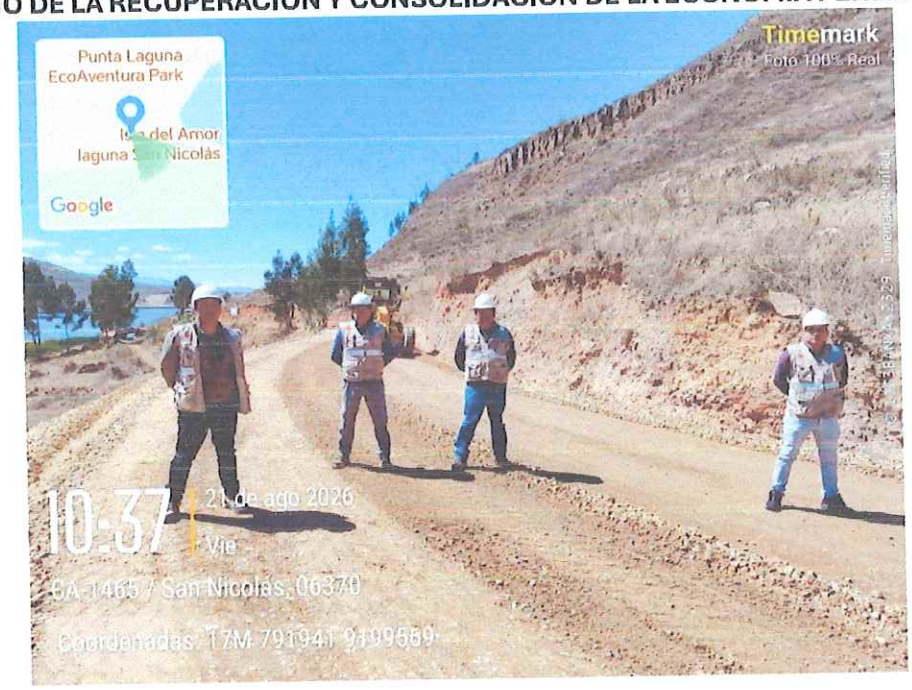

Fotografía 03: en la imagen apreciamos la verificación de los trabajos de tendido de material para base.

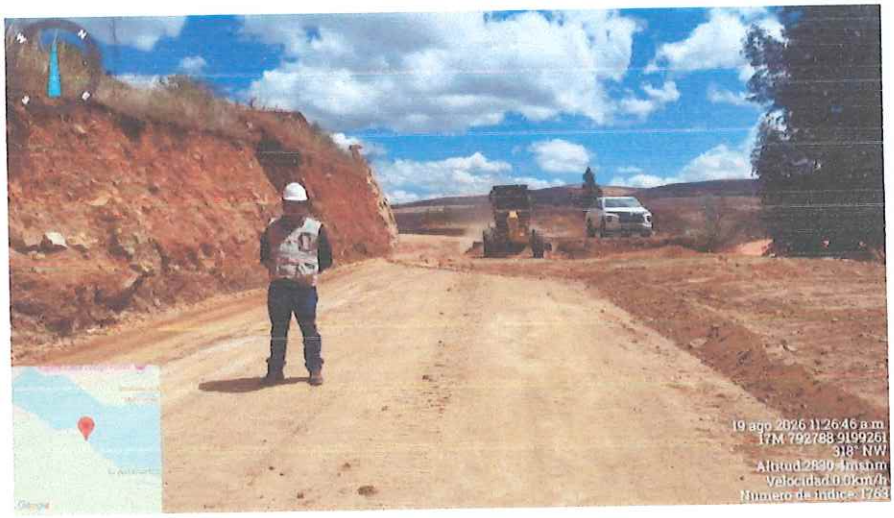

Fotografía 04: en la imagen apreciamos limpieza del nivel de sub base para instalar la base.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1433



Fotografía 05: en la imagen apreciamos la verificación de los trabajos en badenes.

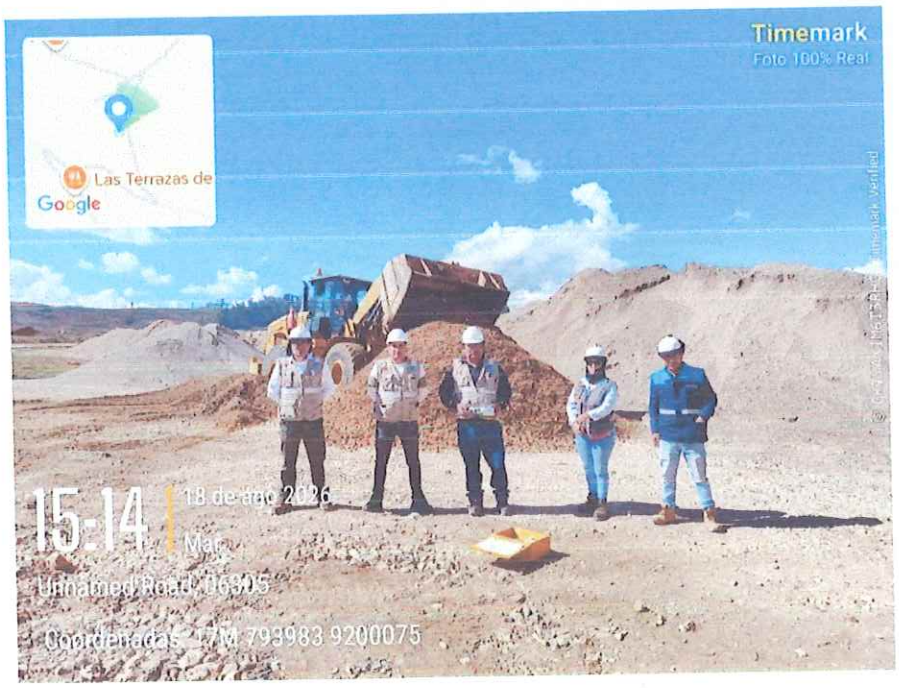

Fotografía 06: en la imagen apreciamos la verificación de la combinación de material de base nen punto de acopio.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1432



Fotografía 07: verificación de los trabajos en alcantarilla doble.




Fotografía 08: verificación de los trabajos de compactación en badenes.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1431

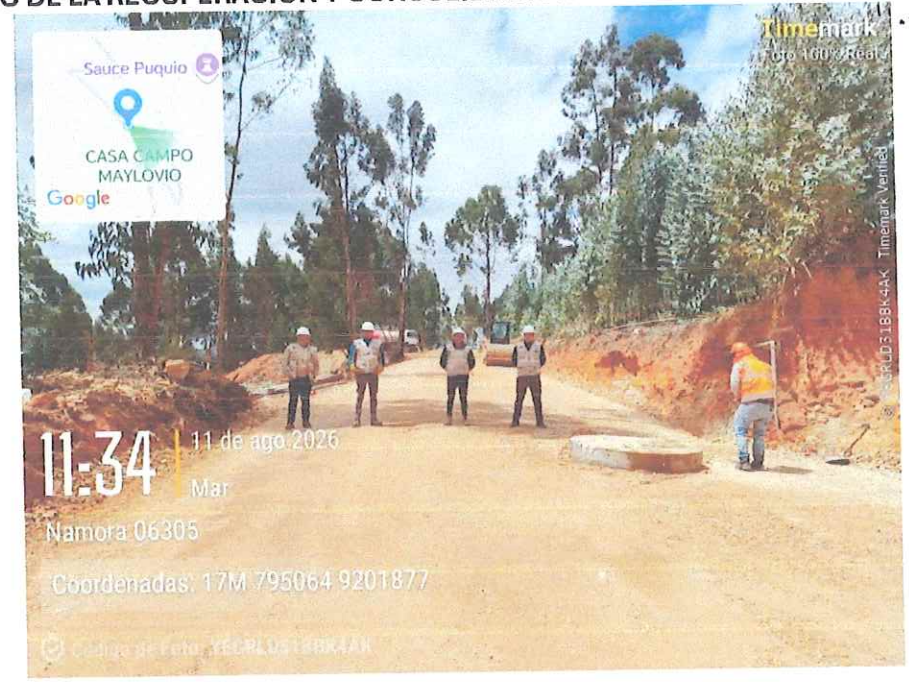

Fotografía 09: en la imagen apreciamos el tendido de material de sub base en la carretera en el último tramo de carretera.

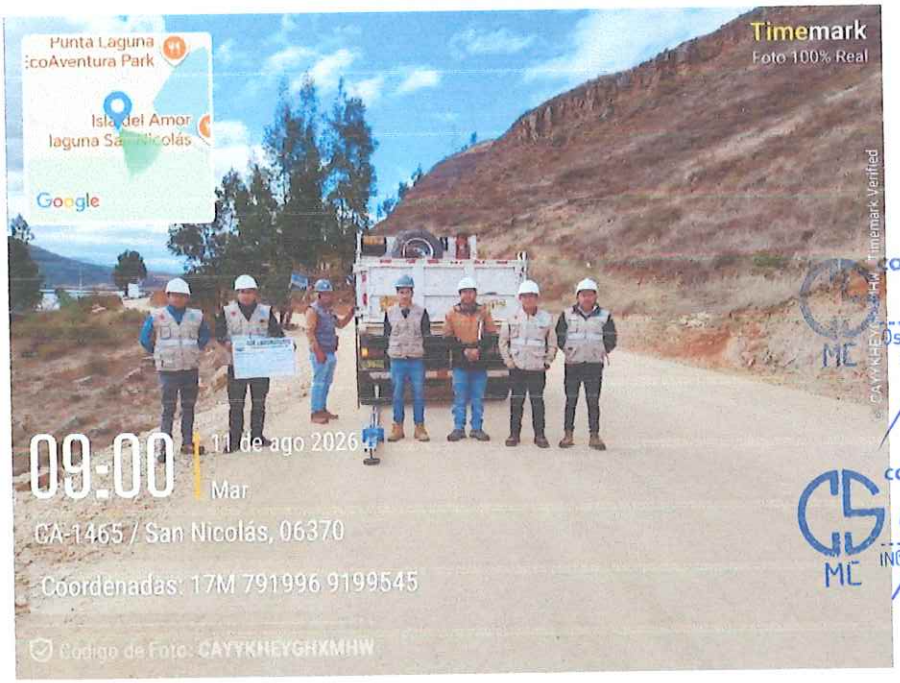


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Fotografía 10: en la imagen apreciamos la participación de la supervisión de los trabajos de control de deflexión con la viga benkelman.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1430

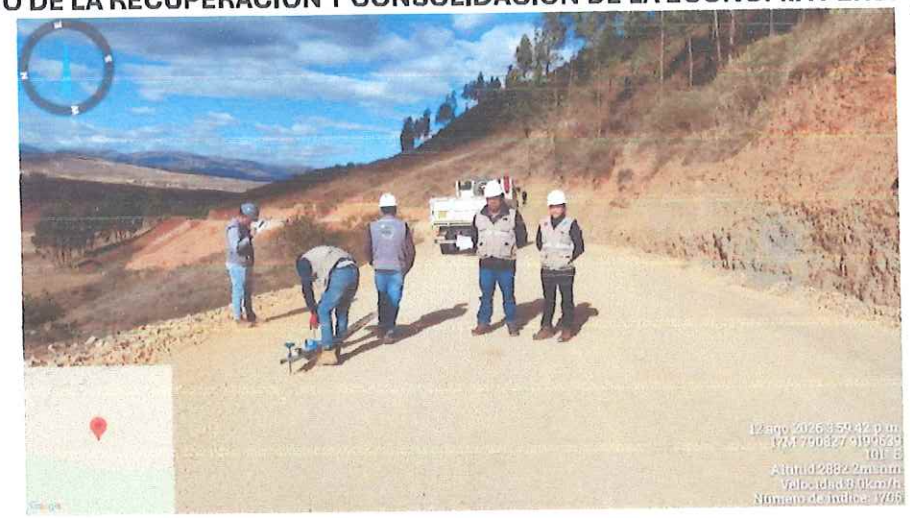

Fotografía 11: en la imagen apreciamos la participación de la supervisión de los trabajos de control de deflexión con la viga benkelman.



Fotografía 12: en la imagen apreciamos la verificación de los trabajos de compactación en badenes.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos



Fotografía 13: en la imagen apreciamos la participación de la supervisión de los trabajos de control de deflexión con la viga benkelman.




Fotografía 14: en la imagen apreciamos pesado del camión viga en instalaciones de TRC.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129863
Especialista en Suelos y Pavimentos

1428

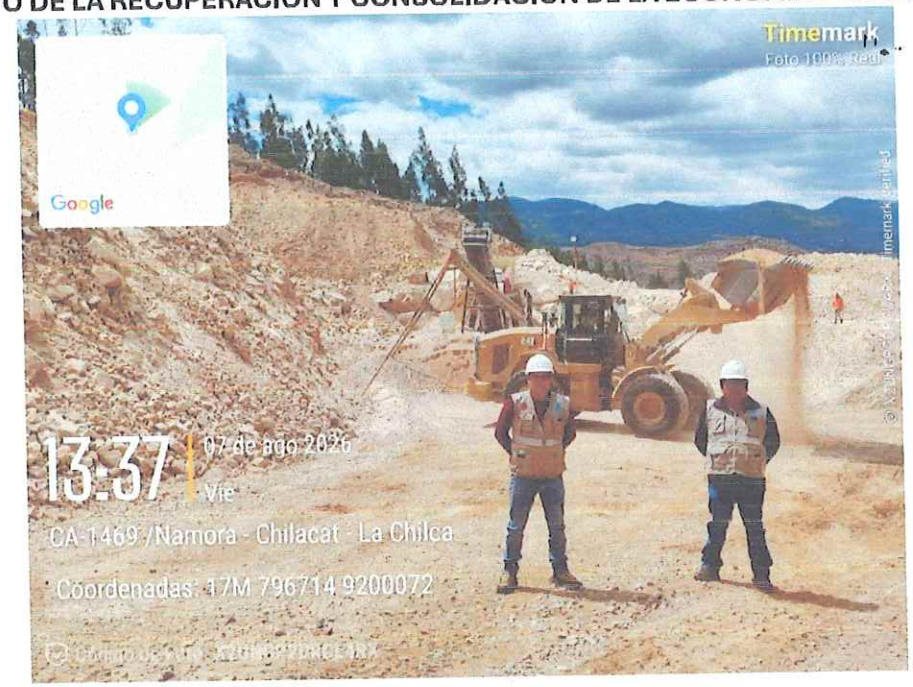

Fotografía 15: en la imagen apreciamos la verificación de los trabajos de material para base en cantera.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
Ing. Civil – CIP N° 129865
Especialista en Suelos y Pavimentos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1427

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0234408

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): OCAS BOÑON RICARDO JAVIER

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 129863 Fecha de Incorporación: 20/09/2011

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CAJAMARCA , 06 de ABRIL del 2026

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
DIRECTOR SECRETARIO (E)

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial:

Josué Ispilco Infante

CIP N° 213764

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

CARTA N° 009–2026-CSMC/JII/ET

A : Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez
Supervisor de Obra

DE : Ing. Josué Ispilco Infante

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA EN CARRETERAS, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS AL MES DE AGOSTO 2026- VALORIZACIÓN DE OBRA N° 14

REFERENCIA : a) **OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857**

FECHA : Namora, 08 de setiembre de 2026

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el informe de conformidad de partidas valorizadas, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857, correspondiente al mes de agosto.

Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

INFORME N° 009–2026-CSMC/JII/ET

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 09 de julio de 2025, el comité de selección adjudico la buena pro concurso público N° 001-2025-GR.CAJ – primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolas- Empalme PE - 3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca"
- El 18 de agosto del 2025 se dio el Inicio oficial del plazo contractual.
- Con fecha 07 de julio de 2026, mediante Carta N° D121-2026-GR.CAJ/GRI, se notificó al Consorcio MC la emisión de la opinión favorable para el cambio del Personal Clave, correspondiente al cargo de Especialista en Topografía de Carreteras, Señalización y Seguridad Vial de la Supervisión de la Obra. En consecuencia, quien suscribe asumió oficialmente las funciones inherentes al referido cargo a partir de la fecha de la citada notificación.
- Con fecha 15 de julio de 2026, el Especialista en Topografía de la Supervisión presentó al Supervisor la CARTA N° 001-2026-CSMC/JJI/ET, mediante la cual requirió que se solicite al Contratista la remisión de la información topográfica correspondiente, con la finalidad de efectuar la revisión y verificación técnica de los trabajos ejecutados.
- Con fecha 24 de julio de 2026, el Especialista en Topografía de la Supervisión presentó al Supervisor la CARTA N° 002-2026-CSMC/JJI/ET, mediante la cual se realiza la evaluación del descargo presentado por el Contratista respecto al requerimiento de información topográfica y determinación de incumplimiento parcial.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Beny Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

- Con fecha 05 de agosto de 2026, el Especialista en Topografía del Contratista mediante INFORME DE TOPOGRAFÍA N° 009-2026-CVN, hace el descargo y absolución de observaciones con respecto a la CARTA N° 002-2026-CSMC/JII/ET del Especialista en Topografía de la Supervisión, quedando conforme a lo solicitado.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ESPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Beny Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Con fecha 05 de agosto de 2026, el Especialista en Topografía de la Supervisión, mediante CARTA N° 004-2026-CSMC/JII/ET, remitió al Supervisor de Obra la

documentación correspondiente a la Conformidad de las Partidas Valorizadas del mes de julio de 2026 – Valorización de Obra N° 13, elaborada por el Contratista, para su revisión y trámite correspondiente.

- Con fecha 05 de agosto de 2026, mediante la CARTA N° 005-2026-CSMC/JII/ET, el Especialista en Topografía de la Supervisión remitió al Supervisor de Obra el Informe Mensual correspondiente al mes de julio de 2026 – Valorización de Obra N° 13.
- Con fecha 14 de agosto de 2026, el Especialista en Topografía del Contratista mediante INFORME TOPOGRÁFICO DE GEOREFERENCIACIÓN N° 012-2026-CVN, hace llegar el Establecimiento de una nueva red de puntos geodésicos de control vinculados al punto geodésico original, debido a que los puntos geodésicos CAJ01004 y CAJ01005 han sido manipulados por personas ajenas al proyecto, como medida de control y respaldo, se establecieron 02 puntos geodésicos, estos nuevos puntos geodésicos permitirán la continuidad de los trabajos de replanteo, verificación y control topográfico durante la ejecución de la obra.
- Con fecha 07 de setiembre de 2026, el Contratista hizo llegar a la Supervisión de Obra la documentación correspondiente al Mayor Metrado N° 02 – Muros de Contención, la cual contiene el INFORME TOPOGRÁFICO N° 014-2026-CVN – MAYOR METRADO N° 02, elaborado por el Especialista en Topografía del Contratista, para su revisión y evaluación correspondiente.
- Con fecha 07 de setiembre de 2026, mediante la CARTA N° 007-2026-CSMC/JII/ET, el Especialista en Topografía de la Supervisión remitió al Supervisor de Obra el Informe de Conformidad de Partidas Valorizadas Correspondiente al Periodo 17/06/2026 al 11/08/2026- Valorización de Obra N° 01 del Mayor Metrado N° 02.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Clasificación de la vía	: Tercera clase
Pavimento	: Tratamiento Superficial Bicapa (TSB)
Velocidad Directriz	: VD =40 Km./h
Número de Carriles	: Tramo Principal: 00+000 – 15+730 (02 carriles) 15+730 – 16+984 (01 carril) 16+984 – 17+337.97 (02 carriles)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Ancho de Calzada	Tramo Variante: 0+000 - 2+356.31 (02 carriles) : Tramo Principal: 00+000 - 15+730 (5.00 m) 15+730 – 16+984. (3.00 m) 16+984 - 17+337.97 (5.00 - 8.50 m) Tramo Variante: 0+000 - 2+356.31(5.00 m)
Ancho de Bermas	: 0.50 m cada lado
Bombeo	: 2,5%
Sobre anchos	: De 0.00 m a 4.40 m
Bombeo en berma	: 2.50%
ALINEAMIENTO HORIZONTAL: Radio mínimo	: VD =40 Km./h (55 m) : VD =30 Km./h (30 m) : VD =20 Km./h (15 m)
Peralte máximo	:8 %
ALINEAMIENTO VERTICAL: Pendiente máxima Pendiente mínima	 : 9.00% : 0.50%
Talud de relleno	: Material Suelto: 1:1.5 (V:H) : Roca Suelta: 1:1.5 (V:H) : Roca Fija: 1:1 (V:H)
Talud de corte	: Material Suelto: 3:1 y 2:1 (V:H) : Roca Suelta: 4:1 (V:H) : Roca Fija: 10:1 (V:H)
Cuneta triangular.	: 0.30x0.60 m
Cuneta Rectangular.	: 0.40x0.50 m.

3. LOCALIZACIÓN

El tramo de carretera en ejecución de la obra le corresponde la siguiente georreferenciación

Tramo Inicial - Empalme PE- 3N.

- Este : 9201961.110 m
- Norte : 787644.835 m
- Altitud : 2822.84 m.s.n.m

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil - CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

Tramo Final - Namora – Calle Libertad.

- Este : 9202769.127 m

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Norte : 795529.104 m
- Altitud : 2724.16 m.s.n.m

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y certificar la conformidad topográfica de los trabajos ejecutados en la valorización correspondiente, garantizando que las obras se desarrollen conforme a los planos aprobados, alineamientos, niveles, secciones transversales y tolerancias establecidas en el expediente técnico del proyecto.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprobar la correcta ubicación planimétrica y altimétrica de los trabajos ejecutados.
- Verificar que las mediciones utilizadas para la valorización correspondan a los volúmenes reales de obra determinados mediante levantamientos topográficos de campo.
- Evaluar las posibles variaciones o desviaciones respecto a los trazos y cotas del diseño, determinando si se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia aceptados por la normativa y el expediente técnico.
- Validar los perfiles longitudinales y transversales levantados durante la ejecución, asegurando su coherencia con las condiciones del terreno y las obras ejecutadas.
- Emitir conformidad o no conformidad topográfica de los metrados presentados por la contratista en la valorización correspondiente, sustentando técnica y gráficamente las observaciones, de ser el caso.
- Respaldar la valorización mensual con planos, reportes de campo y archivos digitales (en formato CAD o compatible) que evidencien la verificación topográfica realizada.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

5. ALCANCE

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ESPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Obras Viales, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

El informe detalla las actividades desarrolladas durante el mes de agosto del 2026, en el tramo de la carretera donde se viene ejecutando las actividades, teniendo en cuenta la correcta ejecución de cada partida, según las especificaciones técnicas del

proyecto y planos aprobados, por ende, se da conformidad a las siguientes partidas ejecutadas en el mes.

6. TRABAJOS GABINETE

Los trabajos en gabinete constituyeron una parte fundamental del desarrollo del proyecto, al permitir el **procesamiento, análisis y diseño complementario** de la información obtenida en campo, así como la elaboración de documentos técnicos necesarios para la supervisión de la obra. Estas actividades se realizaron de manera continua y coordinada con el avance de los trabajos de campo, de modo que las decisiones técnicas pudieran ser aplicadas oportunamente en la carretera en construcción.

Entre las principales actividades de gabinete se desarrollaron las siguientes:

6.1. REPORTE DE PUNTOS PARA REPLANTEO.

Se procesaron los datos del diseño de la obra vial generando reportes de coordenadas y listados de puntos, los cuales fueron utilizados en el replanteo de taludes, subrasantes, subbase, muros, alcantarillas y demás estructuras. Dichos reportes garantizaron precisión en la ubicación de referencias físicas y continuidad en las actividades constructivas.

6.2. VERIFICACIÓN DE PLANOS.

Se efectuó la revisión de los planos correspondientes a la Valorización contractual, verificándose la ubicación, progresivas, alineamiento, dimensiones y demás características geométricas de los elementos ejecutados, en concordancia con la documentación contractual y los trabajos ejecutados en campo.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil - CIP N° 213764

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

7. TRABAJO DE CAMPO

Durante el periodo correspondiente se desarrollaron de manera continua diversas actividades topográficas indispensables para el aseguramiento geométrico de las estructuras proyectadas en el corredor vial. Todas las labores fueron ejecutadas siguiendo procedimientos estandarizados de replanteo, verificación y control de calidad, basados en los planos aprobados y en criterios técnicos establecidos en normativas. El objetivo principal de estas labores fue garantizar que las estructuras en ejecución cumplan rigurosamente con la ubicación, geometría, rasantes y cotas

definidas en el proyecto, minimizando riesgos de desalineamientos, deformaciones o incompatibilidades constructivas. A continuación, se detallan las actividades correspondientes a cunetas, badenes y levantamientos complementarios.

7.1. BADENES

Tramo Principal: Progresiva 4+846.5 – 4+859.5, 5+256 – 5+276, 11+969 – 11+985, 12+468 – 12+985.23, 12+560 – 12+580, 12+795 – 12+808.

Tramo variante: Progresiva 0+478 – 1+491, 1+271 – 1+284 y 1+477 – 1+490

Durante la verificación efectuada por la Supervisión se constató que el trazo y replanteo de badenes, comprendiendo la materialización de ejes, alineamientos, límites de excavación, niveles y puntos de control conforme a los planos de diseño. Asimismo, se constató la realización de controles topográficos durante la ejecución de las estructuras para verificar su ubicación, geometría y cotas, brindando el soporte necesario al proceso constructivo.

7.2. CUNETAS

Tramo Principal: Progresiva 6+330 – 6+700

Durante el presente periodo de valorización se verificó la ejecución de los trabajos de control topográfico para la conformación de cunetas, comprendiendo el replanteo y materialización del eje de la vía, así como la ubicación de los bordes izquierdo y derecho de la calzada, considerando los sobreanchos correspondientes en los tramos en curva.

Asimismo, se efectuó el control de los puntos de referencia y niveles necesarios para garantizar la correcta ubicación, alineamiento, pendientes y geometría de las cunetas, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el proyecto. Estos trabajos permitieron verificar que la ejecución de las cunetas mantenga la correcta continuidad y funcionalidad del sistema de drenaje vial.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

8. AVANCE DEL MES

Las actividades de ejecución de la obra se vienen desarrollando, considerando los planos correspondientes al **eje modificado**, aprobados para la presente etapa del proyecto, garantizando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas, criterios de diseño y lineamientos establecidos. Asimismo,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

el replanteo y la ejecución en campo se realizan conforme a dichas modificaciones, a fin de asegurar la correcta ubicación de las estructuras y minimizar posibles interferencias o desviaciones durante el desarrollo de las actividades.

9. PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO

9.1. TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

PROGRESIVA: Para la presente partida, las progresivas consideradas corresponden a los tramos donde se ejecutaron las partidas durante el presente período de valorización.

Durante el presente período de valorización se efectuó la supervisión y control de las actividades topográficas ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de los alineamientos, niveles, cotas, coordenadas y demás parámetros geométricos establecidos. Asimismo, se realizó la revisión y validación de la información topográfica de campo y gabinete, el seguimiento a los controles georreferenciados, la verificación de metrados y la evaluación de la documentación técnica presentada, asegurando la confiabilidad de la información empleada para el control y valorización de la obra, en concordancia con las especificaciones técnicas, planos del proyecto aprobados y la normativa vigente.

9.2. BADENES

Tramo Principal: Progresiva 4+846.5 – 4+859.5, 5+256 – 5+276, 11+969 – 11+985, 12+468 – 12+985.23, 12+560 – 12+580, 12+795 – 12+808.

Tramo variante: Progresiva 0+478 – 1+491, 1+271 – 1+284 y 1+477 – 1+490

Durante el presente período se verificó el metrado de los badenes ejecutados en obra, tomando como base los planos del proyecto y las verificaciones en campo de dimensiones, longitudes, anchos, espesores, cotas y demás parámetros geométricos. La información obtenida constituye el sustento para la valorización de las partidas ejecutadas.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

9.3. CUNETAS

Tramo Principal: Progresiva 6+330 – 6+700

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUÉ CAPILLO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Ingeniería en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Se verificó la excavación manual y acarreo de material excedente D=1KM en cunetas, lo cual dio origen al metrado requerido. Así mismo, se verifico las cotas, pendientes y tolerancias establecidas.

10. OBSERVACIONES TÉNICAS

- ✓ Se verificó la continuidad de los BM.
- ✓ Se verificó que los certificados continúan vigentes.
- ✓ Se verificó que las progresivas utilizadas corresponden al eje aprobado.
- ✓ Se verificó la utilización del mismo sistema de coordenadas.
- ✓ Se verificó el uso del Datum oficial.
- ✓ Se verificó la correcta aplicación del corredor Civil 3D.

11. EQUIPOS Y SOFTWARE

11.1. EQUIPOS PARA CONTROL PLANIMÉTRICO

- ✓ 01 receptor GNSS.
- ✓ 01 colectora de datos.

11.2. EQUIPOS PARA CONTROL ALTIMÉTRICO

- ✓ 01 nivel topográfico.
- ✓ 01 estación total
- ✓ 01 trípode de soporte.
- ✓ Mira topográfica de aluminio de 5 metros
- ✓ Wincha

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

11.3. SOFTWARE

- ✓ Civil 3D
- ✓ Excel
- ✓ AutoCAD

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil - CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

12. CONCLUSIONES:

- ✓ De acuerdo con el análisis realizado al informe presentado por el contratista y con la verificación en campo, del replanteo, se ha podido constatar que la empresa

contratista viene realizando los trabajos con el control topográfico que la obra requiere.

- ✓ Por lo tanto, se emite un pronunciamiento favorable respecto al cumplimiento del control topográfico reportados en su informe.
- ✓ Asimismo, se otorga conformidad a los planos presentados por el Especialista en Topografía de la empresa contratista, al verificarse que estos guardan concordancia con la información técnica contenida en el Informe Topográfico MENSUAL N° 015-2026-CVN y con los metrados considerados.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ASPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXOS

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PLANILLA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN BADENES

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ESPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (4+846.5 _ 4+859.5)				
PROGRESIVA	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
4+847	5.12	0.01	0.00	0.00
4+850	8.85	0	20.96	0.02
4+853	11.22	0	30.11	0.00
4+856	7.77	0	28.49	0.00
4+859	3.21	0.24	16.47	0.36
4+860	3.48	0	1.67	0.06
TOTAL			97.69	0.44

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (5+256 5+276)				
PROGRESIVA	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
5+256	15.54	0	0.00	0.00
5+259	15.57	0	46.66	0.00
5+262	12.88	0	42.67	0.00
5+265	8.95	0	32.73	0.00
5+268	5.08	0	21.04	0.00
5+271	3.68	0	13.15	0.00
5+274	3.11	0	10.19	0.00
5+275	3.44	0	6.56	0.00
TOTAL			173.00	0.00

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (11+969 - 11+985)				
PROGRESIVA	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
11+969	7.41	0.4	0.00	0.00
11+972	7.28	1.69	22.04	3.14
11+975	7.77	1.704	22.58	5.09
11+978	8.76	0.09	24.80	2.69
11+981	8.06	0.75	25.23	1.26
11+984	7.00	0.08	22.59	1.25
11+985	6.00	0.08	6.50	0.08
TOTAL			123.73	13.50

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (12+468 - 12+985.23)				
PROGRESIVA	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
12+468	7.00	0	0.00	0.00
12+471	7.11	0	21.17	0.00
12+474	9.13	0	24.36	0.00
12+477	13.10	0	33.35	0.00
12+480	8.97	0	33.11	0.00
12+483	7.93	0	25.35	0.00
12+485	5.13	0	13.06	0.00
TOTAL			150.39	0.00

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (12+560 - 12+580)				
580=	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
12+560	9.96	0	0.00	0.00
12+563	7.65	0	26.42	0.00
12+566	12.65	0	30.45	0.00
12+569	15.90	0	42.83	0.00
12+572	6.68	0	33.87	0.00
12+575	8.61	0	22.94	0.00
12+578	7.15	0	23.64	0.00
12+580	7.91	0	15.06	0.00
TOTAL			195.20	0.00

CUADRO DE AREAS Y VOLÚMENES DE BADENES (12+795 - 12+808)				
580=	ÁREA CORTE (m2)	ÁREA RELLENO (m2)	VOLUMEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
12+795	0.00	3.7	0.00	0.00
12+798	0.39	1.22	0.59	7.38
12+801	2.12	0.09	0.09	1.97
12+804	4.10	0.01	0.01	0.15
12+807	2.72	0.06	0.06	0.11
12+808	2.26	0.06	2.49	0.06
TOTAL			3.24	9.66

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE BILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES DE BADENES (0+478 - 1+491) VAR				
PROGRESIVA	AREA CORTE (m2)	AREA RELLENO (m2)	VOLUMNEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
0+482	8.80	0	0.00	0.00
0+485	6.67	0	23.21	0.00
0+488	4.26	0.01	16.40	0.02
0+491	1.13	0.64	8.09	0.98
TOTAL			**47.69**	**0.99**

CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES DE BADENES (1+271 - 1+284) VAR				
PROGRESIVA	AREA CORTE (m2)	AREA RELLENO (m2)	VOLUMNEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
1+271	1.91	1.34	0.00	0.00
1+272	2.65	1.13	2.28	1.24
1+275	5.20	0.25	11.78	2.07
1+278	5.05	0.1	15.38	0.53
1+281	4.02	0.12	13.61	0.33
1+284	1.49	0.56	8.27	1.02
TOTAL			**51.30**	**5.18**

CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES DE BADENES (1+477 - 1+490) VAR				
PROGRESIVA	AREA CORTE (m2)	AREA RELLENO (m2)	VOLUMNEN CORTE (m3)	VOL RELLENO (m3)
1+477	2.17	0.46	0.00	0.00
1+480	5.87	0.31	12.06	1.16
1+483	6.29	0.05	18.24	0.54
1+486	9.80	0.01	24.14	0.09
1+489	8.57	0.02	27.56	0.05
1+490	6.15	0.01	7.36	0.02
TOTAL			**89.35**	**1.85**

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE LOPEZO INFANTE
Ing. Civil - CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

PLANILLA DE METRADOS CUNETAS

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

05.04.00	CUNETAS							
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0,10M							
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						76.22	M3
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	# Veces	# Elementos	Long. m	Area m2	Parcial	Total	UND
	CUNETAS TRIANGULARES							
	TRAMO PRINCIPAL							
	6+330 - 6+700	1.00	1.00	370.00	0.21	76.22		
			L:1 =	370.00				

LONGITUD CUNETA TOTAL :	370.00	ML

								99.09	M3
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	# Veces	# Elementos	Volumen	F.Sponj	Alto m	Parcial	Total	UND
		1.00	1.00	76.22	1.3	-	99.09		

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial


PANEL FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE ISPILCO INFANTE
Ing. Civil – CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

Fotografía N° 1: *Control de Baden 2+382*

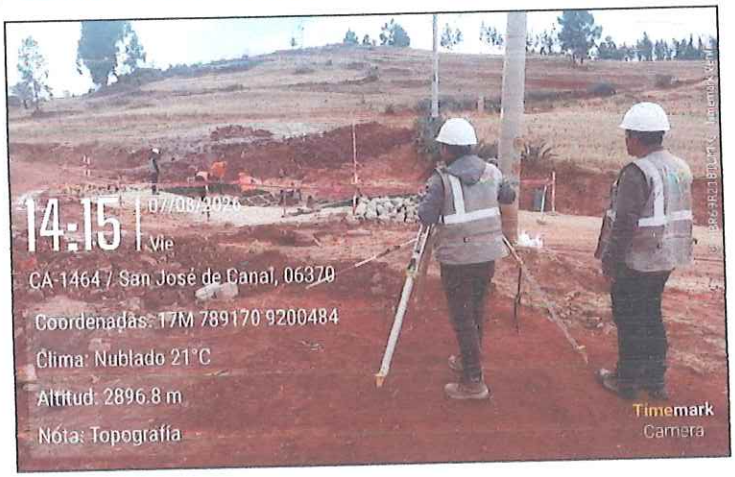


Fotografía N° 2: Trazo y replanteo de baden 4+853

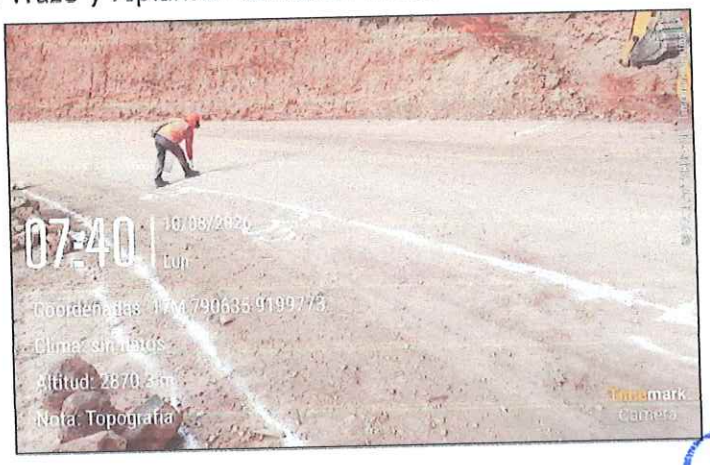

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Fotografía N° 3: *Control de baden 8+873*

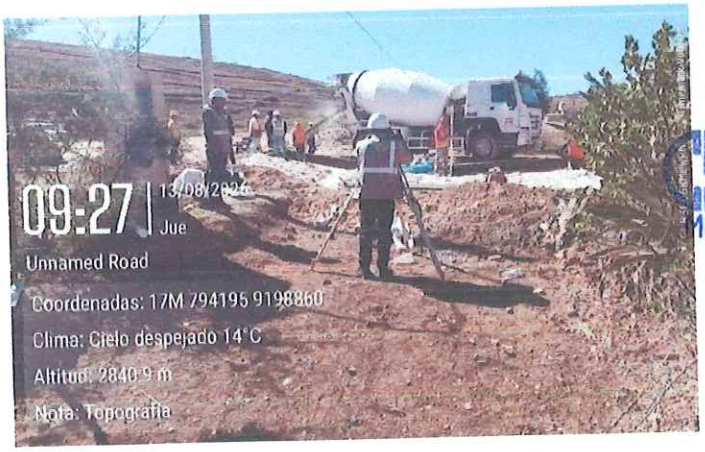


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUÉ ISPALCO INFANTE
Ing. Civil CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

1406

Fotografía N° 4: *Control de baden 12+560*

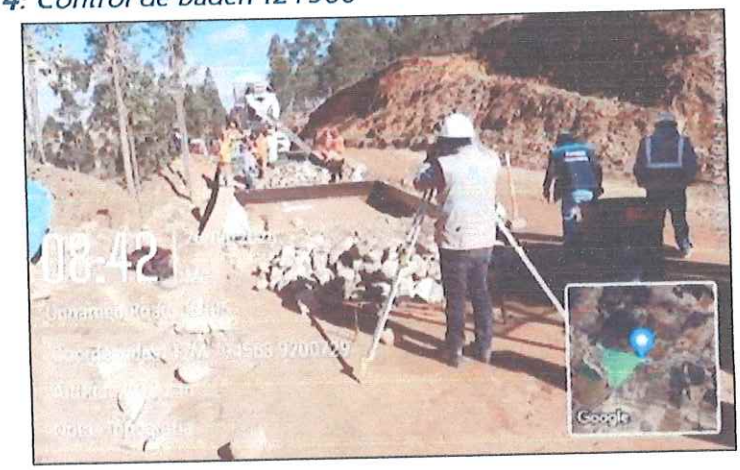


Fotografía N° 5: *Control de baden 12+802 variante*



CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Fotografía N° 6: *Trazo y Replanteo de Cunetas 6+330 – 6+700*

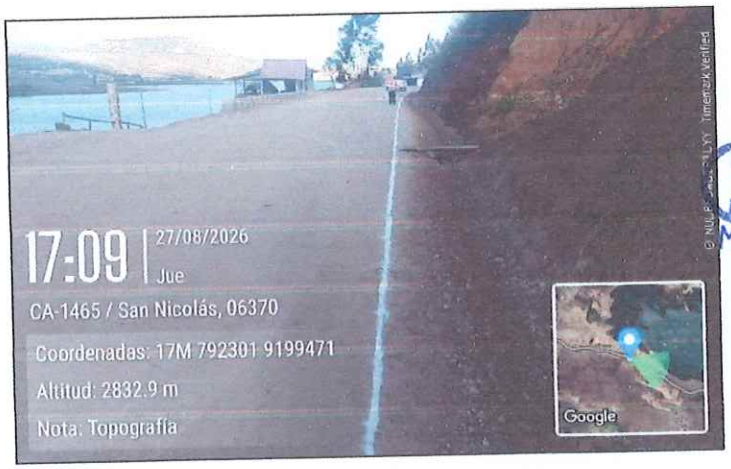

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JOSUE JSPILCO INFANTE
Ing. Civil - CIP N° 213764
Especialista en Topografía en Carreteras, Señalización y Seguridad Vial

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0234488

Certificado de Habilidad

N° 1405

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): ISPILCO INFANTE JOSUÉ

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 213764 Fecha de Incorporación: 29/05/2018

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA, 07 de ABRIL del 20 26

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos:

Miguel Rosendo Rojas Honorio

CIP N° 222060

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 1403

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

INFORME N ° 13–2026/MRH/ESST

A : Ing. Oscar Berly Cueva Rodríguez

Supervisor de Obra

DE : Ing. Miguel Rosendo Rojas Honorio

Especialista en Seguridad y salud en el trabajo

ASUNTO : Informe de conformidad de las partidas valorizadas del área de SST, correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de agosto 2026 – valorización de obra N.º 14.

REFERENCIA: **OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857**

FECHA : 08 de septiembre 2026

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el informe de Seguridad y Salud en el trabajo del área de SST de la Supervisión, realizados en el proyecto de referencia durante el periodo del 01 al 31 del mes de agosto del 2026, para adjuntarlo en la valorización correspondiente.

Sin otro particular, es todo cuanto tengo que informar a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

.....
Ing. Miguel Rojas Honorio
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N°1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Informe conformidad del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Supervisión

Periodo: del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026



PROYECTO:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857

TITULAR:

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

EJECUTOR:

CONSORCIO VIAL DEL NORTE

SUPERVISOR:

CONSORCIO SUPERVISOR MC

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N°1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

INFORME MENSUAL DE CONFORMIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SUPERVISION CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO.

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 09 de julio de 2025, el comité de selección adjudico la buena pro concurso público N° 001-2025-GR.CAJ – primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolas- Empalme PE -3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca".
- El 18 de agosto del 2025 se dio el Inicio oficial del plazo contractual.
- El 04 de agosto del 2026, con informe **INFORME N ° 013–2026/MRH/ESST**, se presentó el informe de conformidad de partidas valorizadas y actividades desarrolladas por parte de la contratista correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto.
- El 07 de agosto del 2026, con informe **INFORME N ° 013–2026/MRH/ESST,** se presentó al supervisor de obra e informe mensual de las actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de agosto correspondiente al área de seguridad y salud en el trabajo.

2. INTRODUCCIÓN.

El presente informe resume los resultados del avance del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional en el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N°2384857, que ejecuta el consorcio Vial del Norte y las actividades comprendidas en el periodo del 01 hasta el 31 de agosto del 2026.

Para lograr un resultado eficiente de la implementación del Plan de Seguridad, se hace la evaluación de los resultados presentados cada mes por el área de SST, se presentan conclusiones y recomendaciones que ayudará a mejorar de manera continua la gestión de SEGURIDAD de tal manera que las actividades descritas en este informe den a conocer el nivel satisfactorio de seguridad y salud ocupacional y sobre todo lograr el CERO ACCIDENTES FATALES, teniendo en cuenta uno de los principios fundamentales es la mejora continua, y compromiso de todos los trabajadores en general para asumir compromisos en cuanto a responsabilidades a cumplir el presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Es necesario indicar que durante el mes se observó que el personal en general coopera con el cumplimento de las recomendaciones de seguridad, escuchado sugerencias y opiniones para implementar medidas de control inmediatas y eficaces; es decir se está haciendo un trabajo en equipo para salvaguardar la integridad de todos los trabajadores, involucrándose la parte técnica y personal en general.

3. OBJETIVOS.

- Evaluar y documentar las actividades, condiciones y resultados relacionados con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo de agosto en la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la ruta tramo: Namora – laguna San Nicolás – Empalme pe – 3n, - distrito de Jesús – provincia de Cajamarca – región Cajamarca, distrito de Namora – provincia de Cajamarca – región Cajamarca" – N° 2384857, con el fin de identificar avances, detectar desviaciones, promover la mejora continua y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

4. MARCO LEGAL.

- Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 29783.
- Ley general en residuos sólidos N° 27314.
- Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo Nº 1065. 28-06-08.
- Decreto supremo 005-212-TR Reglamento de seguridad y salud.
- Ley 28611 ley general de medio ambiente.
- D.S. N°005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N°0011-2019-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción.
- D.S. N°003-98.SA Normas Técnicas del Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo.
- NTP 399.010 – 1 Señales de Seguridad.
- Ley N°30102 Medidas Preventivas contra los Efectos Nocivos para la Salud por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar.
- R.M 050-2013-TR Formatos Referenciales para el Sistema de Gestión de Seguridad
- Norma G: 050, Seguridad Durante la Construcción.
- D.S 006-2014-TR: Modificatoria del D.S. N°005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- R.M 050-2013-TR: Formatos mínimos del SGSST.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

5. ALCANCE.

Se superviso que la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo sea aplicable a todo el personal que labora desarrollando actividades en el proyecto; además, la supervisión y los visitantes están involucrados en todos los procesos de la obra en mención. Las actividades se realizan, según la programación, indicando los peligros, riesgos, aspectos y cualquier evento suscitado (incidente/accidente) durante el desarrollo de las actividades.

6. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

A. TRABAJOS REALIZADOS DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Durante el mes de agosto se superviso la realización de las siguientes actividades.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA (Ítem 01.05.00)

Durante el mes de agosto, se superviso que el área de SST de la contratista se enfoque en mitigar riesgos de accidentes mitigar riesgos de accidentes, garantizar la fluidez vehicular y proteger la integridad física de los trabajadores y usuarios de la vía.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ingº CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

- Durante el mes se detalla las principales actividades.

Control de tránsito y desvió.

- Instalación de señales preventivas, reglamentarias e informativas temporales antes de iniciar los trabajos.
- Implementación de planes de desvío vehicular coordinados previamente con las autoridades locales.
- Disposición de personal banderillero (vigías) debidamente capacitados para dirigir el flujo en zonas críticas o de un solo carril.
- Habilitación de accesos seguros provisionales para los predios colindantes y rutas peatonales protegidas.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

- Uso de sistemas de iluminación nocturna y dispositivos reflectantes en zonas de trabajo activas durante la noche.

✓ **Elementos.**

- Colocación de barreras tipo tranquera y conos de seguridad de alta visibilidad para delimitar el área de obra.
- Instalación de mallas de seguridad y cintas de peligro de color amarillo o rojo para restringir el paso peatonal.

✓ **Protección de Trabajadores y Equipos.**

- Dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) específicos, incluyendo chalecos reflectantes de alta visibilidad clase 2 o 3.
- Control y segregación del paso de volquetes, maquinaria de línea amarilla y vehículos livianos de la obra.
- Uso de silbatos y megáfonos por parte de los vigías para alertar rápidamente sobre situaciones de riesgo.
- Implementación de zonas de amortiguamiento seguras entre el flujo de tránsito real y el área de excavación o bacheo.

✓ **Conservación y Monitoreo de la Vía Operativa**

- Mantenimiento constante de la superficie de rodadura provisional para evitar baches que desestabilicen los vehículos.
- Limpieza de detritos y derrames de materiales de construcción (tierra, agregados, asfalto) sobre la calzada activa.
- Inspección periódica del estado de las señales provisionales para reponer aquellas dañadas o caídas.
- Riego controlado de las vías no pavimentadas o desvíos de tierra para mitigar el polvo y mejorar la visibilidad del conductor.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

2. BADENES.

2.1 Gestión Preventiva Inicial y Permisos de Trabajo.

- Charla Diaria de 5 Minutos: Instrucción obligatoria al inicio de la jornada enfocada en los riesgos específicos de la partida: atropellamientos por interferencia vial, atrapamientos en maquinaria, exposición a polvo de cemento y sobreesfuerzos durante el vaciado.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Elaboración diaria en el punto exacto de la estructura y firma obligatoria por toda la cuadrilla (operarios de concreto, carpinteros, fierreros y peones) antes de iniciar labores.

2.2 Señalización Vial y Desvíos de Tránsito (Punto Crítico)

- Corte y Control de Vía: Debido a que los badenes atraviesan transversalmente la calzada, se debe implementar un plan de desvío provisional (pase lateral) perfectamente señalizado o coordinar el cierre parcial de media vía con la supervisión.
- Señalización de Advertencia Preventiva: Colocación de letreros verticales reflectivos ("Hombres Trabajando", "Maquinaria Pesada", "Reduzca la Velocidad a 20 km/h", "Baden en Construcción") ubicados a 50, 100 y 150 metros antes del frente de trabajo en ambos sentidos de la ruta Namora - Jesús.

2.3 Seguridad en el Mezclado, Vaciado y Vibrado de Concreto.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

- Protección contra el Riesgo Químico: Los operarios encargados de la alimentación de cemento a la mezcladora utilizarán respiradores contra polvos (N95 o similar) y lentes herméticos, posicionándose siempre en contra de la dirección del viento para evitar afecciones respiratorias.
- Uso de Equipos Eléctricos (Vibrador): El operario a cargo del vibrador de concreto portará botas de jebe y guantes dieléctricos independientes. Los cables y conexiones del vibrador deben contar con aislamiento

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

doble y estar conectados a tableros comerciales con interruptor diferencial y puesta a tierra.

- Protección Dérmica: El personal que realice el reglado, frotachado y curado del concreto utilizará botas de jebe con puntera de acero y guantes de jebe caña larga para evitar el contacto directo con el concreto fresco (alcalinidad agresiva que causa quemaduras químicas).

3. CUNETAS.

3.1 Gestión Preventiva e Inducción en el Frente de Trabajo.

- Charla Diaria de 5 Minutos: Capacitación obligatoria a pie de obra antes de comenzar la jornada, enfocada en los peligros de la partida: atropellos por proximidad al tráfico, caídas al mismo nivel en la zanja de la cuneta, cortes con herramientas y quemaduras químicas por contacto con cemento.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Registro diario y firma obligatoria en campo por parte de toda la cuadrilla (perfiladores, encofradores, vaciadores y peones) antes del despliegue en las progresivas de trabajo.
- Inspección de Equipos y Herramientas (Checklist): Verificación diaria del estado de barretas, picos, lampas, reglas de metal, mezcladoras (trompos) y vibradores de concreto. Todo equipo apto llevará la cinta de color del mes.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

3.2 Señalización Vial y Control de Tránsito (Riesgo Crítico de Atropello).

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Área de Amortiguación y Trabajo: Debido a que las cunetas se ejecutan longitudinalmente en el borde inmediato de la calzada, se estableció una línea continua de conos de seguridad reflectivos de 28 pulgadas separados cada 5 metros para aislar el frente operativo.

- Señalética de Advertencia Temprana: Ubicación de carteles verticales reflectivos ("Hombres Trabajando", "Maquinaria Pesada en Vía", "Reduzca la Velocidad a 30 km/h") colocados a 50 y 100 metros antes

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROLANDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

del inicio y fin del tramo de cunetas en la ruta Namora - Laguna San Nicolás.

3.3 Seguridad en la Excavación, Perfilado y Limpieza de la Zanja.

- Interferencia con Maquinaria Pesada: Cuando la excavación o remoción gruesa se realice con retroexcavadora, se mantendrá un radio de exclusión física de 6.00 metros alrededor de la máquina. El personal de perfilado manual solo ingresará al sector cuando la maquinaria se encuentre totalmente detenida y con el cucharón apoyado en el suelo.

3.4 Seguridad en el Encofrado y Colocación de Juntas.

- Manipulación de Madera y Herramientas: Los operarios encargados del encofrado longitudinal de la cuneta utilizarán de forma estricta guantes de cuero (carnaza) para evitar astillamientos, hincaduras o cortes con clavos.

3.5 Seguridad en el Preparado, Vaciado y Acabado del Concreto.

- Mitigación del Riesgo Químico (Polvo de Cemento): Los listeros y operarios encargados de alimentar la mezcladora con cemento utilizarán de forma obligatoria respiradores contra polvos (N95) y lentes de protección herméticos, ubicándose siempre a favor del viento para evitar inhalar el polvillo.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

- Uso Seguro de Equipos Eléctricos: El operario a cargo del vibrador de concreto usará guantes y botas dieléctricas. El cableado de alimentación del equipo debe contar con aislamiento doble (manguera vulcanizada) y estar conectado a un tablero eléctrico con interruptor diferencial.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Protección Dérmica en el Frotachado: El personal que realice el vaciado, reglado y frotachado de las cunetas utilizará obligatoriamente botas de jebe con puntera de acero y guantes de jebe caña larga para evitar el

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ANGEL ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

contacto directo de la piel con la humedad alcalina del concreto fresco, previniendo dermatitis severas.

B. ENTREGA DE EPP.

- Se superviso que la entrega de EPP, se realice a cada trabajador antes de iniciar su primer día de trabajo, así mismo se realiza la charla de inducción sobre el uso, mantenimiento y conservación de EPP.
- Se superviso que la entrega de EPP quede registrada en el formato de control de entrega de elementos de protección personal.
- Los EPP que presentan algún daño o deterioro son repuestos inmediatamente por el área de seguridad en coordinación con el encargado de almacén de tal manera que se cuide la integridad de los trabajadores
- El encargado de almacén al momento de entregar el EPP proporciona a los trabajadores las instrucciones necesarias para su buen uso y cuidado tales como:
  - ✓ Como usar el equipo de protección personal.
  - Necesidades de limpieza y mantenimiento que se requiere cada EPP.
  - Sitio y forma de almacenamiento.
  - Criterios a tener en cuenta para solicitar el cambio o reposición.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

C. ENTREGA DE EPP.

- Se superviso que la entrega de EPP, se realice a cada trabajador antes de iniciar su primer día de trabajo, así mismo se realiza la charla de inducción sobre el uso, mantenimiento y conservación de EPP.
- Se superviso que la entrega de EPP quede registrada en el formato de control de entrega de elementos de protección personal.
- Los EPP que presentan algún daño o deterioro son repuestos inmediatamente por el área de seguridad en coordinación con el encargado de almacén de tal manera que se cuide la integridad de los trabajadores

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR
MIGUEL [illegible] ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

- El encargado de almacén al momento de entregar el EPP proporciona a los trabajadores las instrucciones necesarias para su buen uso y cuidado tales como:
  - ✓ Como usar el equipo de protección personal.
  - Necesidades de limpieza y mantenimiento que se requiere cada EPP.
  - Sitio y forma de almacenamiento.
  - Criterios a tener en cuenta para solicitar el cambio o reposición.

D. INSPECCIÓN DEL EPP.

Durante el mes de agosto se superviso las siguientes acciones:

INSPECCIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL; aplicando este procedimiento mediante la visita inopinada podemos evidenciar en cada frente de trabajo los trabajadores cuente con su indumentaria adecuada, así mismo nos ayuda a identificar que los equipos de protección personal (EPP), que se encuentren en mal estado, puedan ser cambiados y evitar accidentes, esta actividad se está realizando aleatoriamente en la visita a los frentes de trabajo y al inicio de las labores. Se reciben aportes y recomendaciones de los trabajadores para mejorar las condiciones del estado del EPP.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA: Mediante las inspecciones rutinarias a los almacenes y a cada frente de trabajo, se superviso que las herramientas manuales, eléctricas y materiales se encuentre ordenadamente, mediante la aplicación de la metodología Las 5S, para mantener el orden y limpieza en el área de Trabajo lo que nos permite realizar las actividades de una manera más segura evitando tropiezos, resbalones y caídas por elementos dejados en el área de trabajo; además que se muestra un ambiente de trabajo más agradable. Se hace la recomendación a los trabajadores para mantener el área de trabajo limpia y ordenada, con el fin de evitar incidentes laborales.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Se recomendó que el orden y limpieza se realiza de manera diaria al inicio y al término de la jornada laboral, con el fin de ayudar al medio ambiente y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES. Para esta actividad se continúa usando un check list diario de inspecciones de herramientas, el mismo que ayuda a visualizar la cantidad de herramientas aptas para el trabajo, cantidad de herramientas para su mantenimiento.

Se realiza las Inspecciones de herramientas utilizadas en almacén y campo, para así poder identificar cuales se encuentran en mal estado y descartarlas o repararlas según sea el caso, con la finalidad de evitar accidentes, también se realiza en almacén y según la circunstancia el lavado y desinfección de los equipos y herramientas que todos los días son internados en almacén, de tal manera que sea seguro e higiénico para los trabajadores y más duraderas para el desempeño de sus labores que realiza día a día. Indirectamente las inspecciones de herramientas sirven para mejorar las condiciones de las herramientas y no mejorar el rendimiento laboral y sobre todo evitar incidentes.

Se verifico que se realice la inspección general de las herramientas manuales y equipos, colocando la cinta azul correspondiente a este mes de agosto. Las

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL HOSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

herramientas no operativas se ubican en un lugar separado y señalizado como herramientas inoperativas.

En caso de equipos, como mezcladora, cortadoras, máquina de soldar entre otras, se hace un check list cada vez que se haga alguna actividad con dichos equipos.

E. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

- **Entrega de EPP:** Se verifico que se realice el cambio correspondiente de EPP deteriorado al personal, de acuerdo al tipo de actividad en el trabajo, también se hizo los cambios de EPP al personal en el momento adecuado. Todo ello se evidencia con el KARDEX de entrega de EPP para cada trabajador. Dichos formatos deben ser adjuntados en el informe del mes.
- **Señalización en Obra:** Se superviso la señalización en obra en cada frente de trabajo que represente algún peligro para los trabajadores y población en general; así mismo la señalizaron de los ambientes de oficina, almacén en obra, servicios higiénicos, estacionamiento de vehículos, dando cumplimiento a la partida **Señalización vial durante la ejecución**.
- **Charlas diarias de 5 minutos:** se superviso que diariamente antes de iniciar la jornada laboral se realiza la charla de 5 minutos a todos los trabajadores con la finalidad de crear una cultura de seguridad y sensibilizar en temas de prevención de pérdidas. Los temas son programados los primeros días de cada mes de acuerdo a los trabajos y sugerencia de los trabajadores.
  Se superviso que dos veces por semana se hacen dinámicas grupales relacionadas a motivación, trabajo en equipo, concentración y coordinación, con la finalidad de motivar a los trabajadores, hacer un ambiente agradable y hacer participativos a todo el personal.
  Las charlas diarias se realizan por los profesionales de obra, Tec. Diego Cieza, entre otros y el ingeniero Miguel Rojas Honorio especialista de seguridad de la supervisión.
- **Orden y Limpieza:** Se supervisa que se realice la limpieza y desinfección constante de las áreas de oficinas, almacén, servicios higiénicos, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222090
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

También se hacen limpieza durante el desarrollo de las actividades tanto en las áreas de trabajo como en el almacén. Se incide bastante en este tema, tratando de sensibilizar a todo el personal en no botar sus residuos sólidos en el campo u otro lugar, sino depositarlos en los cilindros respectivos ubicados en la zona de recojo de residuos. Además, se hace pequeñas campañas de limpieza por las cercanías de nuestras oficinas, campo deportivo, áreas aledañas a la laguna San Nicolas entre otros lugares que ameriten la limpieza.

F. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y DE CHARLAS DE SEGURIDAD DE 5 MINUTOS.

El área de SST de la contratista hace llegar el cronograma de charlas diarias, con la participación de todo el personal. Se superviso durante el mes de agosto que las charlas diarias se realicen antes del inicio de la jornada laboral, las charlas tienen una duración de cinco (5) minutos desarrollando temas relacionados a los trabajos que se vienen realizando, según se muestra en el ítem correspondiente del presente informe.

El área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa de ejecución, presenta el primer día de cada mes el cronograma de charlas que se desarrollaran de acuerdo a los trabajos que se vienen realizando, durante el mes de agosto también se realizó una capacitación con la población de la Laguna San Nicolas, con la participación del área de Seguridad y Salud en el trabajo de la Supervisión dando a conocer la importancia de mantener y cuidar la señalización temporal, a continuación se detalla las charlas de seguridad realizadas durante el presente mes de agosto del 2026.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1389

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

CRONOGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS

MES: AGOSTO 2026

N°	TEMA	RESPONSABLE
1	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ANTES DE INICIAR LA JORNADA (IPERC CONTINUO)	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
2		DESCANSO
3	RIESGOS DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO Y MEDIDAS PREVENTIVAS	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
4	MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA	ING. Nilton Perales Valdivia
5	SEGURIDAD EN EL ARMADO Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
6		FERIADO
7	MANIPULACIÓN SEGURA DE ACERO DE REFUERZO (VARILLAS Y MALLAS)	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
8	PREVENCIÓN DE ATRAPAMIENTOS DURANTE MANIOBRAS CON MAQUINARIA PESADA	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
9		DESCANSO
10	SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES Y OBRAS DE DRENAJE	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
11	MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA	ING. Nilton Perales Valdivia
12	DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE TRABAJADORES Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
13	USO SEGURO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
14	PREVENCIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
15	INSPECCIÓN DIARIA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ANTES DE SU USO	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
16		DESCANSO
17	RIESGOS POR TRABAJAR CERCA DE EXCAVACIONES Y ZANJAS	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
18	MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS	ING. Nilton Perales Valdivia
19	IMPORTANCIA DE RESPETAR LA SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE OBRA	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
20	COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE OPERADOR, VIGÍA Y PERSONAL DE APOYO	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
21	PREVENCIÓN DE INCIDENTES DURANTE EL TRÁNSITO INTERNO DE VEHÍCULOS Y VOLQUETES	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
22	ACTUACIÓN SEGURA FRENTE AL HALLAZGO DE CONDICIONES SUBESTÁNDAR	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
23		DESCANSO
24	LA IMPORTANCIA DE REPORTAR CASI ACCIDENTES (NEAR MISS)	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
25	MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	ING. Nilton Perales Valdivia
26	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR EXCESO DE CONFIANZA	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
27	SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
28	CUIDADO DE LA ESPALDA DURANTE EL LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
29	LA DISCIPLINA OPERATIVA COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR ACCIDENTES	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca
30		DESCANSO
31	CULTURA DE AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN SEGURIDAD	Bach. Diego J. Cieza Caruajulca

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

G. HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Durante el mes de agosto el cálculo de las horas hombres trabajadas desde el 01/08/2026 hasta el 31/08/2026 son de: **18952** HHT, en una jornada laboral de 8.50 horas diarias por 5 días semanales de lunes a viernes y 5.50 horas de jornada durante el día sábado. Este mes se ha contado con 66 trabajadores en obra, que han ido ingresando de forma progresiva.

Debemos indicar que el presente mes no se ha tenido inconvenientes en la obra por lo que se ha laborado de forma permanente desde el inicio hasta fin del presente mes.

MES DE AGOSTO: del 01 al 31

- Personal obrero: 53 peones.
- Personal calificado: 18 operarios

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

- Operadores de maquinaria: 10
- Personal técnico: 11 personas.
- Total, personal en obra: 92 Trabajadores
- Cabe mencionar que al cierre del mes de agosto 2026 se tiene: **18952** HHT, como se puede visualizar en el cuadro siguiente.

HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES DE AGOSTO

SEMANAS	FECHA	Nº ASISTENTES	Horas Trabajadas	H.H Trabajadas / día	
Semana 1	01/08/2026	92	5.5	506.00	506.00
Semana 2	03/08/2026	92	8.5	782.00	4416.00
	04/08/2026	92	8.5	782.00	
	05/08/2026	92	8.5	782.00	
	06/08/2026	92	8.5	782.00	
	07/08/2026	92	8.5	782.00	
	08/08/2026	92	5.5	506.00	
Semana 3	10/08/2026	92	8.5	782.00	4416.00
	11/08/2026	92	8.5	782.00	
	12/08/2026	92	8.5	782.00	
	13/08/2026	92	8.5	782.00	
	14/08/2026	92	8.5	782.00	
	15/08/2026	92	5.5	506.00	
Semana 4	17/08/2026	92	8.5	782.00	4416.00
	18/08/2026	92	8.5	782.00	
	19/08/2026	92	8.5	782.00	
	20/08/2026	92	8.5	782.00	
	21/08/2026	92	8.5	782.00	
	22/08/2026	92	5.5	506.00	
Semana 5	24/08/2026	92	8.5	782.00	4416.00
	25/08/2026	92	8.5	782.00	
	26/08/2026	92	8.5	782.00	
	27/08/2026	92	8.5	782.00	
	28/08/2026	92	8.5	782.00	
	29/08/2026	92	5.5	506.00	
Semana 6	31/08/2026	92	8.5	782.00	782.00
TOTAL H-H TRABAJADAS EN AGOSTO				18.952.00	18952.00

Fuente: Elaboración propia.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896


Dirección: Jr. Cinco Esquinas N°1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

ACUMULADO H-H TRABAJADAS	
MES	**HORAS HOMBRE TRABAJADAS**
AGOSTO	12030.00
SEPTIEMBRE	18.392
OCTUBRE	20.445
NOVIEMBRE	20.544.0
DICIEMBRE	22.272
ENERO	15.264.0
ABRIL	4290.00
MAYO	15405.00
JUNIO	15062.00
JULIO	18048.00
AGOSTO	18952.00
ACUMULADO	168674.00

Fuente: Elaboración propia.

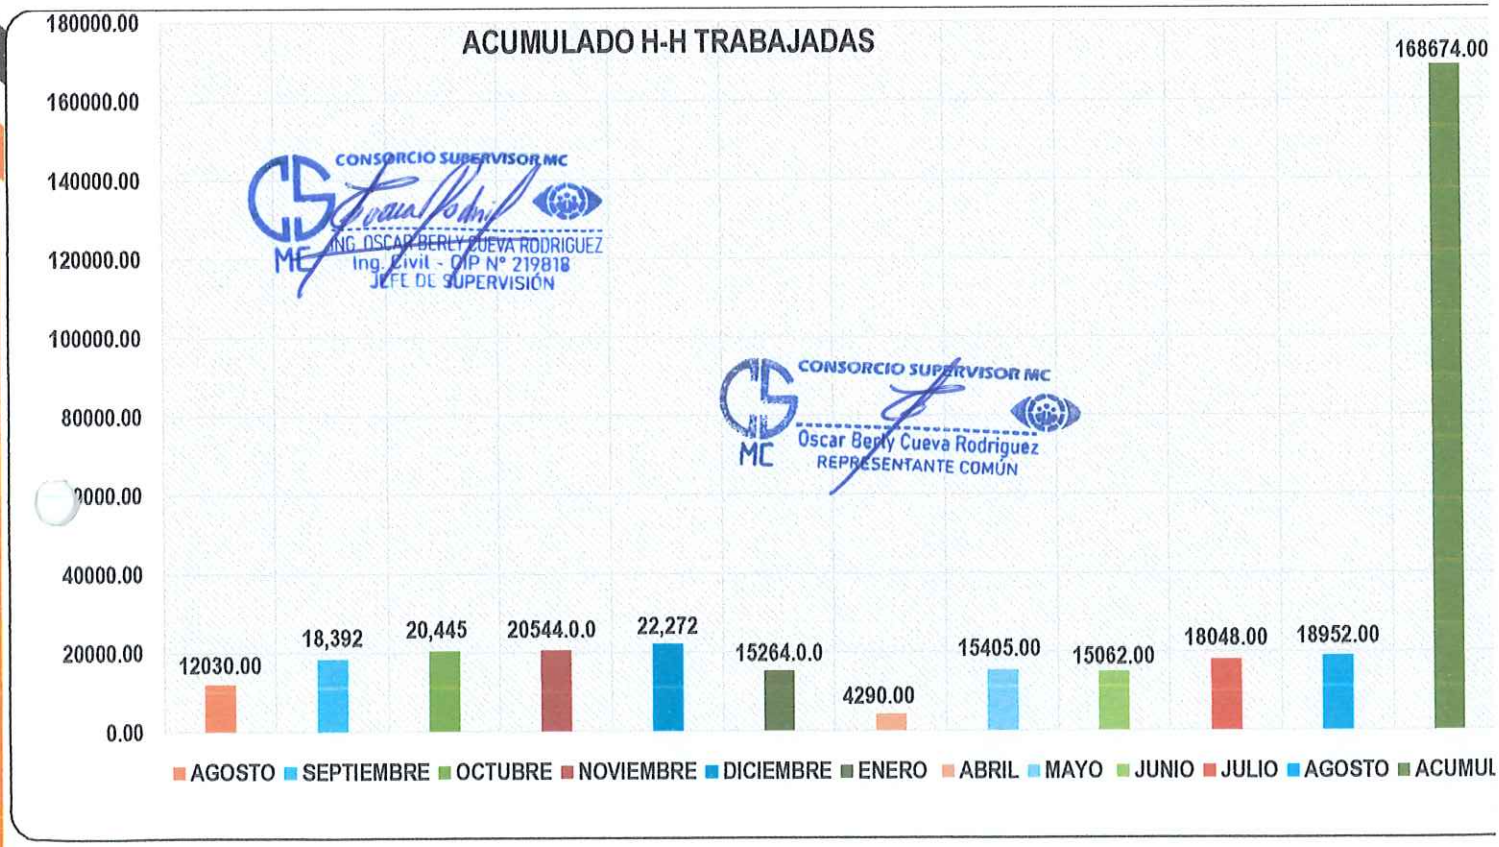

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

FUENTE: Elaboración propia.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL OSEMDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 991746896

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N°1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"


"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

H. INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:

Durante el mes de agosto del 2026 no se han reportado ningún tipo de accidentes, lo cual se detalla a continuación.

ESTADÍSTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO											
MES	N° TRABAJADORES	HHT	ACC. FATAL	ACC. INCAPACITANTE	ACC. LEVE	DAÑOS A LA PROPIEDAD	INCIDENTES	DÍAS PERDIDOS	ÍNDICE DE FRECUENCIA	ÍNDICE DE SEVERIDAD	ÍNDICE DE ACCIDENTE
AGOSTO 01/08/26 al 31/08/26	**92**	**18952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**04**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durante el mes de agosto se reportaron 03 incidentes los cuales por parte del área de seguridad de la supervisión se realizó el reporte de la observación mediante el **formato de inspección de no conformidades** de los trabajos realizados, en los anexos se adjunta el formato con las medidas correctivas por parte de la empresa ejecutora.

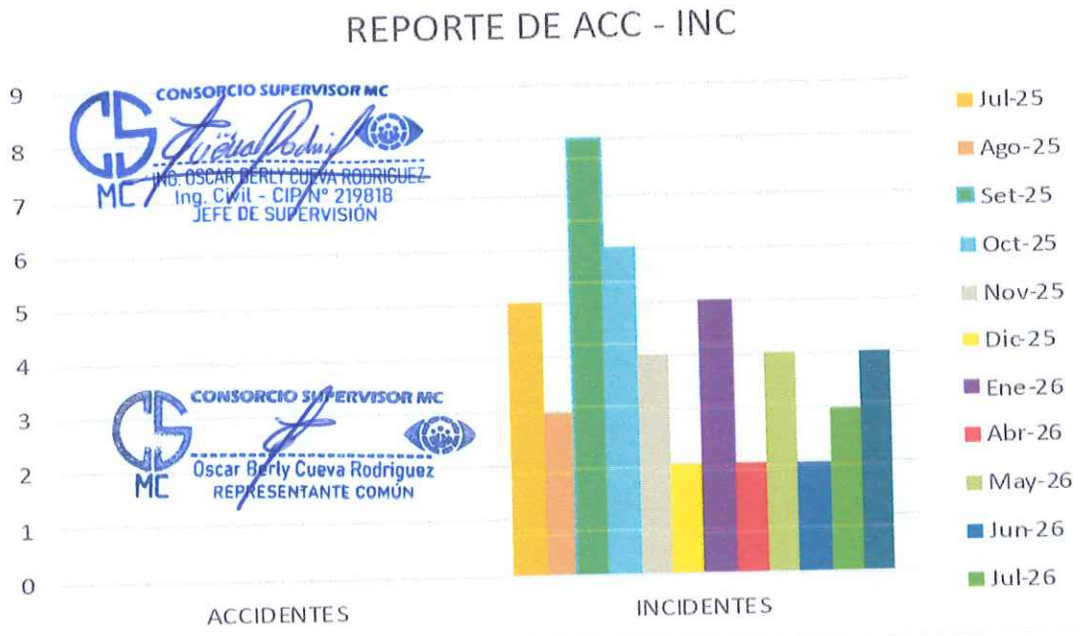

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Incidentes Leves y Medidas Implementadas:

TROPIEZO POR MATERIAL EN ZONA DE TRABAJO.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

- Durante el tránsito de un trabajador por la zona de trabajo, tropezó con material granular acumulado, ocasionando una pérdida momentánea del equilibrio, sin lesiones de consideración.

Correcciones inmediatas.

- Mantener las zonas de tránsito despejadas.
- Realizar orden y limpieza permanente.
- Retirar materiales acumulados en zonas de paso.

RESBALÓN DURANTE TRABAJOS EN CUNETA.

- Durante la ejecución de una cuneta, un trabajador perdió momentáneamente el equilibrio al pisar una superficie irregular, sin llegar a sufrir una lesión grave.

Correcciones inmediatas

- Mantener accesos y superficies de trabajo seguros.
- Señalizar y delimitar las áreas de trabajo.
- Verificar las condiciones del terreno antes de iniciar las actividades.

APROXIMACIÓN DE MAQUINARIA A PERSONAL DE OBRA.

- Durante trabajos de conformación de la vía, un equipo pesado se aproximó a la zona donde se encontraba personal de apoyo, sin producir contacto ni lesiones.

Correcciones inmediatas

- Mantener distancia segura de los equipos.
- Uso permanente de vigía durante las maniobras.
- Reforzar la comunicación entre operadores y personal de apoyo.
- Respetar las zonas de exclusión de maquinaria.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

GOLPE LEVE DURANTE TRABAJOS EN BADÉN.

- Durante trabajos de habilitación y colocación de materiales en el badén, un trabajador se golpeó levemente la mano al manipular material, sin consecuencias de consideración.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correcciones inmediatas

- Uso obligatorio de guantes de protección.
- Manipulación adecuada de materiales y herramientas.
- Mantener el área de trabajo ordenada y despejada.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

- Realizar charla previa sobre riesgos de la actividad.

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS		
MES	**ACTOS INSEGUROS**	**CONDICIONES INSEGURAS**
AGOSTO	2	2
TOTAL	**2**	**2**

- Respuesta contra incidentes – accidentes

RESPUESTA CONTRA INCIDENTES-ACCIDENTES				
MESES	**ACCIDENTES/ INCIDENTES REPORTADOS**	**REPORTADOS AL ÁREA**	**ACCIDENTES/INCIDENTES LEVANTADOS**	**EN PROCESO**
AGOSTO (01/08/26 al 31/08/26)	4	4	4	0
ACUMULADO	**4**	**4**	**4**	**0**

- Índice de accidentabilidad

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD	
MES:	**CANTIDAD**
AGOSTO– 2026	0

Durante el mes de agosto el índice de accidentabilidad es de 0.00%, gracias a las acciones preventivas a un sistema de gestión integrado en seguridad y salud ocupacional, las capacitaciones al personal que se reflejan en los resultados finales y la supervisión constante todos los días en cada frente de trabajo.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

3 CONCLUSIONES:

- Cumplimiento de gestión diaria: El área de SST de la empresa contratista realizó diariamente los controles del sistema de gestión para velar por la seguridad física de los trabajadores.
- Durante el mes de agosto se verifico que el encargado del área de SST de la empresa contratista, realiza a diario todos los controles de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, velando por la seguridad física de los trabajadores.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- Durante el mes de agosto se ha tenido un total de 94 trabajadores tiendo un total de 18952.0 horas hombre trabajado, con 0 accidente de trabajo y 3 incidentes reportados.
- Durante el mes de agosto los días 04, 12, 20 y 28 se realizó el reporte de 4 incidentes al área encargada de la empresa contratista, los cuales fueron levantadas las observaciones mediante capacitaciones y talleres durante el mes de agosto.
- Hasta el momento desde el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto se viene trabajando 18952.0 horas hombre sin accidentes, este cumplimiento se debe a la constante capacitación, inducción, entrega de EPP y supervisión.
- Como parte de las medidas de seguridad y coordinación con el área de medio ambiente se viene realizando capacitaciones a la población en general y difundiendo un comunicado radial sobre las medidas de seguridad temporales que se viene teniendo y los horarios de acceso vehicular al lugar turístico Laguna San Nicolas (12 a.m - 1 p.m y de 6 pm. - 7.00 am.).
- Como reporte de las medidas de seguridad y salud en el trabajo el día 31 de agosto el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratista, hizo llegar el INFORME **No. 011-2026-DJCC-SST-CVN** correspondiente al mes de agosto, por lo que el área de SST de la supervisión realizo la revisión verificando el cumplimiento a lo establecido por el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, **por lo que se da conformidad a lo estipulado en dicho documento.**

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

4 ANEXOS:

8.1. PANEL FOTOGRÁFICO.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Ejecución de la partida obras de arte y drenaje : Alcantarillas		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA: Nº01**	**ING. MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se realiza la verificación de uso correcto de EPP. Todo trabajador durante el desarrollo de las actividades debe utilizar su equipo de protección personal.

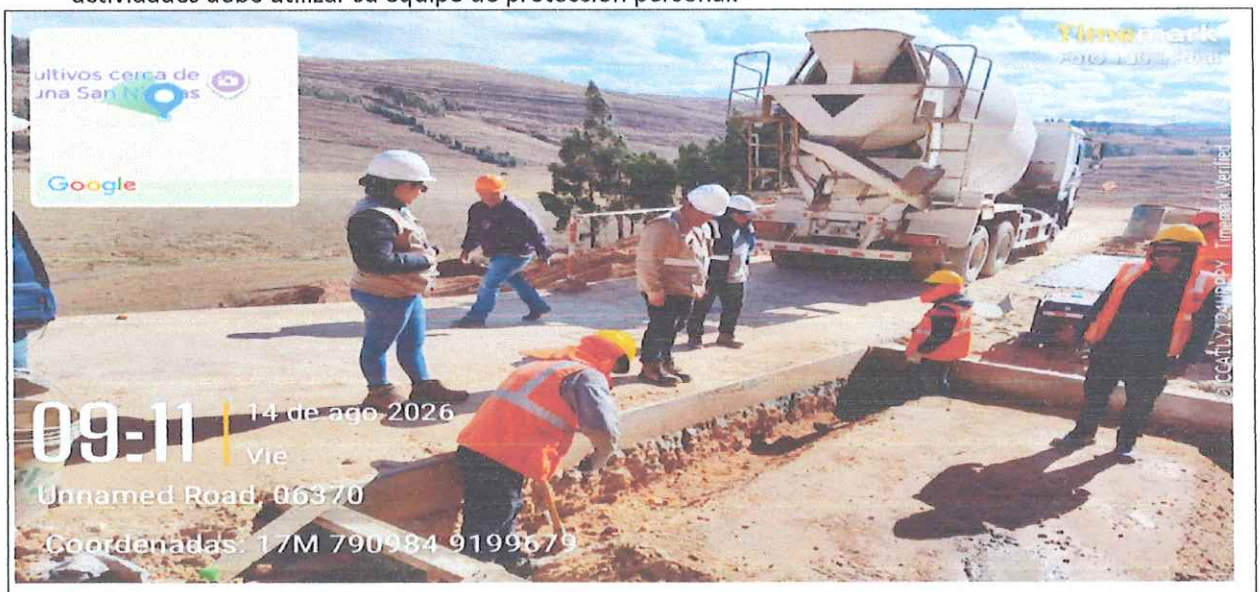

Ejecución de la partida obras de arte y drenaje : Badenes		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA: Nº02**	**ING. MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se verifica que todo el personal encargado de realizar la actividad se encuentre con todos sus equipos de protección necesarios.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROBERTO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

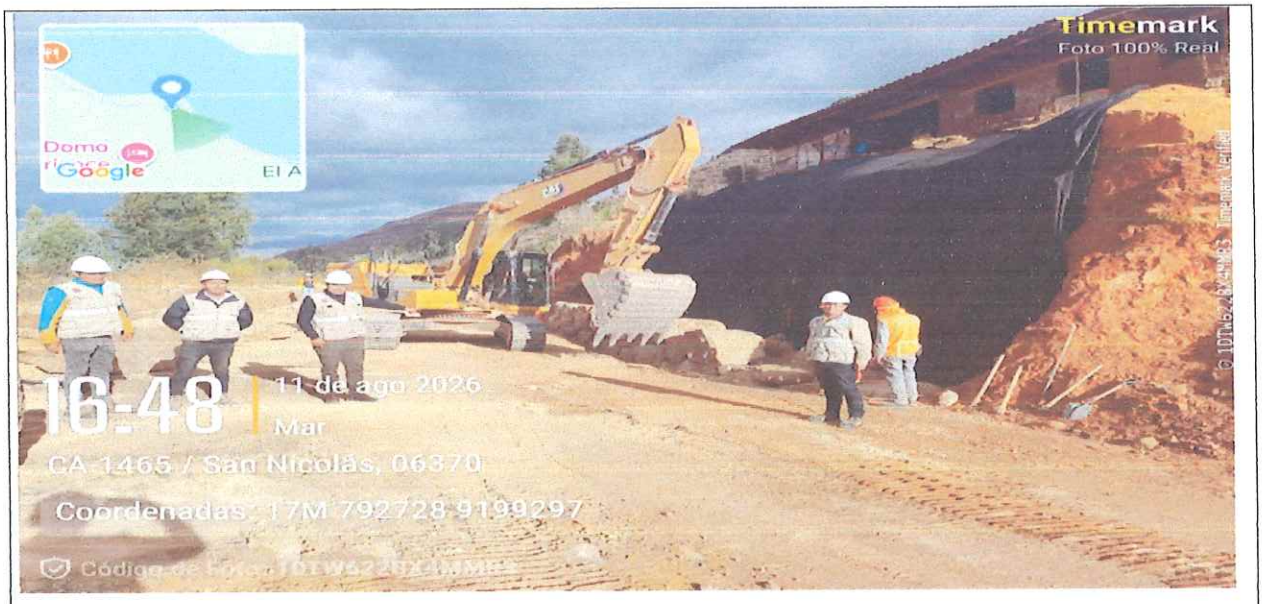

Ejecución de la partida: Enrocado.		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA: Nº03**	**ING. MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se verifico que exista medidas preventivas de SST en la construcción de enrocado.



Ejecución de la partida: 7.02.06 Equipos de Emergencia para Asistencia Medica		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº03	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Estación de emergencia. Se verifico la implementación y ubicación de la estación de emergencia con el fin de brindar atención inmediata ante situaciones de riesgo, como accidentes o desastres naturales.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos



Ejecución de actividades correspondientes: Señalización de área de trabajo		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº05	**MIGUEL ROJAS HONORIO**


- Señalización temporal. Se verifico que en los trabajos realizados, se encuentre señalizado con el fin de controlar y evitar accidentes.

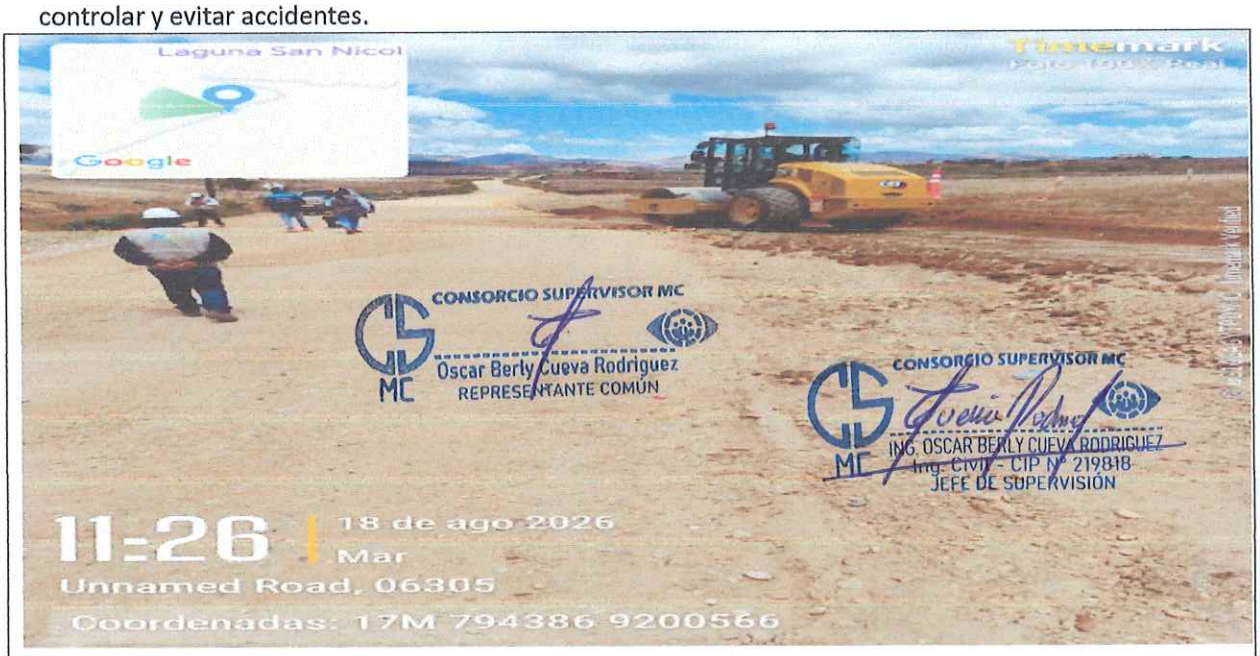

Ejecución de la partida:01.04 Manteamiento de tránsito y seguridad vial durante la ejecución de obra.		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº06	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se viene realizando el mantenimiento de tránsito de todo el tramo que contempla el proyecto.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

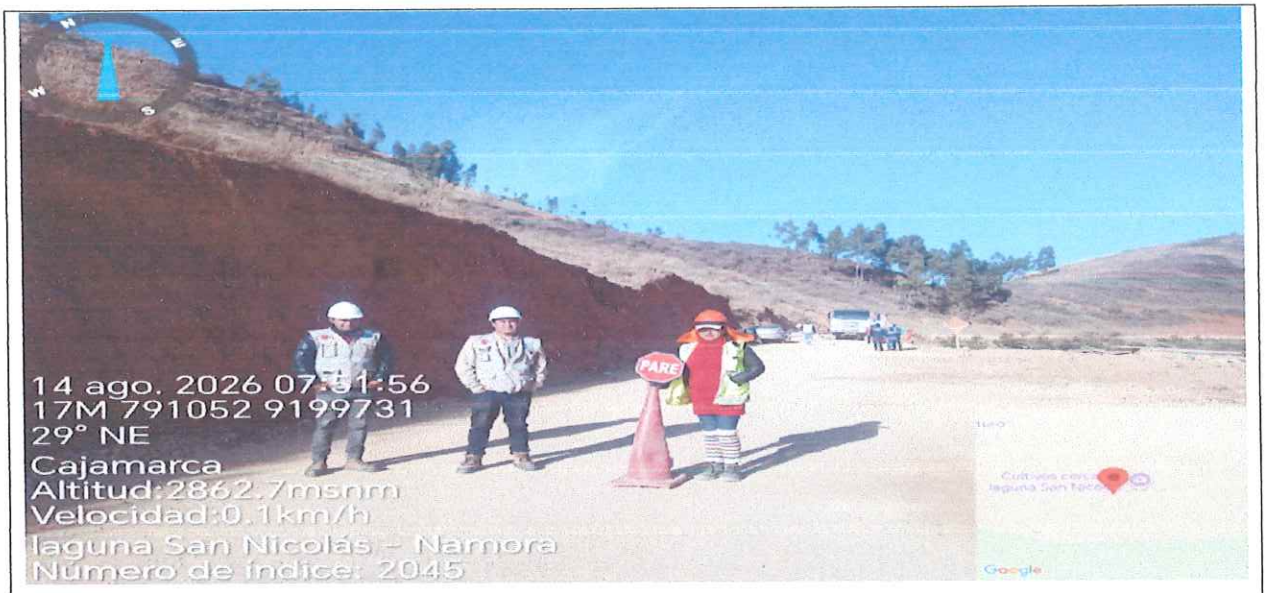

Ejecución de la partida:01.04 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial durante la ejecución de obra.		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº07	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se viene controlando el tránsito vehicular señalizando cada frente de trabajo con vigías y cada una con su radio de comunicación.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BENLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Benly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Ejecución de la partida: Enrocado.		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº08	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se verifica que en el frente de trabajo de enrocado el personal respete el radio de jiro de maquinaria.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos



CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº09	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Charla de 5 minutos. El especialista de seguridad realiza la charla de 5 minutos.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Ejecución de la partida: Alcantarillas		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº10	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Inspección no planificada de EPP, Se verifica que todo el personal que trabaja utilice sus equipos de protección personal.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

1377

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Ejecución de la partida:01.04 Manteamiento de tránsito y seguridad vial durante la ejecución de obra.

FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº11	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Se viene realizando el riego periódico de todo el tramo que contempla el proyecto, evitando el levantamiento de polvo.



Ejecución de actividades correspondientes: Señalización de área de trabajo

FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº12	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Señalización con malla de seguridad el frente de trabajo de construcción de muros.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial - Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

1376


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Ejecución de actividades correspondientes: Señalización de área de trabajo		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº13	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Inspección de áreas de trabajo y verificación de medidas preventivas de los equipos de protección colectivos.

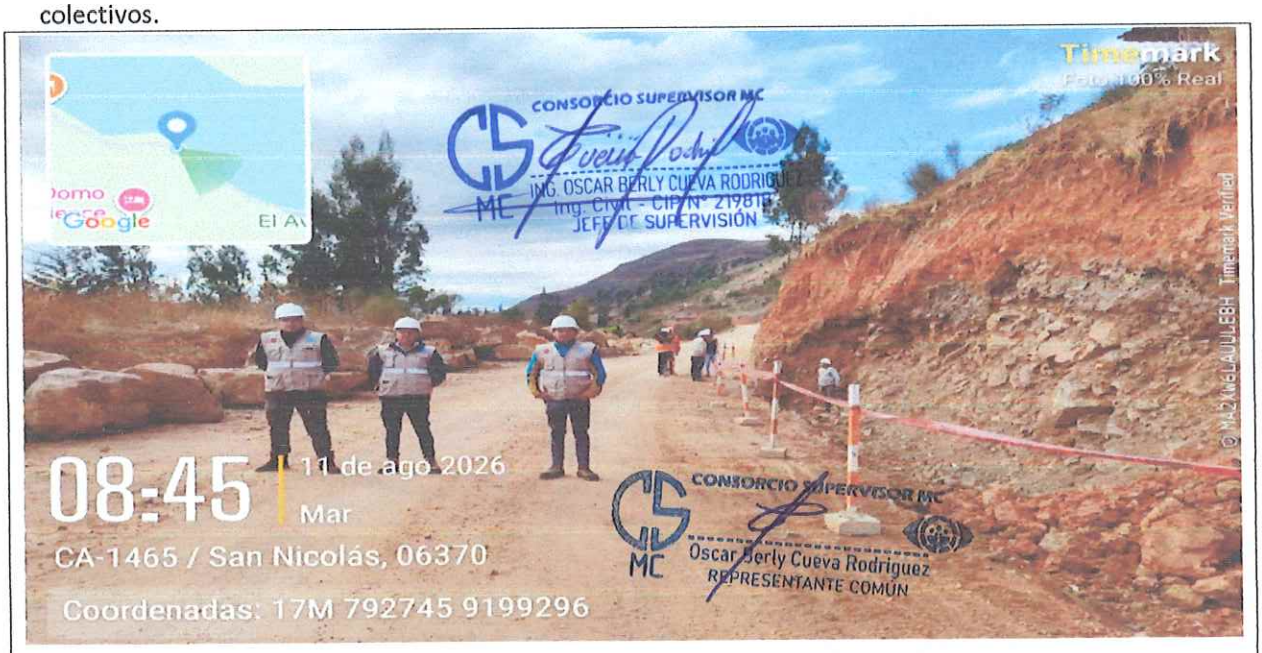

Ejecución de actividades correspondientes: Señalización de área de trabajo		
FUENTE: Elaboración propia	**FOTOGRAFIA:** Nº14	**MIGUEL ROJAS HONORIO**

- Señalización del frente de trabajo de excavación para enrocado.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
MIGUEL ROSENDO ROJAS HONORIO
Ing. Industrial – Reg. CIP N° 222060
Especialista en Seguridad Vial y Prevención de Riesgos

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

N° - A - 0235408

Certificado de Habilidad

1375

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): ROJAS HONORIO MIGUEL ROSENDO

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 222060 Fecha de Incorporación: 11/12/2018

Especialidad: ING. INDUSTRIAL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA, 06 de MAYO del 20 26

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
Decana Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

Especialista Ambiental:

Jhony Maxol Gutiérrez Fernández

CIP N° 96788

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" 1373

INFORME N° 15– 2026 – JMGF – EA

AL : **ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ**
Supervisor de Obra

DEL : ING. JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Especialista Ambiental - Supervisión

ASUNTO : INFORME DE CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026 PRESENTADO POR LA CONTRATISTA

FECHA : Cajamarca, 04 de setiembre del 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, informarle sobre las actividades de supervisión correspondientes a la especialidad ambiental, realizadas durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto del 2026 del Expediente Contractual.

Dicha supervisión se llevó a cabo en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ejecución de la obra: **"Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolás – Empalme PE-3N, distrito de Jesús y distrito de Namora, provincia de Cajamarca, región Cajamarca."**

A continuación, se presenta el informe correspondiente, el cual detalla las acciones ejecutadas, los hallazgos identificados, así como las medidas adoptadas en el ámbito ambiental, en cumplimiento de la normativa vigente y los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental.

En ese sentido, esta supervisión da la conformidad a las partidas valorizadas y a las actividades desarrolladas en el presente periodo por la contratista.

Sin otro tema en particular aprovecho la oportunidad para reiterarles los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" 1372

INFORME AMBIENTAL N° 11 – 2026 – JMGF – EA

Periodo: del 01 al 31 de agosto 2026

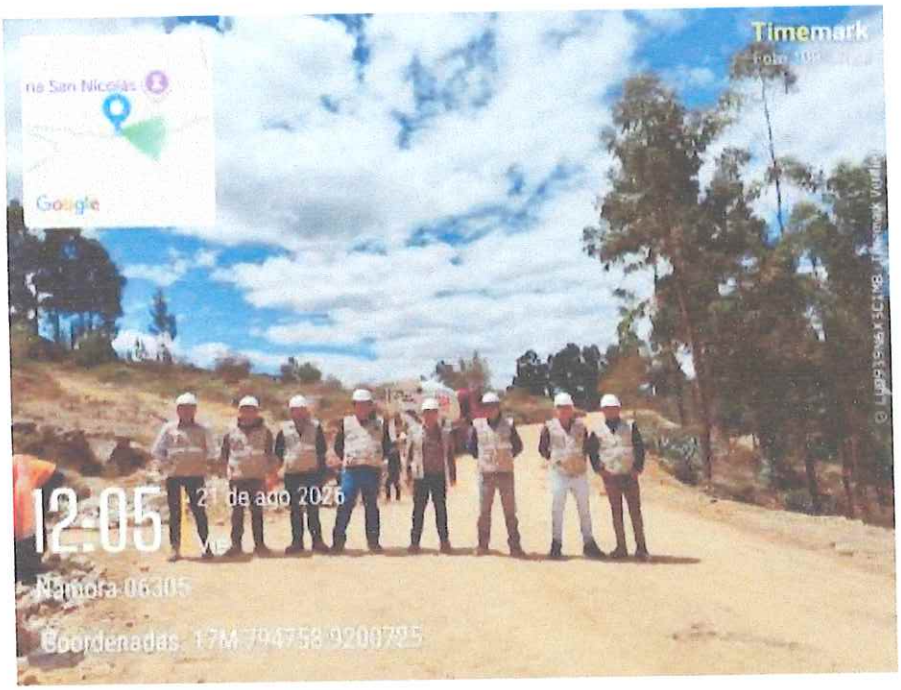

PROYECTO:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE -3N, - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".

TITULAR:
Gobierno Regional de Cajamarca

EJECUTOR:
Consorcio Vial del Norte

SUPERVISOR:
Consorcio Supervisor MC

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

I. ANTECEDENTES.

- Con fecha 09 de julio de 2025, el comité de selección adjudico la buena pro concurso público N° 001-2025-GR.CAJ – primera convocatoria para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **"Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolas- Empalme PE -3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca"**
- El 18 de agosto del 2025 se dio el Inicio oficial del plazo contractual

II. INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental de la obra **"Mejoramiento de la Ruta Tramo: Namora – Laguna San Nicolas- Empalme PE -3N, - Distrito de Jesús - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca, - Distrito de Namora - Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca". Durante el desarrollo de las actividades del proyecto contractual,** con la finalidad de velar por la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente.

El presente documento constituye un informe técnico en el que se describen y sustentan las actividades de prevención, control, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales identificados durante el período de evaluación, en cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto. Asimismo, se presentan las acciones de seguimiento y supervisión implementadas para verificar la adecuada aplicación de las medidas ambientales establecidas, contribuyendo al desarrollo sostenible del proyecto y al cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

III. Objetivos.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Objetivo General

- Informar el estado de implementación de las medidas de manejo ambiental ejecutadas durante el desarrollo de las actividades contractuales del proyecto, evidenciando el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y de la normativa ambiental aplicable durante la ejecución de la obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento, de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental, con el propósito de prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas.

IV. Marco legal.

La implementación del Plan de Manejo Ambiental previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, se sustentan en la legislación ambiental y sectorial vigente. Así tenemos:

- Constitución Política del Perú: Artículos 2, 66, 67 y 68.
- Ley General del Ambiente – Ley N° 28611: Artículo 67.- Del saneamiento básico.
- Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su reglamento con LeyN° 27446: Artículos 2, 3, 4 y 5.
- Decreto Legislativo N° 1078, modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (27446): Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17y 18.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S.N° 019-2009-MINAM).
- Ley General de Residuos Sólidos – DL N° 1278-2017
- D. S. Nº 014-2017-MINAM. Reglamento del D. L. N° 1278, que aprueba la Ley Generalde Residuos Sólidos. De fecha 21/12/2017
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley Nº 29783.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

V. RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO:

Las actividades que se han desarrollado en el presente periodo son las siguientes:

- Operación de áreas auxiliares (DME, PM, Cantera, oficina, almacén, comedor)
- Movimiento de tierras (Rellenos para sub base, excavación con maquinaria para alcantarillas, relleno con material de préstamo, entre otros)
- Preparación de material para sub base en canteras
- Transporte de materiales para sub base
- Transporte y eliminación de material excedente

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

- Obras de concreto simple para obras de arte (alcantarillas)
- Encofrado y desencofrado de obras de arte (alcantarillas y otros.)

VI. RELACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, CONSIDERADOS EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La ejecución del proyecto en mención, conlleva a utilizar máquinas, equipos y vehículos; así como también se utilizan insumos químicos sólidos y líquidos, productos como papel, cartón. Bolsas, embaces, metales, madera, etc. en ese aspecto, se generará impactos, que si no son prevenidos o mitigados pueden afectar a los componentes ambientales como son agua, aire, suelo y a la salud de las personas.

Los impactos y riesgos identificados que se generan por el desarrollo de las actividades del proyecto son los siguientes:

Impactos Ambientales:

1. Alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado.
2. Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas.
3. Incremento de los niveles de ruido.
4. Incremento de los niveles de vibraciones
5. Pérdida del suelo por erosión.
6. Alteración de la calidad visual del paisaje
7. Afectación de la flora por gases contaminantes y polvo
8. Alteración del libre tránsito de vehículos y peatones

Riesgos Ambientales:

1. Probable alteración de la calidad del agua y del suelo por el derrame accidental de hidrocarburos
2. Probable afectación de la salud de los trabajadores y pobladores
3. Probable Ocurrencia de accidentes laborales
4. Probable alteración de la calidad del agua y del suelo por el inadecuado manejo de residuos sólidos, líquidos y de construcción
5. Probable generación de conflictos sociales.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

VII. Medidas de mitigación ambiental desarrolladas:

Las medidas realizadas por el contratista para prevenir, controlar, o mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente, buscando alcanzar niveles aceptables o tolerables (minimizando o eliminando los posibles efectos negativos), en el área de influencia del proyecto, son las siguientes:

7.1 Medidas para prevenir y/o mitigar el impacto: Alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado.

El control de la generación de polvo es una medida ambiental fundamental para prevenir y mitigar los impactos sobre la calidad del aire durante la ejecución de las actividades del proyecto. Su implementación contribuye a proteger la salud de los trabajadores y de la población del área de influencia, además de reducir la afectación a la vegetación circundante ocasionada por la dispersión de material particulado.

En ese contexto, la presente medida se ejecuta en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, con la finalidad de prevenir y controlar la generación de material particulado producto del tránsito de vehículos y del desarrollo de las actividades constructivas.

Durante el presente período de evaluación, la empresa contratista continuó realizando de manera permanente el riego de las vías de acceso, frentes de trabajo y demás superficies expuestas mediante el empleo de dos camiones cisterna, priorizando las zonas con mayor tránsito vehicular y aquellas susceptibles a la emisión de polvo.

La Supervisión viene realizando coordinaciones permanentes con la empresa contratista, con el propósito de identificar oportunamente estas situaciones y verificar la implementación de las medidas de mitigación correspondientes, principalmente el riego periódico de las vías de acceso, frentes de trabajo y demás superficies expuestas, a fin de minimizar la generación y dispersión de material particulado, reduciendo así los impactos negativos sobre la calidad del aire, la salud de los trabajadores y la población del área de influencia del proyecto.


CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

En la imagen se observa la ejecución del riego de la carretera mediante el uso de cisternas, con el fin de controlar y reducir la generación de polvo o material particulado



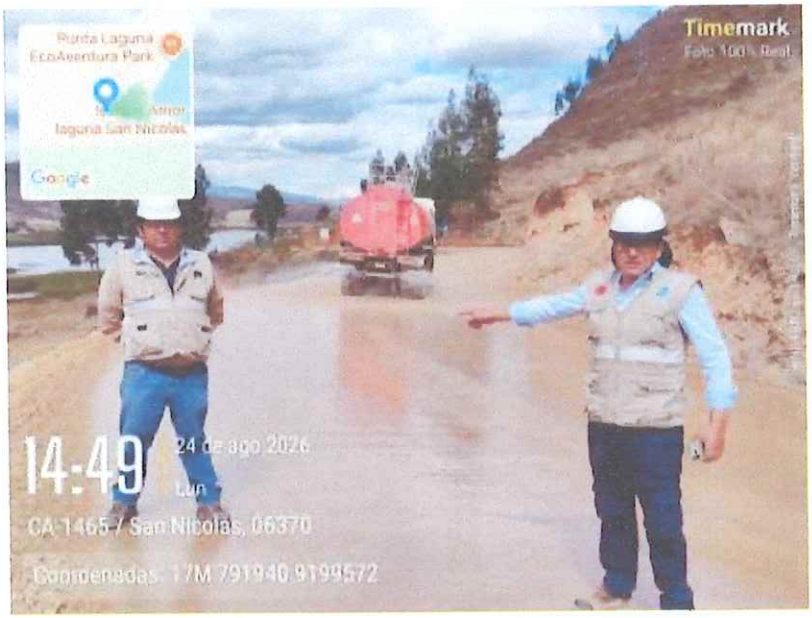

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del monitoreo del aire:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Comparación de resultados de la calidad del aire - ECA Aire

Puntos de Monitoreo	Parámetro	Unidad	ECA - Aire[4]	Resultado	Cumplimiento del ECA
AI-INI	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.119	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.267	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple
AI-PALT	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.293	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.489	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple
AI-VAR	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.101	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.246	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple
AI-CAM	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.133	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.297	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple
AI-LSN	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.229	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.392	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple
AI-CHIL	$PM_{2.5}$ (Bajo Volumen)	µg/m³	100	0.253	Si Cumple
	PM_{10} (Bajo Volumen)		50	0.417	Si Cumple
	SO_2		250	<12.50	Si Cumple
	NO_2		200	<104.17	Si Cumple
	CO		10000	<1250.00	Si Cumple

Elaboración: CEORZA S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el monitoreo de la calidad del aire, las concentraciones registradas de los parámetros evaluados fueron comparadas con los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA-Aire), aprobados mediante el D.S. N.° 003-2017-MINAM. En función de dicha comparación, se establece lo siguiente:

- Las concentraciones registradas de los parámetros $PM_{2.5}$, PM_{10}, SO_2, NO_2 y CO en los puntos de monitoreo AI-INI, AI-PALT, AI-VAR, AI-CAM, AI-LSN y AI-CHIL se encuentran dentro de los valores establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (ECA-Aire), evidenciando el cumplimiento de los valores de referencia establecidos en la normativa ambiental vigente.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHON MAXO GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

7.2 Medidas para prevenir y/o mitigar el impacto: Alteración de la calidad del aire por la generación de emisiones gaseosas.

Las emisiones gaseosas generadas por la operación de vehículos, maquinaria y equipos durante la ejecución de las actividades del proyecto contractual, son prevenidas mediante la implementación de medidas preventivas orientadas a garantizar su adecuado estado de funcionamiento. Para ello, la empresa contratista verifica la vigencia de los certificados de revisión técnica y ejecuta inspecciones periódicas mediante listas de verificación (checklist). Durante el presente período, estas actividades se realizaron de manera continua, disponiéndose la paralización o retiro de cualquier unidad que presente fallas mecánicas o condiciones que puedan incrementar las emisiones contaminantes.

Persoal realizando el checklist del equipo



CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

7.3 Medidas para prevenir y/o mitigar el impacto: Incremento de los niveles de ruido.

Con la finalidad de prevenir y mitigar los impactos asociados al incremento de los niveles de ruido durante la ejecución de la obra, la empresa contratista viene implementando las siguientes medidas de manejo ambiental, de conformidad con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

- Los vehículos, maquinaria pesada y equipos utilizados en la obra reciben mantenimiento preventivo periódico
- El personal que desarrolla actividades en zonas con elevados niveles de presión sonora utiliza de manera obligatoria equipos de protección personal (EPP), tales como protectores auditivos tipo tapón u orejera.
- Las actividades que generan mayores niveles de ruido se ejecutan exclusivamente dentro del horario autorizado de trabajo, evitando su realización en horas nocturnas o en períodos de descanso de la población del área de influencia.
- Se restringe el uso de bocinas, sirenas y otros dispositivos sonoros únicamente para situaciones operativas o de emergencia debidamente justificadas.
- Se controla el acceso de personas ajenas a las áreas donde se desarrollan actividades con generación de ruido, mediante señalización preventiva y delimitación de las zonas de trabajo.
- La Supervisión realiza el seguimiento permanente al cumplimiento de estas medidas, verificando su adecuada implementación y disponiendo la adopción de acciones correctivas cuando corresponda, con el fin de minimizar las molestias a la población y proteger la salud de los trabajadores.

En el siguiente cuadro se muestra los resultados del ruido diurno y nocturno obtenidos.

Comparación de resultados de Ruido con e/ ECA - Ruido Diurno

Punto de Monitoreo	Unidad	LAeqT	ECA Ruido – D.S N' 085-2003-PCM		Cumplimiento de la norma
RU-PALT	LAeqt	52.03	60	Zona Residencial Horario Diurno	Cumple
RU-LSN		51.75			Cumple
RU-CHIL		55.86			Cumple

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Comparación de resultados de Ruido con e/ ECA - Ruido Nocturno

Punto de Monitoreo	Unidad	LAeqT	ECA Ruido – D.S N° 085-2003-PCM		Cumplimiento de la norma
RU-PALT	LAeqt	40.66	50	Zona Residencial Horario Nocturno	Cumple
RU-LSN		43.32			Cumple
RU-CHIL		45.15			Cumple

Elaboración: CEORZA S.A.C.

De acuerdo con los resultados obtenidos para el ruido, los cuales fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para ruido en horario diurno/nocturno para zona residencial, se puede concluir lo siguiente:

- En las tres estaciones de monitoreo de niveles de ruido RIJ-PALT, RU LSN y RU-CHIL, se realizaron mediciones durante el horario diurno/nocturno; donde los resultados obtenidos cumplen con los límites establecidos por los Estándares de Calidad Ambiental para zonas residenciales

7.4 Medidas para evitar yo mitigar el impacto: incremento de los niveles de vibraciones.

Durante la ejecución de las actividades del proyecto, se ha utilizado rodillo liso vibratorio para realizar los trabajos de compactación a lo largo de la carretera. El funcionamiento de este equipo genera vibraciones de manera inherente al proceso de compactación; sin embargo, debido a que los componentes intervenidos se encuentran alejados de viviendas, edificaciones, infraestructura sensible y otras estructuras susceptibles de afectación, no se prevé que dichas vibraciones generen impactos significativos sobre terceros o sobre las estructuras existentes.

Asimismo, las vibraciones producidas se presentan únicamente durante periodos cortos y asociados a las actividades específicas de compactación, por lo que su carácter es temporal, localizado y reversible. No obstante, como medida preventiva, se implementarán acciones destinadas a minimizar la generación y propagación de vibraciones durante la ejecución de los trabajos.

Entre las principales medidas de prevención y mitigación se consideran:

- Realizar la compactación mediante el **uso adecuado del rodillo vibratorio**, evitando operar el equipo a intensidades o frecuencias superiores a las necesarias para alcanzar el grado de compactación requerido.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

- **Mantener el equipo en buenas condiciones mecánicas**, efectuando revisiones y mantenimiento preventivo para evitar vibraciones anormales ocasionadas por desperfectos, piezas sueltas o desgaste de componentes.
- Limitar el funcionamiento del sistema vibratorio **exclusivamente al área y al tiempo estrictamente necesarios,** evitando mantener la vibración del equipo cuando este se encuentre detenido o fuera de la zona efectiva de compactación.
- Evitar, en lo posible, la ejecución simultánea de **varios equipos vibratorios** en zonas próximas, a fin de reducir la acumulación de vibraciones.
- Mantener una **distancia preventiva respecto de viviendas, estructuras existentes, instalaciones u otros elementos sensibles**, cuando las condiciones del terreno y de la actividad lo permitan.
- En sectores donde eventualmente se identifique la presencia de estructuras cercanas, evaluar previamente las condiciones del terreno y, de ser necesario, **reducir la intensidad de vibración, modificar el método de compactación o utilizar equipos de menor impacto vibratorio**.
- Evitar realizar trabajos que generen vibraciones intensas durante periodos prolongados y, cuando sea técnicamente viable, concentrar estas actividades dentro del **horario establecido para la ejecución de la obra**.


Supervisión de actividades que generan vibraciones y comprobación del cumplimiento de las medidas de seguridad en los frentes de trabajo.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

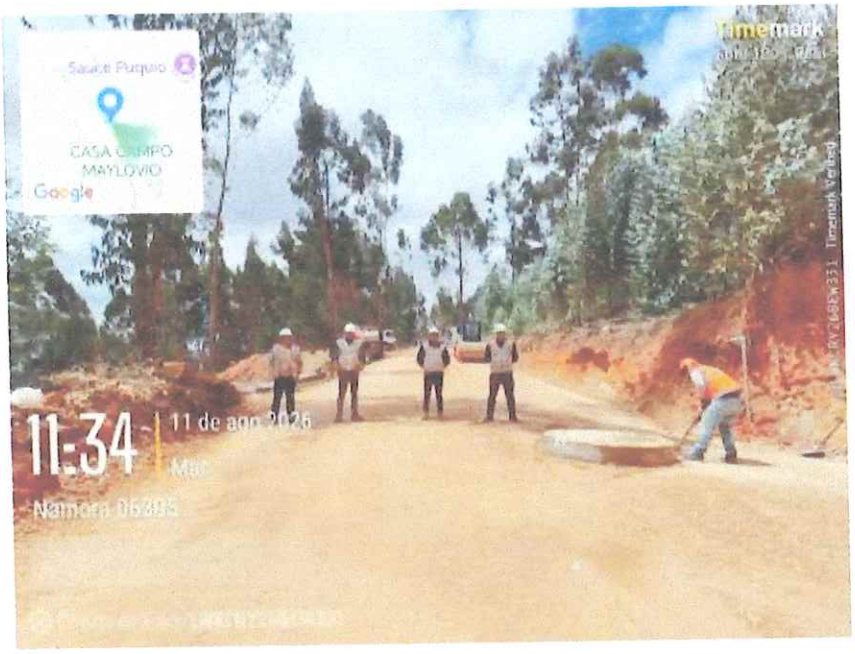

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los monitoreos de vibraciones.

Resultados de la medición de vibraciones

Punto de medición	Fecha y hora de medición	Valores de vibración m/s^2	Clasificación según índices de reacción
VI-LSN	16-07-2026 03:00 pm	0.0106	No Molesto

Elaboración: Ceorza S.A.C

De acuerdo con los resultados obtenidos para vibraciones en el punto de monitoreo VI-LSN, podemos precisar que:

- El resultado obtenido en la estación VI-LSN, reportó un nivel de vibración NO MOLESTO, según lo establecido en la norma NTP ISO 2631-1.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

7.5 Medidas para evitar y/o mitigar el impacto; Pérdida de suelo por erosión.

Durante el presente período se verificó que la empresa contratista ejecutó las actividades de excavación de acuerdo con las especificaciones establecidas en el expediente técnico, procurando mantener la estabilidad de los taludes y minimizar la ocurrencia de procesos erosivos. En este sentido, la construcción de los muros de contención permitirá estabilizar y sostener los suelos que presentan condiciones de susceptibilidad a movimientos y deslizamientos, contribuyendo a reducir la pérdida de material y mejorar la estabilidad de las áreas intervenidas.

Asimismo, la ejecución de los badenes y alcantarillas con revestimiento de concreto permitirá controlar el escurrimiento superficial y disminuir la acción erosiva del agua sobre la superficie del terreno. El revestimiento constituye una medida de protección frente a la erosión hídrica, especialmente durante eventos de precipitación y escorrentía superficial, reduciendo el arrastre de partículas y la consecuente pérdida de suelo.

Durante la ejecución de las actividades del proyecto, particularmente en los trabajos de excavación para la construcción de los cimientos de los muros y demás componentes, se viene aplicando un manejo orientado a reducir el tiempo de exposición del suelo. En tal sentido, las excavaciones se ejecutan de manera progresiva y, una vez concluidos los trabajos correspondientes, se procede en el menor tiempo posible con el relleno, compactación y cobertura de las áreas intervenidas, utilizando los materiales establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Esta metodología permite reducir la exposición temporal de los suelos desnudos a la acción de las precipitaciones, escorrentías superficiales y otros agentes erosivos, minimizando el riesgo de arrastre de partículas, formación de surcos o cárcavas y pérdida de suelo durante la etapa constructiva.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

Vista de la construcción del baden.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

7.6 Medidas para evitar y/o mitigar la Alteración de la calidad visual del paisaje.

Con respecto a las medidas orientadas a evitar y/o mitigar la alteración de la calidad visual del paisaje, la Contratista ha continuado implementando y reforzando las acciones de manejo ambiental previstas para los frentes de trabajo, procurando que las actividades constructivas se desarrollen de manera ordenada, controlada y dentro de las áreas autorizadas. Estas medidas tienen como finalidad reducir la presencia de elementos que puedan generar un impacto visual negativo sobre el entorno, así como prevenir la ocupación innecesaria de áreas naturales o espacios no contemplados por el proyecto.

Entre las principales acciones implementadas se destacan las siguientes:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

- **Delimitación y señalización de los frentes de trabajo:** se mantiene la delimitación estricta de las áreas donde se desarrollan las actividades constructivas, mediante señalización visible y adecuada, con la finalidad de evitar intervenciones, tránsito de maquinaria, almacenamiento de materiales o disposición de residuos fuera de las áreas autorizadas.
- **Control de las áreas de intervención:** se ha establecido la prohibición expresa de ejecutar actividades en espacios ajenos al área autorizada del proyecto,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

incluyendo excavaciones, acopios de materiales, instalación de estructuras temporales o cualquier otra intervención no contemplada. Esta medida permite prevenir afectaciones innecesarias sobre la cobertura vegetal, el suelo y los componentes paisajísticos del entorno.

- **Orden y limpieza de los frentes de trabajo:** se viene procurando mantener los frentes de trabajo libres de materiales, residuos, herramientas y elementos innecesarios que puedan generar una percepción de desorden o deterioro visual. Asimismo, se realiza la limpieza periódica de las áreas intervenidas, especialmente al culminar las actividades programadas.
- **Manejo adecuado de residuos sólidos:** los residuos generados durante las actividades constructivas son recolectados, segregados y almacenados temporalmente de manera adecuada, para posteriormente ser trasladados y dispuestos mediante los mecanismos establecidos y conforme a la normativa ambiental vigente.
- **Control de materiales y elementos temporales:** se procura que los materiales de construcción, equipos, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecución de la obra permanezcan únicamente en las áreas previamente habilitadas para tal fin, evitando su dispersión hacia sectores colindantes o áreas ambientalmente sensibles.
- **Sensibilización del personal:** se brinda orientación al personal involucrado en las actividades de obra respecto a la importancia de mantener el orden y la limpieza de los frentes de trabajo, así como de respetar las áreas autorizadas y las medidas establecidas para la protección del entorno paisajístico.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

7.7 Medidas para evitar y/o mitigar el impacto Alteración de la flora por gases contaminantes y polvo

Con el objetivo de mitigar los impactos ambientales asociados a la alteración de la flora por la emisión de gases contaminantes y la dispersión de material particulado (polvo), la contratista continúa implementando las medidas preventivas y de control, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Entre estas acciones, se destaca la ejecución regular del riego de la vía mediante el uso de dos camiones cisterna, lo cual contribuye a la reducción significativa del polvo generado por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, especialmente en tramos de intervención.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Adicionalmente, se ha constatado que la contratista realiza la verificación del estado operativo de todos los vehículos, maquinaria y equipos que participan en la obra.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

mediante el uso de checklist de inspección diaria. Esta práctica permite asegurar que los equipos se encuentren en buen estado mecánico, reduciendo el riesgo de emisiones contaminantes debido a combustión ineficiente o fugas de fluidos.

7.8 Medidas para evitar yo mitigar el impacto: Alteración del libre tránsito de vehículos y peatones

En relación con las medidas implementadas para prevenir y mitigar la alteración del libre tránsito de vehículos y peatones durante la ejecución de la obra, la Supervisión verificó que la empresa contratista continúa gestionando esta situación mediante la asignación permanente de personal vigía en los frentes de trabajo donde las actividades constructivas generan interferencias temporales sobre la vía.

El personal vigía tiene la responsabilidad de regular y orientar el tránsito vehicular y peatonal, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía, de la población del área de influencia y del personal de obra. Asimismo, las actividades constructivas se ejecutan de forma planificada y por etapas, permitiendo la habilitación progresiva de los tramos intervenidos una vez concluidas las labores programadas.


La implementación de estas medidas contribuye a mantener la continuidad del tránsito, reducir los tiempos de espera, prevenir la congestión vehicular y minimizar las molestias ocasionadas a la población local, transportistas y turistas que circulan por el área de influencia del proyecto, en concordancia con las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Señalización Temporal de la obra.

Así mismo la contratista ha colocado también letreros de señalización a lo largo de la vía para regular el tránsito.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil – CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

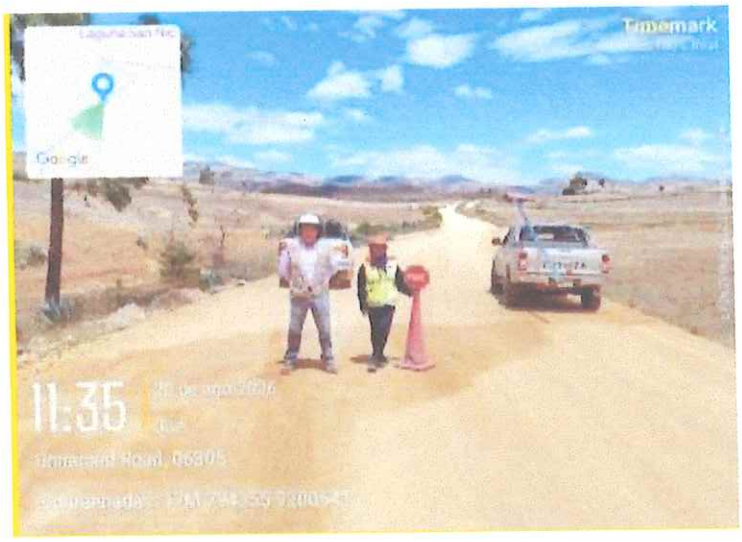

Personal vigía, dirige el tránsito vehicular en el área de trabajo

Panel informativo donde se publica los horarios de tránsito y otros.



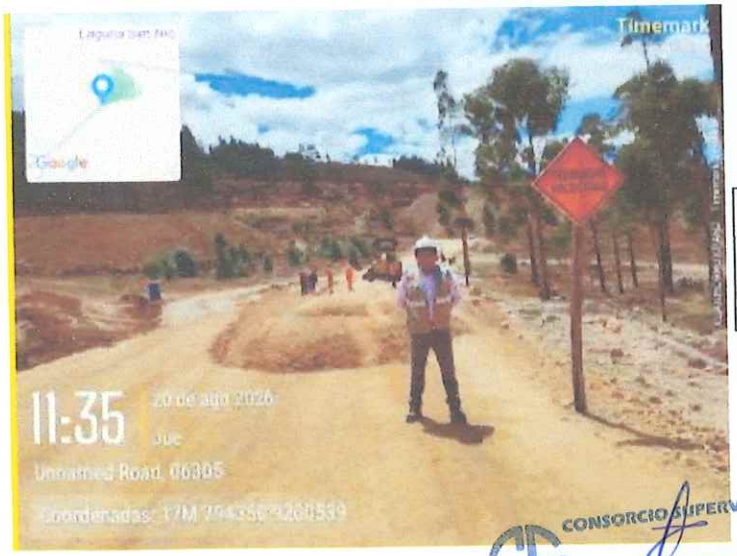

Vista de letreros de señalización instalados en toda la vía

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

VIII. Riesgos Ambientales:

9.1. Probable alteración de la calidad del agua y del suelo por el derrame accidental de hidrocarburos.

Con el fin de prevenir la contaminación del agua y del suelo por derrames accidentales de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, la empresa contratista mantiene un almacenamiento seguro de combustibles en un área techada, delimitada e impermeabilizada con geomembrana. Asimismo, dispone de un kit antiderrames para la atención inmediata de emergencias y restringe el acceso únicamente al personal autorizado, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En la vista se observa el almacenamiento de combustibles sobre suelo impermeabilizado con geomembrana y bajo techo, además se cuenta con sacos de arena y kit anti derrames para mitigar derrames en caso corresponda.



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

135'

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Vista del KIT anti derrames.



Con el fin de evitar la contaminación del suelo y del agua por residuos líquidos o excretas del personal, la contratista ha implementado medidas de saneamiento como son el alquiler de baños para el personal de obra, ubicado en el campamento km 8+100, en otros frentes se cuenta también con letrinas de hoyo seco.

Estas acciones contribuyen a mantener condiciones higiénicas apropiadas y a prevenir impactos negativos sobre los recursos naturales y la salud del personal.


Vista de las letrinas alquiladas en el campamento (oficinas, almacén central, patio de máquinas y comedor)



CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. CIVIL - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

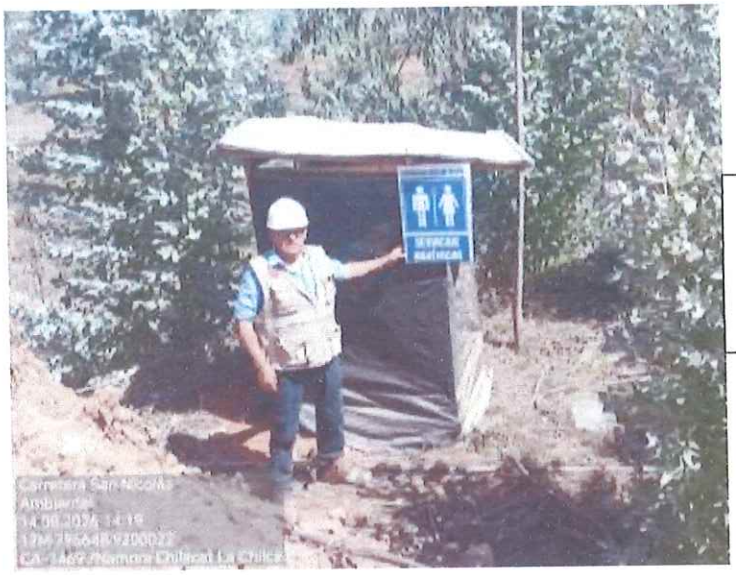

Letrina ubicada en la cantera, de la cual se está extrayendo el material para base de la carretera.

Resultados de monitoreo de suelos

Punto de Monitoreo	Parámetro	Unidad	L.C.M	ECA - Suelo Comercial	Resultado	Cumplimiento del ECA
SU-LSNA	Fracción de Hidrocarburos F1 (>C6-C10)	mg/Kg	2.010	500	<2,010	Si Cumple
	Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28)	mg/Kg	10.000	5000	<10,000	Si Cumple

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHON MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental - Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Punto de Monitoreo	Parámetro	Unidad	L.C.M	ECA - Suelo Comercial	Resultado	Cumplimiento del ECA
	Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40)	mg/Kg	10.000	6000	<10,000	Si Cumple
	Arsénico	mg/Kg	0.10	140	3,56	Si Cumple
	Bario Total	mg/Kg	0.03	2000	103,15	Si Cumple
	Cadmio	mg/Kg	0.020	22	0,179	Si Cumple
	Mercurio	mg/Kg	0.01	24	<0,04	Si Cumple
	Plomo	mg/Kg	0.20	800	13,86	Si Cumple
	Cromo VI	mg/Kg	0.30	1,4	<0,30	Si Cumple
	Cianuro Libre	mg/Kg	0.5	8	<5	Si Cumple
SU-LSNP	Fracción de Hidrocarburos F1 (>C6-C10)	mg/Kg	2.010	500	<2,010	Si Cumple
	Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28)	mg/Kg	10.000	5000	<10,000	Si Cumple
	Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40)	mg/Kg	10.000	6000	<10,000	Si Cumple
	Arsénico	mg/Kg	0.10	140	3,11	Si Cumple
	Bario Total	mg/Kg	0.03	2000	126,24	Si Cumple
	Cadmio	mg/Kg	0.020	22	0,06	Si Cumple
	Mercurio	mg/Kg	0.01	24	<0,04	Si Cumple
	Plomo	mg/Kg	0.20	800	10,99	Si Cumple
	Cromo VI	mg/Kg	0.30	1,4	<0,30	Si Cumple
	Cianuro Libre	mg/Kg	0.5	8	<5	Si Cumple

Fuente: Analytical Laboratory E.I.R.L (ALAB)
Nota: "<"= Menor que el L.C.M., son aquellos resultados que están por debajo del L.C.M.: Límite de cuantificación del método.
Elaboración: CEORZA S.A.C.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos en el monitoreo de calidad ambiental del suelo, se evaluaron dos puntos de muestreo (SU LSNA y SU LSNP), realizando la comparación con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo - categoría Comercial, conforme a la normativa vigente.

- En los puntos de monitoreo SU-LSNA, SIJ-LSNP, se evaluaron los parámetros correspondientes a la fracción de hidrocarburos (FI /F2/F3) y metales como arsénico, bario, cadmio, mercurio, plomo, además de cianuro libre y cromo VI

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXCL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

- Respecto al ambos puntos (SU-LSNA y SIJ-LSNP) ningún parámetro sobrepasa los ECA-SUELO.

Comparación de resultados con el ECA - Agua

Parámetro	Unidad	Normativa		L.C.M	Estación de monitoreo				
		D.S. 004-2017-MINAM Categoría 3 Subcategoría D1	D.S. 004-2017-MINAM Categoría 3 Subcategoría D2		LSNIC-01	RCHAQ1-01	RCHAQ2-02	RNAM-01	RNAM-02
Fisicoquímicos									
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5	6,5 – 8,4	0,01000	6,66	6,61	6,96	6,62	6,76
Oxígeno Disuelto (Valor mínimo)	mg/L	≥ 4	≥ 5	0,10000	8,4	8,5	8,86	8,54	8,36
Aceites y grasas	mg/L	5	10	0,50000	<5	<5	<5	<5	<5
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	-	-	5,00000	9,4	<5	5,8	<5	<5
Color	Color Verdadero Escala Pt/Co	100 (a)	100 (a)	5,00000	<5	<5	<5	<5	<5
Conductividad	µS/cm	2500	5000	0,01000	525	251	299	205,8	197,1
Inorgánicos									
Aluminio	mg/L	5	5	0,00300	0,037	0,31	0,021	0,023	0,012
Arsénico	mg/L	0,1	0,2	0,00100	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Bario	mg/L	0,7	-	0,00030	0,00643	0,06103	0,09453	0,01591	0,01471
Berilio	mg/L	0,1	0,1	0,00030	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Boro	mg/L	1	5	0,00100	0,0052	0,0037	0,0024	0,018	0,0016
Cadmio	mg/L	0,01	0,05	0,00020	0,0013	0,0019	0,0019	0,0018	0,0016
Cobre	mg/L	0,2	0,5	0,00020	<0,0002	<0,0002	<0,0002	0,0005	0,0003
Cobalto	mg/L	0,05	1	0,00200	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020
Cromo Total	mg/L	0,1	1	0,00030	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003	<0,0003
Hierro	mg/L	5	-	0,00200	0,399	0,26	0,322	0,107	0,076
Litio	mg/L	2.5	2,5	0,00010	0,00568	0,00169	0,00171	0,00154	0,00154
Magnesio	mg/L	-	250	0,00200	37,6861	2,789	3,1054	1,4487	1,4106
Manganeso	mg/L	0,2	0,2	0,00005	<0,01893	0,08037	0,09271	0,01473	0,01161
Mercurio	mg/L	0,001	0,01	0,00010	<0,000100	<0,000100	<0,000100	<0,000100	<0,000100
Níquel	mg/L	0,2	1	0,00040	<0,0004	0,0005	0,0006	0,0005	<0,0004
Plomo	mg/L	0,05	0,05	0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100
Selenio	mg/L	0,02	0,05	0,00200	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020	<0,0020
Zinc	mg/L	2	24	0,000200	0,0218	0,009	0,007	0,0107	0,0102

Fuente: D.S. N° 004-2017-MINAM
Nota: "<"= Menor que el L.C.M., son aquellos resultados que están por debajo del L.C.M.: Límite de cuantificación del método.
Elaboración: CEORZA S.A.C.

De acuerdo con el resultado obtenido para la evaluación de la calidad del agua en los puntos de monitoreo LSNIC-OI, RCHAQI -01, RCHAQ2-02, RNAM-OI y RNAM-02, se concluye 10 siguiente:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental - Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

- En los cinco puntos de monitoreo se evaluaron los siguientes parámetros: Potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto, aceites y grasas, sólidos suspendidos totales, color, conductividad y metales totales como (aluminio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, cobalto, cromo, cobalto, hierro, litio, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc)
- Los parámetros como el potencial de hidrógeno (pH), oxígeno disuelto, aceites y grasas, conductividad, color y metales totales como (aluminio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, cobalto, cromo, cobalto, hierro, litio, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc) cumplen con los límites establecidos por los estándares de calidad ambiental para agua, en las categorías 3 DI (riego de vegetales) y D2 (agua para bebida de animales)
- El parámetro de sólidos suspendidos totales no se encuentra dentro de los estándares ambiental para agua, en las categorías 3 DI (riego de vegetales) y D2 (agua para bebida de animales)

9.2. Probable afectación de la salud de los trabajadores y pobladores.

Para evitar la afectación de la salud de los de los trabajadores y pobladores, la contratista viene realizando lo siguiente:

★ Todo equipo, máquina y vehículo cuentan con atenuadores de ruidos y su certificado de revisión técnica, para evitar la generación excesiva de ruido.

★ El Contratista garantiza que todos sus trabajadores están sanos y en buenas condiciones físicas y que no presentan problemas médicos preexistentes.

★ Todos los trabajadores cuentan con equipos de protección personal (EPP) de acuerdo con el análisis de riesgos de cada actividad.

★ Señalizar el área de trabajo, y no permitir el acercamiento de personas ajenas.

★ Para el cuidado de la población local que reside en el área de influencia directa, se viene previniendo, mitigando y/o controlando los efectos adversos hacia el aire (gases, partículas y ruidos), aplicando las medidas de Prevención, Mitigación o Corrección planteadas en el presente informe.

★ El contratista menciona que todo el personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental - Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

9.3. Probable Ocurrencia de accidentes laborales.

Las medidas que se han realizado para evitar accidentes en los trabajadores son las siguientes:

- No se permite al personal de obra el consumo de bebidas alcohólicas durante el horario de trabajo.
- No se permite el juego de manos entre trabajadores, durante el horario de trabajo.
- Se viene verificando diariamente que todo el personal de obra utilice EPP de acuerdo a la actividad que realice.
- Se viene realizando charlas diarias a todos los trabajadores de la obra, donde se tocan temas acordes a las actividades que realizan, y sobre la seguridad y medio ambiente.
- Se verifica que las áreas de trabajo permanezcan bien señalizadas, además no se permite el ingreso de personas ajenas al área de trabajo.
- Todo el personal usará el debido equipo de protección personal adecuado para el tipo de actividad que realice. Cada empleado es responsable de verificar el correcto estado y uso del EPP.
- Orden y limpieza en los frentes de trabajo.

Charlas de 5 minutos impartidas a los trabajadores

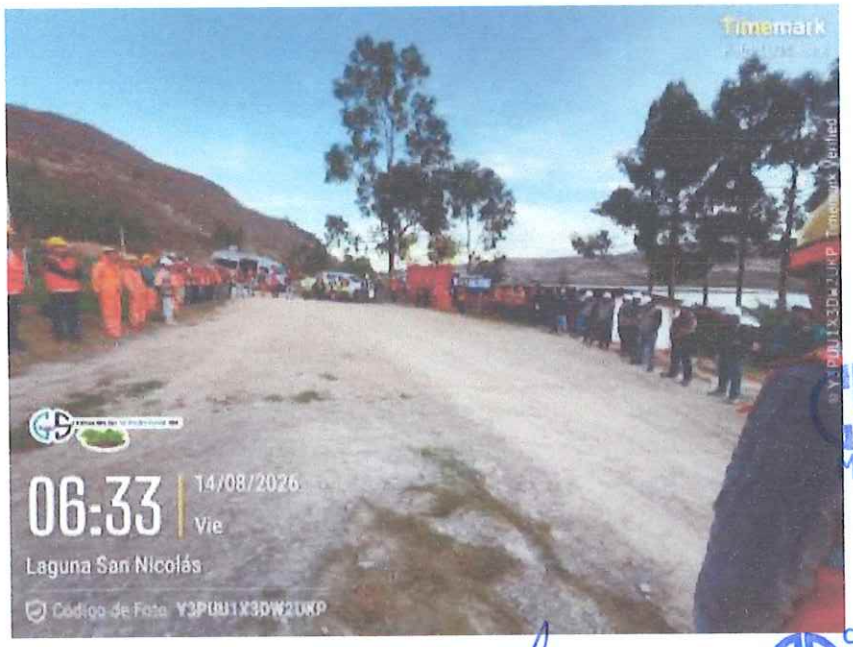

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental


9.4. Probable alteración de la calidad del agua y del suelo por el inadecuado manejo de residuos sólidos, líquidos y de construcción

Respecto a esta medida, la contratista viene implementando acciones de manejo de residuos sólidos conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado mediante el D.S. N.º 014-2017-MINAM, y la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 "Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos".

En la obra, se han dispuesto contenedores debidamente señalizados para el almacenamiento temporal de los distintos tipos de residuos, conforme al código de colores indicado en la normativa vigente. Asimismo, se realiza de manera periódica la limpieza de los frentes de trabajo, actividad que está a cargo de personal asignado exclusivamente a esta labor, garantizando así condiciones adecuadas de orden y salubridad durante la ejecución de las actividades.

Una vez recolectados, los residuos son trasladados a un área de almacenamiento temporal, la cual cuenta con condiciones adecuadas: está techada y posee un suelo impermeabilizado, lo que previene filtraciones y posibles impactos ambientales. Cuando se acumula un volumen significativo de residuos, estos son transportados al relleno sanitario autorizado de la localidad para su disposición final, cumpliendo previamente con los permisos y autorizaciones requeridas por la normativa ambiental aplicable.

En la vista se observa, el área para el acopio temporal de los residuos sólidos generados en obra.

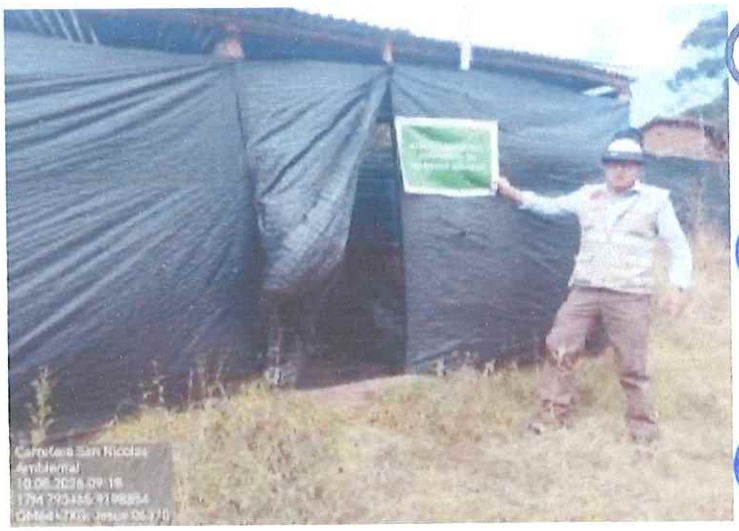

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental


1347

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Vista del punto ecológico (contenedores de residuos sólidos) para la segregación y almacenamiento temporal de dichos residuos.

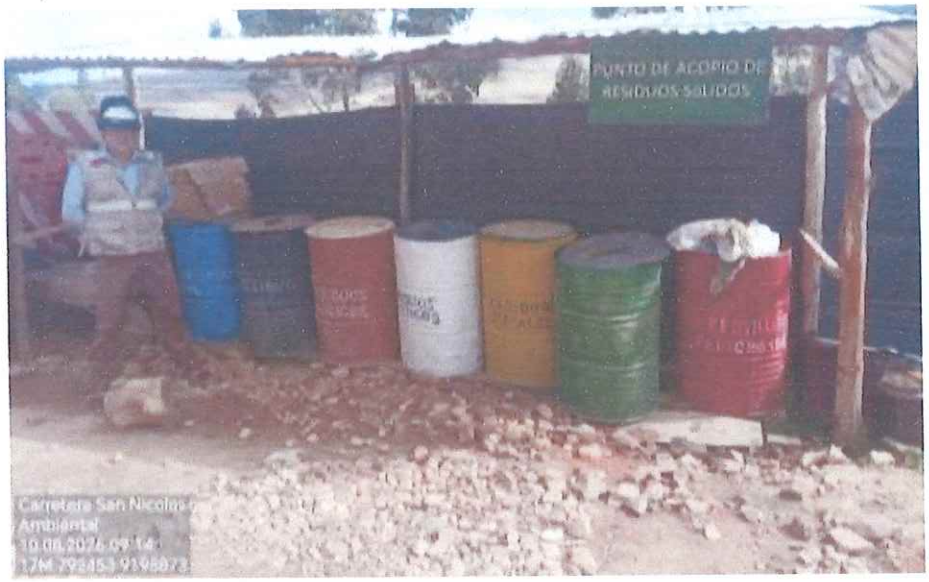

Vista de los contenedores de residuos en la cantera samaday

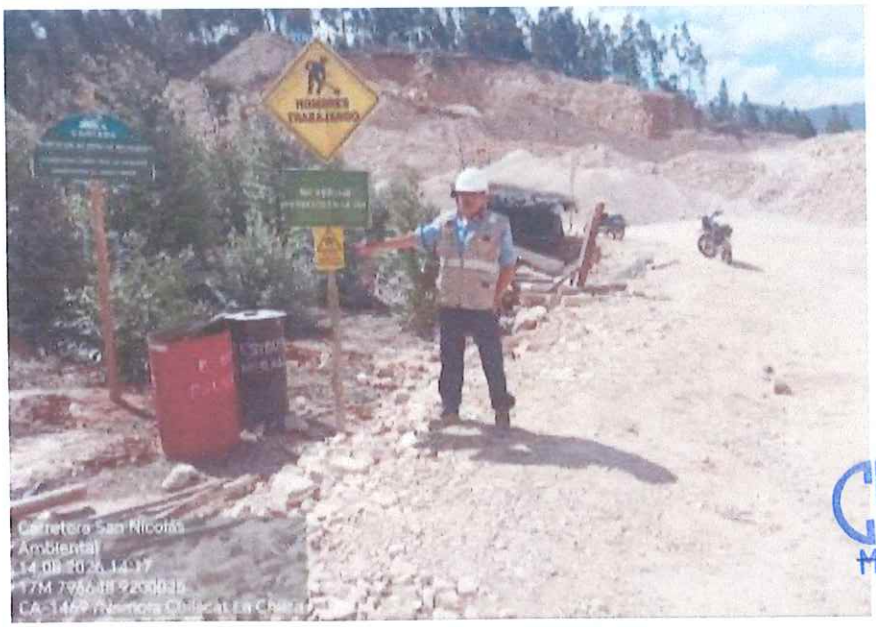

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

9.5. Probable generación de conflictos sociales.

Respecto a estas medidas de riesgos, la contratista viene coordinando con la población de la zona, y absolviendo sus dudas sobre trabajos, sobre el plan de afectaciones y compensaciones, ente otras.

El contratista cuenta con una oficina de atención al ciudadano, donde se atiende a los pobladores que visitan para hacer consultas, resolver dudas o recomendaciones, la contratista cuenta con un personal para este tipo de actividades.

Cabe indicar también que como parte de la participación ciudadana, se sigue contando con el buzón de sugerencias en las oficinas del contratista, para que los pobladores que no tienen la facilidad de expresarse en público, lo hagan mediante el buzón de sugerencias.

En el área de campamento se cuenta con panel informativo, donde la contratista informa pegando afiches, algunos aspectos del proyecto y el cuidado del medio ambiente





Vista del buzón de sugerencias instalado en las oficinas de atención al ciudadano

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

Reunión entre contratista, supervisión y la población.



9.6. Probable generación de incendios.

Con el propósito de prevenir la ocurrencia de incendios durante la ejecución de la obra, la empresa contratista ha implementado medidas preventivas y de respuesta inmediata en las áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de riesgos, tales como zonas de almacenamiento de combustibles, campamento y frentes de trabajo.

Entre las principales medidas adoptadas, se ha verificado la instalación de extintores portátiles del tipo y capacidad adecuados, ubicados en lugares estratégicos, debidamente señalizados y de fácil acceso para atender oportunamente cualquier conato de incendio. Asimismo, dichos equipos cuentan con mantenimiento e inspecciones periódicas para garantizar su operatividad.

De igual manera, el personal ha sido instruido sobre el uso adecuado de los extintores y las acciones básicas de respuesta ante una emergencia, el adecuado almacenamiento de materiales inflamables y el mantenimiento preventivo de vehículos, maquinaria y equipos. Estas acciones permiten reducir la probabilidad de ocurrencia de incendios y minimizar sus posibles consecuencias sobre las personas, el ambiente y la infraestructura del proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Contingencias.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental - Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

Inspeccionando los extintores en almacén central.



IX. Conclusiones.

Durante el presente periodo (del 01 al 31 de agosto de 2026), la empresa contratista ha continuado implementando de manera sostenida diversas medidas de mitigación ambiental orientadas a prevenir, controlar y reducir los posibles impactos generados por las actividades asociadas a la construcción de la carretera. Entre estas medidas se incluyen acciones de control de emisiones de polvo, manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos, protección de cuerpos de agua, mantenimiento de la señalización ambiental, así como la ejecución de prácticas de seguridad y orden en las áreas de trabajo. Se adjunta los resultados de los monitoreos realizados en el mes de julio del 2026, donde se observa que los parámetros medidos no sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), establecidos en la normativa.

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, la empresa contratista ha continuado implementando de manera sostenida diversas medidas de mitigación ambiental orientadas a prevenir, controlar y reducir los posibles impactos generados por dichas actividades del proyecto. Entre estas medidas se incluyen acciones de control de emisiones de polvo, manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos, protección de cuerpos de agua, mantenimiento de la señalización ambiental, así como la ejecución de prácticas de seguridad y orden en las áreas de trabajo.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA" 1343

En consecuencia, se otorga la conformidad al informe ambiental correspondiente al proyecto contractual presentado por el Especialista Ambiental de la empresa contratista, al evidenciarse que las acciones implementadas se desarrollaron de acuerdo con la normativa ambiental vigente y los compromisos ambientales asumidos para la ejecución del proyecto.

Es todo cuanto informo a Usted, para conocimiento y fines.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
JHONY MAXOL GUTIERREZ FERNANDEZ
Ing. Ambiental – Reg. CIP N° 96788
Especialista Ambiental

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

LEY Nº 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad

Nº - A - 0234285

1342

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): GUTIERREZ FERNANDEZ JHONY MAXOL

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 96788 Fecha de Incorporación: 09/11/2007

Especialidad: ING. AMBIENTAL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA, 01 de ABRIL del 20 26

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
DIRECTOR SECRETARIO (E)

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Óscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1341

Especialista en Costos, Metrados, Presupuestos y Valorizaciones:

Leydi Yudith Cayotopa Cabrera

CIP N° 328822

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com

Celular: 930 758 673

Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

Namora, 09 de agosto del 2026.

CARTA N° 017-2026-LYCC /ECMP&V/ CONSORCIO SUPERVISOR MC

Señor : ING. OSCAR CUEVA RODRÍGUEZ
Supervisor de Obra
CONSORCIO SUPERVISOR MC

Presente

Asunto : ALCANZO INFORME DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14

Referencia : **1.-** Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS EMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA"- CUI 2384857.
2.- CARTA N°112-2026-JLYV-RC-CVN.

De mi especial consideración:

Por la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la mediante la presente hacerle llegar el INFORME N°017– 2026 –CSMC/LYCC/ECMP&V, dicho informe corresponde a los trabajos realizados el mes de agosto del 2026 de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA – LAGUNA SAN NICOLÁS – EMPALME PE – 3N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA" – CUI N° 2384857, para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo la atención a la presente, Es propicia la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CC.
Archivo

INFORME N°017– 2026 –CSMC/LYCC/ECMP&V

AL : **ING. OSCAR CUEVA RODRÍGUEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

DEL : **ING. LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA**
ESPECIALISTA DE COSTOS, METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES

ASUNTO: HAGO LLEGAR INFORME DE CONFORMIDAD DE PARTIDAS VALORIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 – VALORIZACIÓN DE OBRA N°14

REFERENCIA :**"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS EMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA"- CUI 2384857**

FECHA: NAMORA, 09 DE SETIEMBRE DEL 2026

Por medio del presente es grato saludarlo cordialmente y a la vez presentar a su despacho el Informe de conformidad de la Especialidad de Costos, Metrados, Presupuestos y Valorizaciones correspondiente a las partidas valorizadas del mes de agosto del 2026, periodo comprendido desde el 01 de agosto del 2026 al 31 de agosto del 2026, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI 2384857, cuyo contenido se detalla a continuación:

I. DATOS GENERALES

- PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS EMPALME PE - 3N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA".
- UBICACIÓN: DISTRITO : NAMORA.
  PROVINCIA : CAJAMARCA.
  REGIÓN : CAJAMARCA.
- UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
- CONTRATISTA : Empresa: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
- SUPERVISIÓN DE OBRAS : CONSORCIO SUPERVISOR MC

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 428824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

II. ANTECEDENTES:

- Mediante LICITACIÓN PÚBLICA N.° 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA, el Órgano Encargado de las Contrataciones, con fecha 05 de diciembre del 2024, adjudicó la Buena Pro al contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE
- Con fecha 13 de enero del 2025 se firma el Contrato de Obra N.° 006-2025-GRCAJ-GGR entre el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO VIAL DEL NORTE y la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.
- Con fecha 28 de enero de 2025, la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA realiza la entrega de terreno

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1338

a la empresa contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE.

- Con fecha 15 de abril de 2025 se da inicio al plazo de ejecución de obra.
- El 07 de mayo del 2025 se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, que rige a partir del 02 de mayo del 2025.
- El 19 de julio del 2025 se suscribe el Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución, la cual rige a partir del 19 de julio del 2025, fecha de la cual se computa el plazo.
- El día 23 de enero del 2026 se suscribe el ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, por mutuo acuerdo entre la Entidad y el contratista, suspendiendo el plazo a partir del 23 de enero del 2026. Dicha suspensión fue motivada por condiciones climáticas desfavorables que originaron la paralización de los trabajos.
- El día 21 de abril del 2026, la ENTIDAD (Gobierno Regional de Cajamarca) suscribe el Acta de Acuerdos de Levantamiento de la Suspensión de la Obra N°02.
- El nuevo término de plazo contractual es el 22 de septiembre del 2026.
- El 22 de mayo del 2026, se aprobó el adicional de obra N°01, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D231-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 30 de junio del 2026, se aprobó el adicional de obra N°02, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D288-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 21 de julio del 2026, se aprobó el adicional de obra N°03, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D313-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.
- El 03 de agosto del 2026, se aprobó el adicional de obra N°04, mediante Resolución de Gerencia General Regional N°D323-2026-GR.CAJ/GGR, con un plazo de ejecución de 105 días calendarios. El día 04 de agosto se ha notificado a la supervisión con OFICIO N° D1126-2026-GR.CAJ/SG.

III. FICHA TÉCNICA:

3.1. DATOS DE LA OBRA

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
TIPO DE PROCESO	: A L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATO N°	: N°006-2025-GRCAJ-GGR
FECHA DEL CONTRATO	: 13 de enero del 2025
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A PRECIOS UNITARIOS
UBICACIÓN	
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: CAJAMARCA
DISTRITO	: JESÚS - NAMORA
LOCALIDADES	: NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
REPRESENTANTE COMUN	: LIC. JOSE LUIS YOPLA VERGARA
RESIDENTE	: ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LESLIE JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Programación

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1337

SUPERVISOR	: ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ (DESDE EL 19/08/25)
VALOR REFERENCIAL SIN IGV	: S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL CON IGV	: S/ 32,141,980.18
MONTO DEL CONTRATO, SIN IGV	: S/ 27,102,771.42
MONTO DEL CONTRATO, CON IGV	: S/ 31,981,270.28
FACTOR DE RELACIÓN	: 0.995
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	: Julio-2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 360 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 28/01/2025
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 15/04/2025
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 09/04/2026
ADICIONALES DE OBRA	: Si existe - Adicional N°01 aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°D231-2026-GR.CAJ/GGR - Adicional N° 02 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D288-2026-GR.CAJ.GGR - Adicional N° 03 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D313-2026-GR.CAJ.GGR - Adicional N° 04 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N°D323-2026-GR.CAJ/GGR
DEDUCTIVOS DE OBRA	: Si existe
AMPLIACIONES DE PLAZO	: Si existe
ATRASO JUSTIFICADO	: No existe
PLAZO VIGENTE DE EJECUCIÓN	: 360 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSION DE PLAZO N°01	: INICIO 02/05/2025 FIN 18/07/2025
FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N°01	: 19/07/2025
FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	: 26/06/2026
SUSPENSION DE PLAZO N°02	: INICIO 23/01/2026 FIN 21/04/2026
NUEVA FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	: 22/09/2026

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

IV. METAS CONSIDERAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO:

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1336

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	GLB	1.00
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00
01.03	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	KM	19.76
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	mes	8.00
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	TERRAPLENA O RELLENO P/SUBRASANTE		
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49
02.01.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27
02.01.03	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08
02.01.04	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36
02.01.05	PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES		
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10
02.02.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76
03	SUB BASE – BASE		
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06
04	PAVIMENTOS		
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)		
04.01.01	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	M2	123,551.70
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56
04.02	VARIOS		
04.02.01	NIVELACIÓN DE TECHO DE BUZONES	und	7.00
04.02.02	REUBICACIÓN DE POSTES DE LUZ	und	36.00

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y programaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
04.02.03	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	306.03
04.02.04	REPOSICIÓN DE TUBERÍA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN)	m	1,228.87
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE		
05.01	BADENES		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	877.31
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20
05.01.03	CONCRETO SIMPLE		
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397.03
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78
05.01.03.03	CONCRETO EN EMBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA f'c=140 kf/cm2	M3	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACIÓN	m	591.27
05.02	ALCANTARILLAS		
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76
05.02.01.04	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	2,110.02
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	253.06
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	2,638.35
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	716.34

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1334

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68
05.02.03	INSTALACIÓN TMC		
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=60"	m	11.92
05.02.03.04	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31
05.02.03.05	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93
05.02.03.06	INSTALACIÓN ALCANTARILLA TMC D=60"	m	17.89
05.02.04	CONCRETO SIMPLE		
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABEZALES	M3	111.95
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA EMBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50
05.03	MURO DE CONTENCIÓN		
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE	M2	7,686.15
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.03.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	7,363.90
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	8,030.45
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	2,572.40
05.03.03	CONCRETO SIMPLE		
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25
05.03.04	CONCRETO ARMADO		
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEIDY YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

1333

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
05.03.05	MISCELÁNEO		
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64
05.04	CUNETAS		
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M		
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.04.01.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,110.64
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACIÓN	M2	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACIÓN.	M3	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACIÓN e= 1"	m	9,348.03
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
06.01	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		
06.01.01	LÍNEAS CONTINUAS	m	71,437.00
06.01.02	LÍNEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00
06.02	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00
06.02.05	GUARDAVÍAS METÁLICOS	m	1,265.10
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES		
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	GLB	1.00

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1332

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES		
07.01.06.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GLB	1.00
07.01.06.02	PARTICIPACIÓN DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA		
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES.	GLB	1.00
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTILES	und	10.00
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00
07.04	PLAN DE ABANDONO		
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00
07.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00
08	FLETE		
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

V. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS Y/O TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

Se verifican con la participación de los especialistas de supervisión las siguientes partidas:

05. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

05.02. BADENES

05.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES

05.01.01.02. TRAZO Y REPLANTEO (M2)

METRADO EJECUTADO: 879.81
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 53.67%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYLA JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Programaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se procedió con los trabajos del replanteo de la obra, Con el equipo topográfico se demarco con precisión todos los puntos necesarios para la excavación, así mismo

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

todos los elementos de la construcción en forma segura y permanente de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.

05.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)

METRADO EJECUTADO: 677.11
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

DESCRIPCIÓN
Consiste en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.
La excavación se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de sub-rasante, de tal manera que, al preparar y compactar esta capa, se llegue hasta el nivel de sub-rasante de acuerdo a los planos de diseño y a las recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos EMS.
No deberán excavarse con demasiada anticipación a los trabajos motivo del Expediente Técnico. El material proveniente de los cortes deberá ser retirado fuera de la obra para seguridad y limpieza del trabajo, en un plazo máximo de 24 horas.
Las operaciones de excavación no deberán iniciarse mientras no se cuente con un Plan de Desvió y Señalización comprobado

05.01.02.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM (M3)

METRADO EJECUTADO: 283.47
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 100.00%

DESCRIPCIÓN
Se considero el transporte y posterior eliminación del material excedente menor a un kilómetro procedente de los trabajos de la obra, dichos materiales son eliminados a los DME autorizados.

05.01.02.04. CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (M3)

METRADO EJECUTADO: 75.94
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 84.05%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se realizo la colocación de una capa de base con material de préstamo, el cual fue cernido con un tamiz menor al de 4 cm, y debidamente compactado, este material sirvió como "cama o asiento". El fondo se encuentro a nivel, seco y firme y en todos los conceptos fue aceptable como fundación de la estructura a soportar.

05.01.02.05. PERFILADO Y COMPACTACIÓN (M2)

METRADO EJECUTADO: 764.44
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 47.61%

DESCRIPCIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Este trabajo fue afinado y terminado a mano, poco antes de realizar la subsiguiente partida. Este trabajo se realizó en el área que soportará directa o indirectamente la estructura del pavimento.

Se perfilo y compacto de acuerdo al origen de la zona:

- Como resultado de corte de material suelto.
- Como resultado de corte en roca suelta.
- Como resultado de corte en roca fija.

Se suministro y se usó plantillas que controlaron las dimensiones de este trabajo. En los casos de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al pavimento, se consideró las tolerancias de la subrasante, ajustándose a la cota del perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. Se trabajo Treinta (30) centímetros por debajo de la cota de subrasante el material suelto fue compactado a 95% de la máxima densidad seca.

05.01.03. CONCRETO SIMPLE

05.01.03.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG (M3)

METRADO EJECUTADO: 188.17
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 65.17%

DESCRIPCIÓN

Se suministro los diferentes tipos de compuestos de cemento portland Tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparado y construido de acuerdo con estas especificaciones, en los sitios forma, dimensiones y clases indicadas en los planos.

La clase de concreto que se utilizó se en las estructuras, se realizó de acuerdo a lo indicado en los planos o las especificaciones.

- Concreto Clase G,14MPa (f'c = 140 Kg/cm2)
- Concreto f'c = 175 Kg/cm2 + 30 % P.G.
- Concreto Clase E,17.5MPa (f'c = 175 Kg/ cm2)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

Se realizo los trabajos de suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento Pórtland, agregados finos, agregados gruesos y agua; utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

El concreto que se utilizó en el proyecto fue premezclado para sus diferentes resistencias a la compresión (f'c) a los 28 días.

05.01.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES (M2)

METRADO EJECUTADO: 186.23
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 45.46%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN

Se suministro, habilito, y se colocó las formas de madera necesarias para el vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida también incluye el desencofrado y el suministro de materiales diversos, como clavos y alambre.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

05.04. CUNETAS

05.04.01. CUNETAS REVESTIDAS E=0.10M

05.04.01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.04.01.01.01. EXCAVACIÓN MANUAL (M3)

METRADO EJECUTADO: 76.22
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 1.85%

DESCRIPCIÓN
Se realizó en la excavación manual en todo el ancho que corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluyendo el volumen de elementos sueltos o dispersos que hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía, según necesidades del trabajo.

05.04.01.01.02. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (M3)

METRADO EJECUTADO: 99.09
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 2.41%

DESCRIPCIÓN
Se realizo el traslado del material procedente de los cortes del terreno natural y las excavaciones de zanjas al punto de acopio dentro de la obra para su posterior utilización o eliminación. El acarreo de material se realizó periódicamente, evitando que se acumule y permanezca en obra más de un mes, excepcionalmente cunado el material que se usara en rellenos.

07. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

07.01. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

07.01.01. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (GLB)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Programaciones

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 92.00%

DESCRIPCIÓN
Se realizaron los lineamientos generales para realizar la gestión de los residuos sólidos desde su generación, recolección, clasificación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final, considerando los criterios de minimización en el origen y las opciones de reúso y/o reciclaje, según su aplicabilidad.

07.01.02. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE (GLB)

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 92.00%

DESCRIPCIÓN
Se dio cumplimiento a los límites de emisiones de material particulado, gases y generación de ruido, exigidas por la normatividad ambiental vigente, y establecer las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del aire durante el proceso constructivo del proyecto.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1328

07.01.03. PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 93.00%

DESCRIPCIÓN
Se dio las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del suelo durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.04. PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 84.00%

DESCRIPCIÓN
Se dio a conocer el uso adecuado y la importancia del recurso hídrico (agua) y se estableció las acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse sobre la calidad del agua durante el proceso constructivo del proyecto.

07.01.05. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 76.00%

DESCRIPCIÓN
Se estableció los procedimientos adecuados para la protección de los elementos fáunicos que pudieran verse afectados en desarrollo de la obra, garantizando el adecuado manejo de las especies de animales que se detecten dentro del área del proyecto (nidos, neonatos, etc).

07.01.06. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES

07.01.06.01. PARTICIPACIÓN CIUDADANA (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CHIOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Programación

DESCRIPCIÓN
Se realizo las acciones correspondientes para lograr el objetivo de apoyar y fortalecer la gestión participativa de los pobladores y la contratista en materia de construcción de la vía con enfoque territorial, disponiendo de información para la planificación, seguimiento y derivación coordinada de la interacción con los pobladores, comunidades y territorios, donde se garantizó el cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y ciudadanos.

07.01.06.02. PARTICIPACIÓN DE EMPELO LOCAL (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN
Se logro diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo a los pobladores de las zonas aledañas, que

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

1327

comprendan la adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias, agua potable y transporte.

07.01.06.03. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 93.00%

DESCRIPCIÓN
Se estableció condiciones para que haya un ambiente cordial entre la población del área de influencia y trabajadores, así como trabajadores y el medio ambiente, todo ello para que no se generen conflictos y que haya una relación directa y organizada en pro del desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente.

07.01.06.04. MONITOREO DE DEUDAS LOCALES (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 77.00%

DESCRIPCIÓN
Se aseguro el cumplimiento de los pagos contraídos durante el periodo de ejecución de la obra por la provisión de alimentos y/o servicios por proveedores locales.

07.02. PLAN DE CONTINGENCIA

07.02.01. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 85.00%

DESCRIPCIÓN
Se realizo una planificación ante posibles amenazas por conflictos, violencia y desastres naturales, debido sobre todo a su inherente vulnerabilidad. Mediante una base coordinada y creíble en obra, así mismo se incluyó medidas para la reducción de riesgos.

07.02.04. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (GLB)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 99.00 %

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYCOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y programaciones

DESCRIPCIÓN
Se cumplieron con todas las exigencias de seguridad y se le proveerá a los trabajadores de todos los equipos de protección personal (EPPs) requeridos para el desarrollo de sus actividades, así como uniformes que los identifiquen.

07.02.05. EQUIPO DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES (UND)
METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 89.50 %

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN
Se abasteció el campamento con una provisión adecuada de materiales y equipos para el control y limpieza de derrames de productos químicos. manteniendo un stock actualizado de estos equipos y materiales. Se dispone de un plan de prevención de derrames y fugas en la empresa logrando disminuir, o incluso eliminar, el riesgo de

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

materialización de dicho suceso. Para lo cual se identificó factores de riesgo en cada área del proyecto en particular.

07.03. PLAN DE ABANDONO

07.04.02. RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS (GLB)

METRADO EJECUTADO: 0.08
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO: 32.00 %

DESCRIPCIÓN

Se ejecuto el Plan de restauración de áreas deforestadas recuperando las áreas degradadas y apostando por un desarrollo sostenido siguiendo los protocolos de trabajo de las áreas intervenidas por las actividades del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLAS - EMPALME PE-3N - DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA, DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGION CAJAMARCA" debido al emplazamiento de la infraestructura, constituida por los siguientes componentes principales: tajos y depósitos de desmontes, canteras, área de acumulación de suelo orgánico, depósito de desmonte reconstrucción y tormentas, camino de acarreo, talleres, almacenes, oficinas, campamento, comedores y caminos internos.

VI. CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES AGOSTO– 2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE	
			ACTUAL METRADO	ACUMULADO METRADO
05.01	BADENES			
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES			
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	879.81	1022.96
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	677.11	877.31
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	283.47	543.73
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	75.94	105.2
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACIÓN	M2	764.44	907.59
05.01.03	CONCRETO SIMPLE			
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	188.17	258.75
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	186.23	264.63
05.04	CUNETAS			
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M			
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
05.04.01.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	76.22	76.22
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	99.09	99.09
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
07.01	MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES			

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAMOTOPA CABRERA
Resp. CIP N° 328822

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR PERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	AVANCE	
			ACTUAL METRADO	ACUMULADO METRADO
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	0.08	0.92
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	0.08	0.92
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	0.08	0.93
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	GLB	0.08	0.84
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	GLB	0.08	0.76
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES			
07.01.06.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GLB	0.08	0.85
07.01.06.02	PARTICIPACIÓN DE EMPLEO LOCAL	GLB	0.08	0.85
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	0.08	0.93
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	0.08	0.77
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA			
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS NATURALES.	GLB	0.08	0.85
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	0.08	0.99
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	UND	0.08	7.16
07.04	PLAN DE ABANDONO			
07.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS	GLB	0.08	0.32

VII. AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026


I SITUACIÓN DE LA OBRA

1	AVANCE EJECUTADO DEL MES	:	0.72%
2	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	:	50.56%
3	AVANCE PROGRAMADO DEL MES	:	24.61%
4	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	:	89.89%
5	PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRAZO	:	-39.33%
6	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	:	56.3%
7	SITUACIÓN DE LA OBRA	:	ATRASADA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

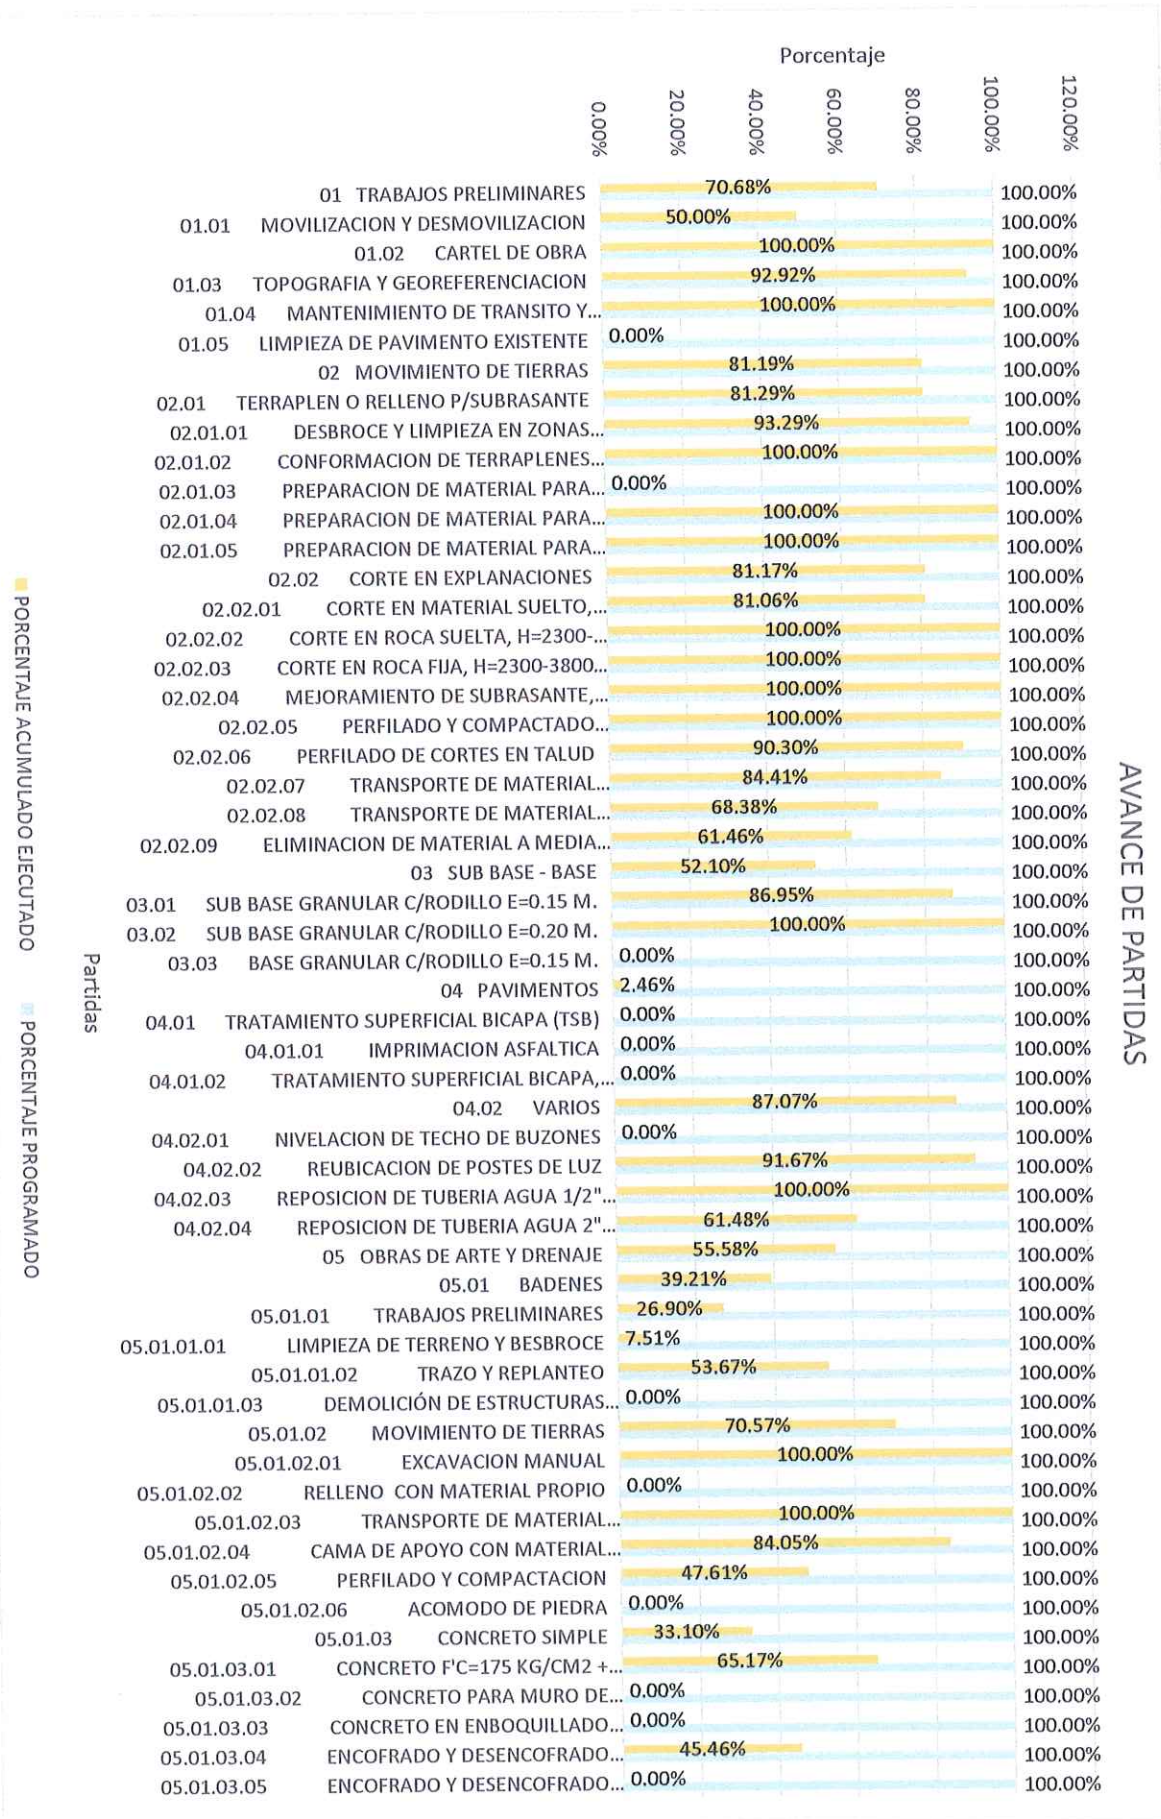

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAJOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

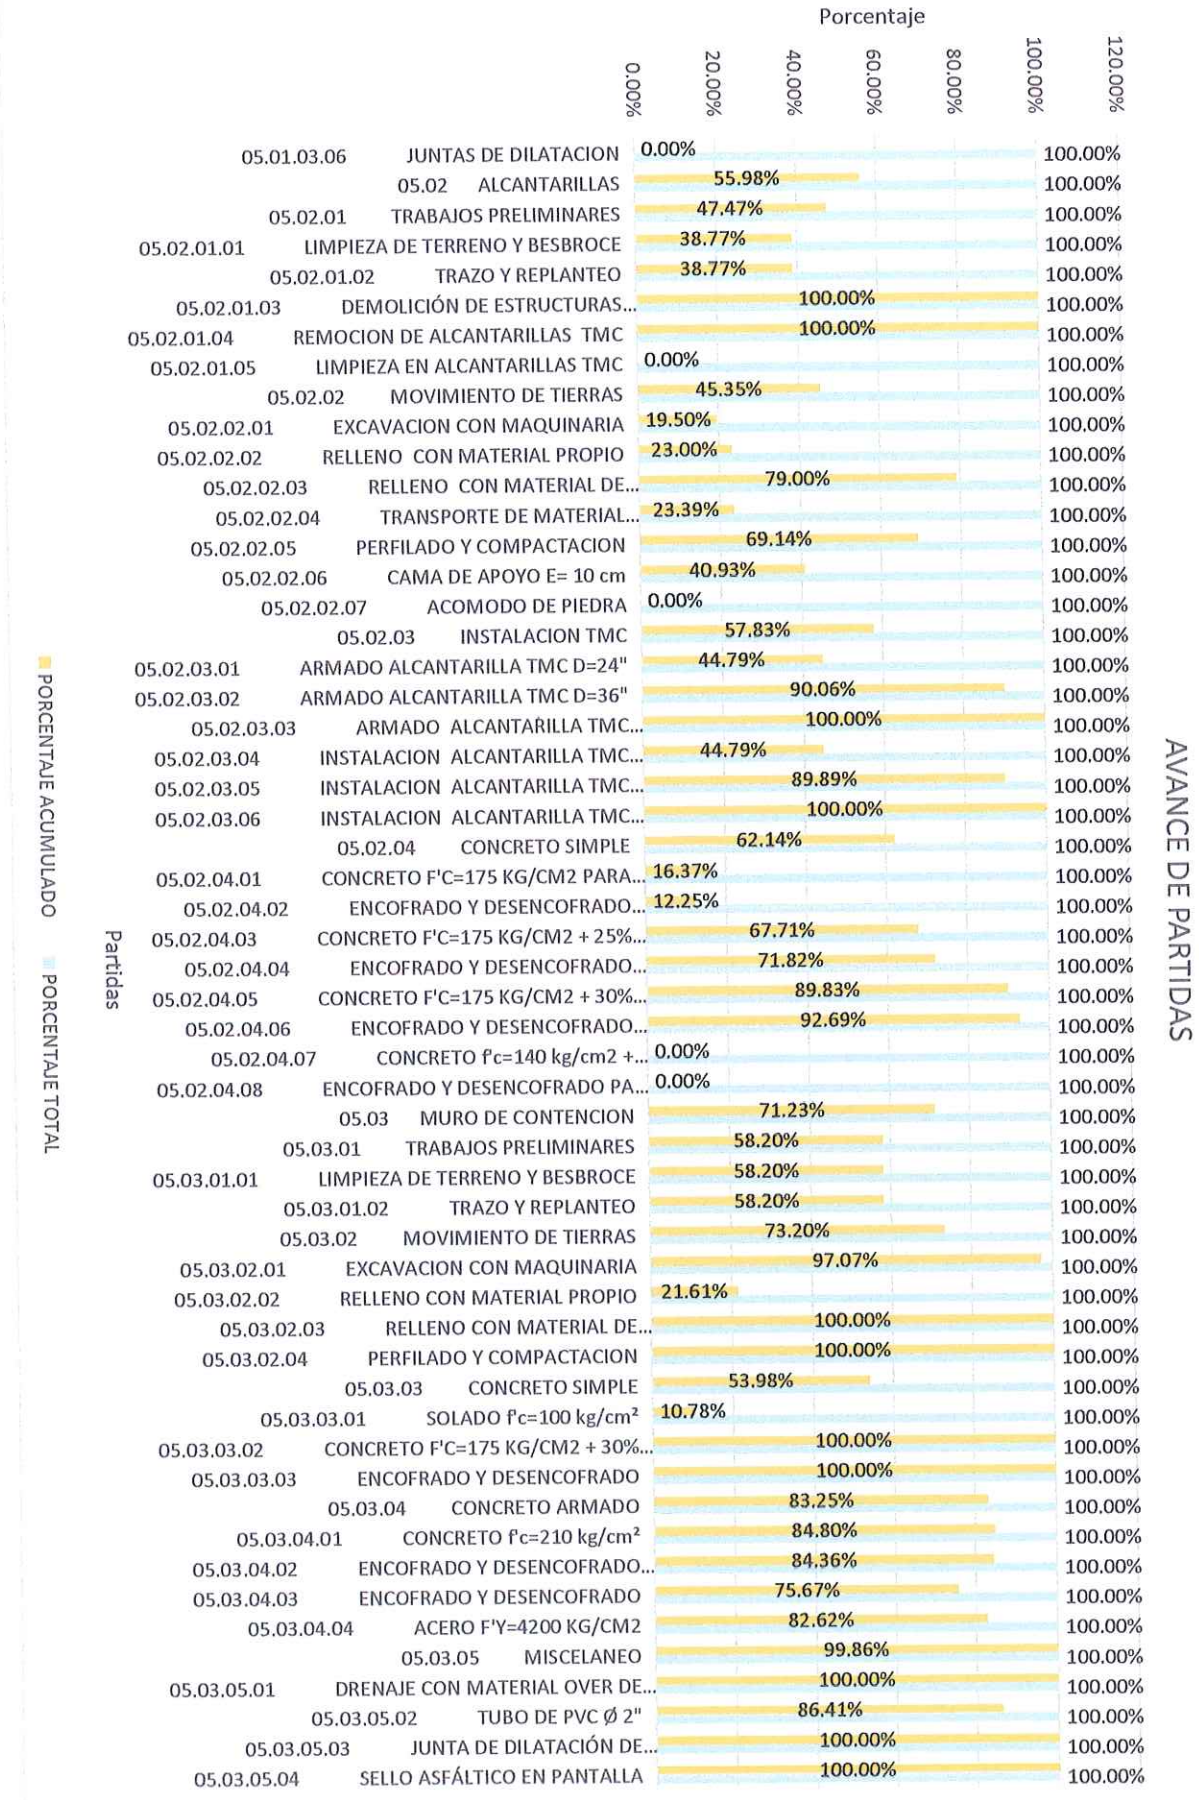

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N° 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

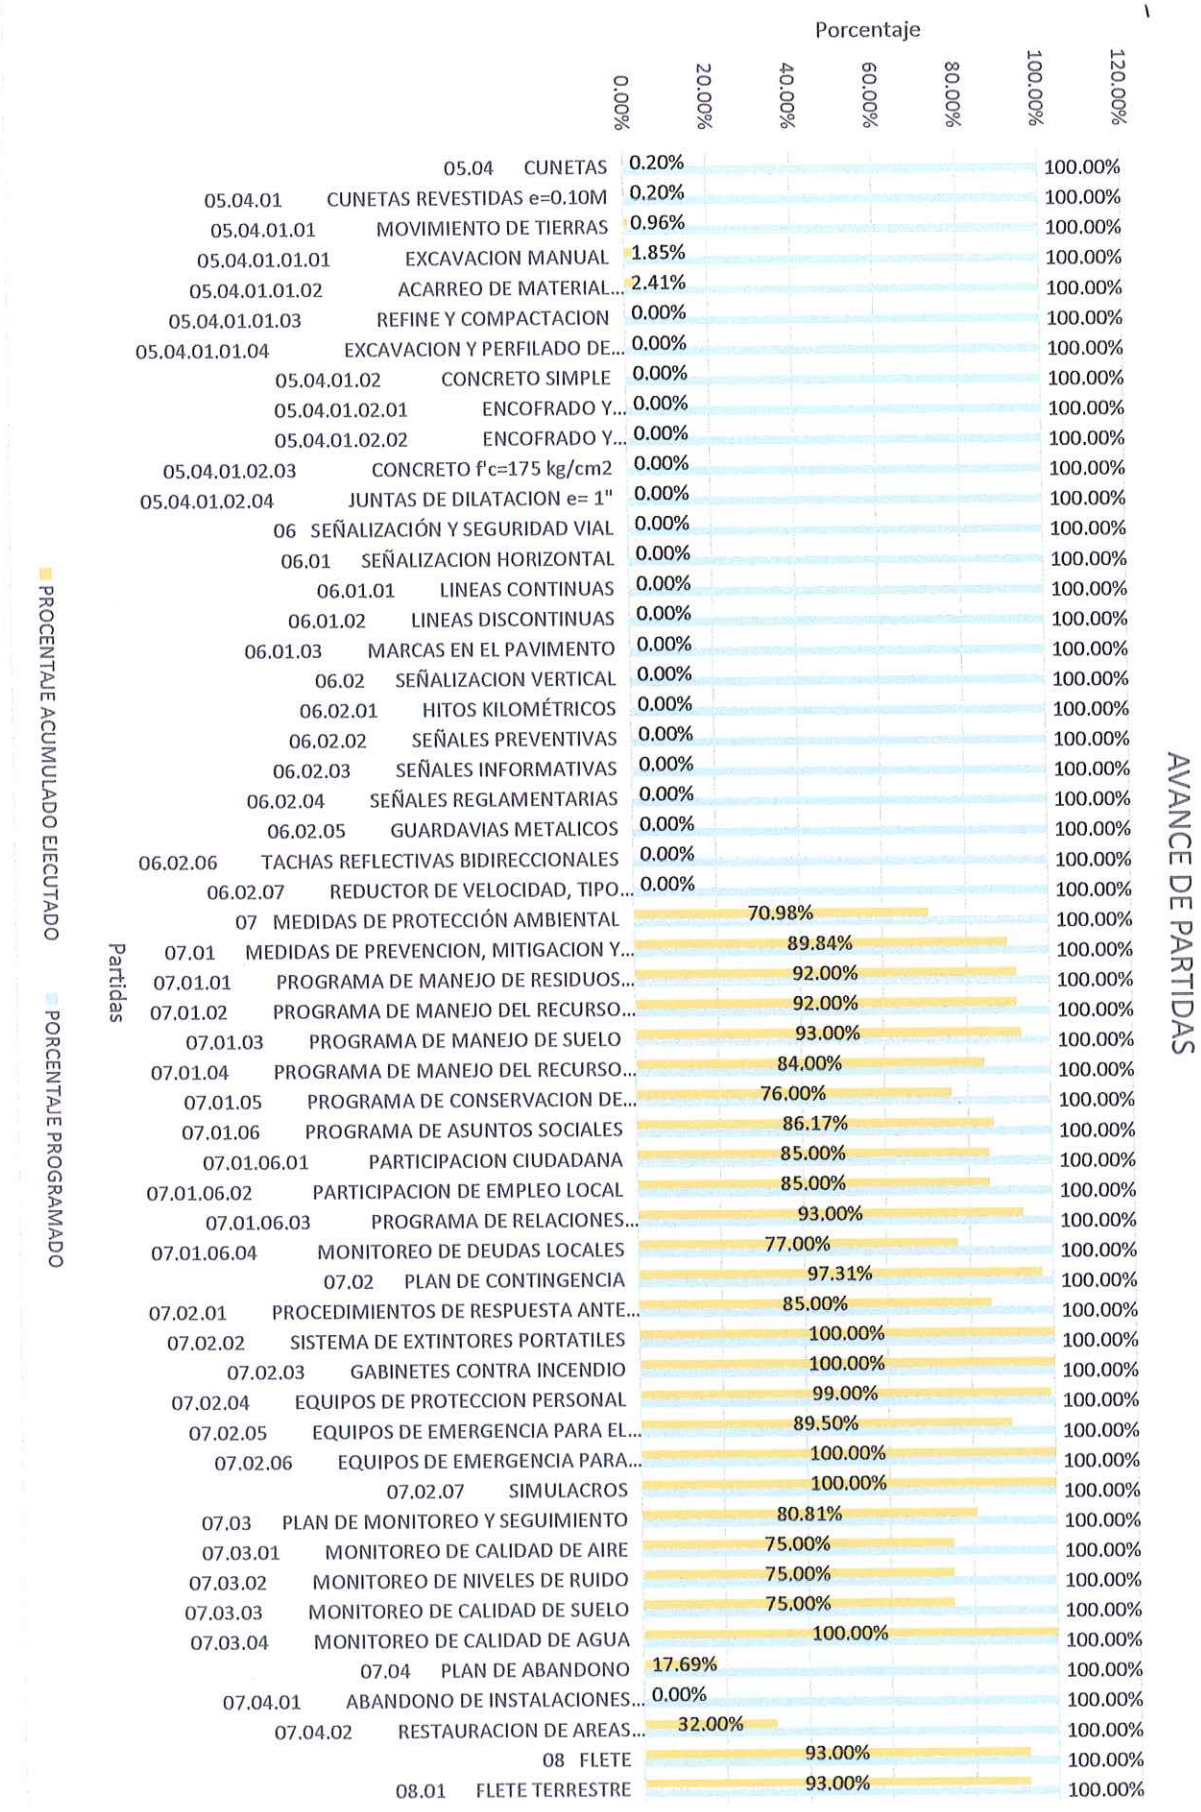

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. Nº 43247123

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
Ing. Civil - CIP Nº 219811
JEFE DE SUPERVISIÓN

VIII. RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN DEL PRESENTE MES AGOSTO– 2026

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°14

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.		
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO	VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ	FACTOR DE RELACION:	0.99500
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:	28/01/2025	MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
FECHA DE INICIO:	15/04/2025	MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025	FECH BASE:	Julio-2024
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025		
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026		
FECHA DE TÉRMINO:	22/09/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	360 DÍAS CALENDARIO		

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%	MONTO (S/)	%
COSTO DIRECTO	21,992,833.80	S/ 10,960,897.36	49.84%	S/ 158,422.90	0.72%	S/ 11,119,320.26	50.56%	S/ 10,873,513.54	49.44%
TRABAJOS PRELIMINARES	631,351.38	S/ 446,236.23	70.68%	S/ 0.00	0.00%	S/ 446,236.23	70.68%	S/ 185,115.15	29.32%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,327,199.85	S/ 3,514,178.39	81.21%	-S/ 724.17	-0.02%	S/ 3,513,454.22	81.19%	S/ 813,745.63	18.81%
SUB BASE - BASE	1,723,138.38	S/ 897,815.98	52.10%	S/ 0.00	0.00%	S/ 897,815.98	52.10%	S/ 825,322.40	47.90%
PAVIMENTOS	3,667,502.35	S/ 90,331.41	2.46%	S/ 0.00	0.00%	S/ 90,331.41	2.46%	S/ 3,577,170.94	97.54%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	9,843,421.97	S/ 5,338,364.97	54.23%	S/ 132,974.97	1.35%	S/ 5,471,339.94	55.58%	S/ 4,372,082.03	44.42%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	936,424.50	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 936,424.50	100.00%
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	468,607.83	S/ 306,445.98	65.39%	S/ 26,172.10	5.59%	S/ 332,618.08	70.98%	S/ 135,989.75	29.02%
FLETE	395,187.54	S/ 367,524.40	93.00%	S/ 0.00	0.00%	S/ 367,524.40	93.00%	S/ 27,663.14	7.00%
TOTAL COSTO DIRECTO (CD)	21,992,833.80	10,960,897.36		158,422.90		S/ 11,119,320.26		10,873,513.54	
GASTOS GENERALES (16.853826631473%)	3,706,634.08	1,847,330.65		26,700.32		S/ 1,874,030.97		S/ 1,832,603.11	
UTILIDAD(6.38073087907352%)	1,403,303.54	699,385.36	49.84%	10,108.54	0.72%	S/ 709,493.90	50.56%	S/ 693,809.64	49.44%
SUBTOTAL	27,102,771.42	13,507,613.37		S/ 195,231.76		S/ 13,702,845.13		S/ 13,399,926.29	
IGV(18%)	4,878,498.86	2,431,370.41		S/ 35,141.72		S/ 2,466,512.13		S/ 2,411,986.73	
TOTAL INCLUIDO IGV	31,981,270.28	15,938,983.78		S/ 230,373.48		S/ 16,169,357.26		S/ 15,811,913.02	

ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

ING. LEVIN JUDITH CATOPPA CABRERA
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 328824

CONSORCIO SUPERVISOR MC

1321

IX. CONTROL DE GRAFICO DE AVANCE DE OBRA:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS AVANCE FÍSICO EJECUTADO



CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ingº Civil - CIP N°219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CANOTPIA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Estudios, Estudios Geotécnicos y Pavimentos

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
(15/04/25 - 30/04/25)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/25 - 01/05/25)	MES 02		14,883.94	0.00%	0.05%	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%
(01/06/25 - 30/06/25)		SUSPENSION DE OBRA N°01							
(01/07/25 - 18/07/25)									
(19/07/25 - 31/07/25)	MES 03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%
(01/08/25 - 31/08/25)	MES 04	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/25 - 30/09/25)	MES 05	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/25 - 31/10/25)	MES 06	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%
(01/11/25 - 30/11/25)	MES 07	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%
(01/12/25 - 31/12/25)	MES 08	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%
(01/01/26 - 22/01/26)	MES 09	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%	1,247,453.48	10,628,005.79	4.60%	39.21%
(23/01/26 - 31/01/26)		SUSPENSION DE OBRA N°02							
(01/02/26 - 28/02/26)									
(01/03/26 - 31/03/26)									
(01/04/26 - 20/04/26)									
(21/04/26 - 30/04/26)	MES 10	508,394.39	11,136,400.17	1.88%	41.09%	91,773.11	10,719,778.90	0.34%	39.55%
(01/05/26 - 31/05/26)	MES 11	1,819,683.82	12,956,083.99	6.71%	47.80%	1,558,930.97	12,278,709.87	5.75%	45.30%
(01/06/26 - 30/06/26)	MES 12	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%	833,100.40	13,111,810.27	3.07%	48.38%
(01/07/26 - 31/07/26)	MES 13	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%	395,803.10	13,507,613.37	1.46%	49.84%
(01/08/26 - 31/08/26)	MES 14	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%	195,231.76	13,702,845.13	0.72%	50.56%
(01/09/26 - 22/09/26)	MES 15	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		13,702,845.12		50.56%	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDA JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil
Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, auditoría, presupuestos y Valorizaciones

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

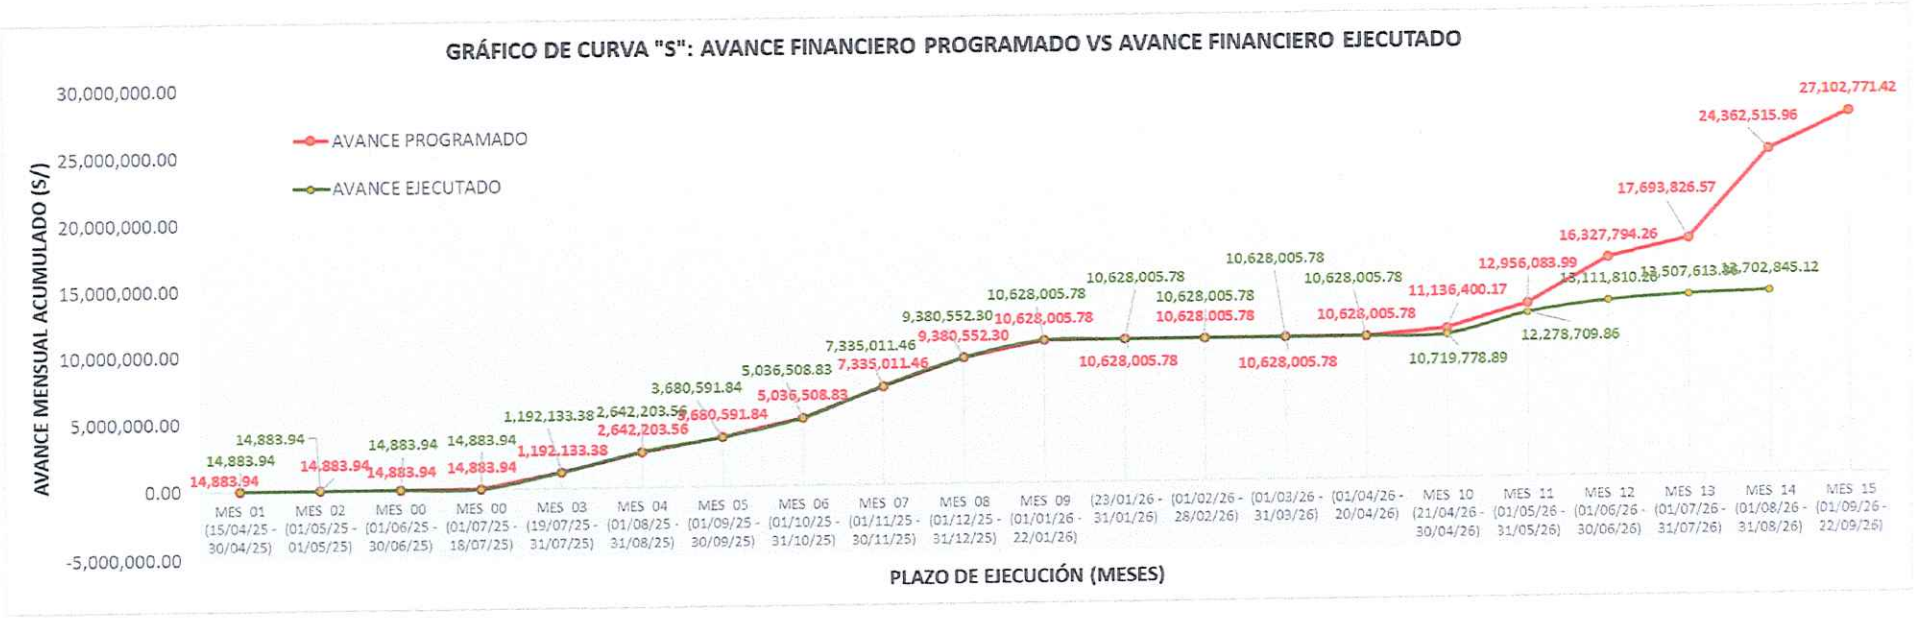

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI MEDITH CHUQUIPOMA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 228824

1318

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

PERIODO	MESES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin IGV)		PORCENTAJES	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
		S/	S/	%	%	S/	S/	%	%
(15/04/25 - 30/04/25)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%
(01/05/25 - 01/05/25)	MES 02	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%
(01/06/25 - 30/06/25)	MES 00	SUSPENSION DE OBRA N°01							
(01/07/25 - 18/07/25)	MES 00								
(19/07/25 - 31/07/25)	MES 03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%
(01/08/25 - 31/08/25)	MES 04	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%
(01/09/25 - 30/09/25)	MES 05	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%
(01/10/25 - 31/10/25)	MES 06	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%
(01/11/25 - 30/11/25)	MES 07	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%
(01/12/25 - 31/12/25)	MES 08	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%
(01/01/26 - 22/01/26)	MES 09	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%
(23/01/26 - 31/01/26)		SUSPENSION DE OBRA N°02							
(01/02/26 - 28/02/26)									
(01/03/26 - 31/03/26)									
(01/04/26 - 20/04/26)									
(21/04/26 - 30/04/26)	MES 10	508,394.39	11,136,400.17	1.88%	41.09%	91,773.11	10,719,778.89	0.34%	39.55%
(01/05/26 - 31/05/26)	MES 11	1,819,683.82	12,956,083.99	6.71%	47.80%	1,558,930.97	12,278,709.86	5.75%	45.30%
(01/06/26 - 30/06/26)	MES 12	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	60.24%	833,100.40	13,111,810.26	3.07%	48.38%
(01/07/26 - 31/07/26)	MES 13	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	65.28%	395,803.10	13,507,613.36	1.46%	49.84%
(01/08/26 - 31/08/26)	MES 14	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	89.89%	195,231.76	13,702,845.12	0.72%	50.56%
(01/09/26 - 22/09/26)	MES 15	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	100.00%				
TOTAL		27,102,771.42		100.00%		13,702,845.12		50.56%	

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil
Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, estudios, presupuestos y liquidaciones

1317

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1316

X. RE SUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA – AGOSTO 2026

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.

UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N	**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	360 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	**VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):**	S/ 27,238,966.25
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO	**VALOR REFERENCIAL (CON IGV):**	S/ 32,141,980.18
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ	**FACTOR DE RELACION:**	0.99500
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025	**MONTO CONTRATADO (SIN IGV):**	S/ 27,102,771.42
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025	**MONTO CONTRATADO (CON IGV):**	S/ 31,981,270.28
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025	**FECH BASE:**	Julio-2024
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025 0	**FECHA DE REINICIO N°2:**	21/04/2026
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026		
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		

DESCRIPCIÓN	MONTO VIGENTE (SIN IGV)	VALORIZACION				SALDO (S/)
		ANTERIOR ACUM. (S/)	ACTUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	% AVANCE ACUMULADO	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL						
MONTO VALORIZADO SIN IGV	S/ 27,102,771.42	S/ 13,507,613.37	S/ 195,231.76	S/ 13,702,845.13	50.56%	S/ 13,399,926.29
TOTAL	**S/ 27,102,771.42**	**S/ 13,507,613.37**	**S/ 195,231.76**	**S/ 13,702,845.13**		**S/ 13,399,926.29**
AVANCE FISICO DE LA OBRA		49.84%	0.72%	50.56%		49.44%
CONTROL DE LINEA BASE						
Monto de Avance físico acumulado			f=	S/ 13,702,845.13		
Monto de avance programado acum.			g=	S/ 24,362,515.96		
Cumplimiento de monto programado (f/g)				56.3%	ATRASADA	
B. REAJUSTES						
Reajuste contrato principal		S/ 19,541.14	S/ 5,856.95	S/ 25,398.09		
TOTAL		**S/ 19,541.14**	**S/ 5,856.95**	**S/ 25,398.09**		
C. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE						
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo		-S/ 16,722.43	S/ 308.06	-S/ 16,414.37		
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales		S/ 0.00	-S/ 5,406.41	-S/ 5,406.41		
TOTAL		**-S/ 16,722.43**	**-S/ 5,098.35**	**-S/ 21,820.78**		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A+B-C)		**S/ 13,543,876.94**	**S/ 206,187.06**	**S/ 13,750,064.00**		
D. AMORTIZACIONES						
Amortización de adelanto directo		S/ 1,350,761.33	S/ 19,523.18	S/ 1,370,284.51		
Amortización de adelanto de material		S/ 1,629,074.69	S/ 161,866.19	S/ 1,790,940.88		
TOTAL		**S/ 2,979,836.02**	**S/ 181,389.37**	**S/ 3,161,225.39**		
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB-D)		**S/ 10,564,040.92**	**S/ 24,797.69**	**S/ 10,588,838.61**		
MONTO POR I.G.V. (VN x 18%)		S/ 1,901,527.37	S/ 4,463.58	S/ 1,905,990.95		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		**S/ 12,465,568.29**	**S/ 29,261.27**	**S/ 12,494,829.56**		
TOTAL A FACTURAR PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			**S/ 29,261.27**			
DESCUENTOS (RETENCIONES, PENALIDADES) INCLUIDO IGV						
RETENCIONES	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**		**S/ 0.00**
RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
PENALIDADES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00
MONTO DE PAGOS CON I.G.V.	**S/ 0.00**	**S/ 12,465,568.29**	**S/ 29,261.27**	**S/ 12,494,829.56**		
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			**S/ 29,261.27**			

El monto a cobrar correspondiente al mes de agosto del 2026 es de S/ 29,261.27 (Veintinueve mil doscientos sesenta y uno con 27/100 soles).

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil
Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y programaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

XI. CÁLCULO DEL REAJUSTE

CÁLCULO DEL REAJUSTE

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS -- PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO:	15/04/2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026
FECHA DE TÉRMINO:	22/09/2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
FACTOR DE RELACION:	0.99500
MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECH BASE:	Julio 2024

R = V(K-1)

V=	MONTO DE LA VALORIZACION MENSUAL (SIN IGV)
K =	K DEL MES QUE LE CORRESPONDE EL PAGO
R=	REAJUSTE DEL MES

CÁLCULO DEL REAJUSTE

VAL.	VAL. PROG		VAL. EJECUTADA		K	K-1	R: REAJUSTE				ESTADO DE LA OBRA	REAJUSTE	
							PROGRAMADO		EJECUTADO			AUTORIZADO	
	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.			PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL		PARCIAL	ACUMULADO
Valorización de obra N°01 del (15/04/25 - 30/04/25)	14,883.94	14,883.94	14,883.94	14,883.94	1.005	0.005	74.42	74.42	74.42	74.42	ADELANTADA	74.42	74.42
Valorización de obra N°02 del (01/05/25 - 01/05/25)	0.00	14,883.94											
Valorización de obra N°03 del (19/07/25 - 31/07/25)	1,177,249.44	1,192,133.38	1,177,249.44	1,192,133.38	1.005	0.005	5,886.25	5,960.67	5,886.25	5,960.67	ADELANTADA	5,886.25	5,960.67
Valorización de obra N°04 del (01/08/25 - 31/08/25)	1,450,070.18	2,642,203.56	1,450,070.18	2,642,203.56	1.002	0.002	2,900.14	8,860.81	2,900.14	8,860.81	ADELANTADA	2,900.14	8,860.81
Valorización de obra N°05 del (01/09/25 - 30/09/25)	1,038,388.28	3,680,591.84	1,038,388.28	3,680,591.84	1.000	0.000	0.00	8,860.81	0.00	8,860.81	ADELANTADA	0.00	8,860.81
Valorización de obra N°06 del (01/10/25 - 31/10/25)	1,355,916.99	5,036,508.83	1,355,916.99	5,036,508.83	0.995	-0.005	-6,779.58	2,081.23	-6,779.58	2,081.23	ADELANTADA	-6,779.58	2,081.23
Valorización de obra N°07 del (01/11/25 - 30/11/25)	2,298,502.63	7,335,011.46	2,298,502.63	7,335,011.46	0.989	-0.011	-25,283.53	-23,202.30	-25,283.53	-23,202.30	ADELANTADA	-25,283.53	-23,202.30
Valorización de obra N°08 del (01/12/25 - 31/12/25)	2,045,540.84	9,380,552.30	2,045,540.84	9,380,552.30	0.985	-0.015	-30,683.11	-53,885.41	-30,683.11	-53,885.41	ADELANTADA	-30,683.11	-53,885.41
Valorización de obra N°09 del (01/01/26 - 22/01/26)	1,247,453.48	10,628,005.78	1,247,453.48	10,628,005.78	0.986	-0.014	-17,464.35	-71,349.76	-17,464.35	-71,349.76	ADELANTADA	-17,464.35	-71,349.76
Valorización de obra N°10 del (21/04/26 - 30/04/26)	508,394.39	11,136,400.17	91,773.11	10,719,778.89	1.021	0.021	10,676.28	-60,673.48	1,927.24	-69,422.52	ATRASADA	1,927.24	-69,422.52
Valorización de obra N°11 del (01/05/26 - 31/05/26)	1,819,663.82	12,956,063.99	1,559,930.97	12,278,709.86	1.031	0.031	58,410.20	-4,263.28	48,326.66	-21,095.66	ATRASADA	48,326.66	-21,095.66
Valorización de obra N°12 del (01/06/26 - 30/06/26)	3,371,710.27	16,327,774.26	633,100.40	13,111,810.26	1.035	0.035	116,009.66	113,746.58	29,158.51	8,062.85	ATRASADA	29,158.51	8,062.85
Valorización de obra N°13 del (01/07/26 - 31/07/26)	1,366,032.31	17,693,806.57	395,803.10	13,507,613.36	1.029	0.029	39,614.94	153,361.52	11,478.29	19,541.14	ATRASADA	11,478.29	19,541.14
Valorización de obra N°14 del (01/08/26 - 31/08/26)	6,668,669.39	24,362,515.96	196,231.76	13,702,845.12	1.030	0.030	200,000.68	353,422.20	5,856.95	25,398.09	ATRASADA	5,856.95	25,398.09
Valorización de obra N°15 del (01/09/26 - 22/09/26)	2,740,255.46	27,102,771.42											
TOTAL S/	27,102,771.42		13,702,845.12				353,422.20		25,398.09			25,398.09	

TOTAL REAJUSTE DEL MES SIN IGV	S/ 5,856.95
IGV	S/ 1,054.25
TOTAL REAJUSTE DEL MES INCLUIDO IGV	S/ 6,911.20

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

XII. CALCULO DE FACTOR DE REAJUSTE "K"

CÁLCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE " K "

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLAS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA- PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA- CUI 2384857.

UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
RESIDENTE	NG. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	NG. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO:	15/04/2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026
FECHA DE TÉRMINO:	22/08/2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
FACTOR DE RELACION:	0.9950
MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECH BASE:	Julio-2024

FÓRMULA POLINÓMICA

K = 0.136*(Mr / Mo) + 0.030*(Ar / Ao) + 0.156*(CATr / CATo) + 0.087*(AMr / AMo) + 0.065*(DFr / DFo) + 0.283*(MMr / MMo) + 0.193*(Ir / Io)

$$IUB' = IUB \times \frac{IU'}{IU}$$

(*) Fórmula Polinomica unica de Expediente Tecnico

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN	SÍMB.	COEFIC.	INCID	ÍNDICE BASE	Ene-25		Abr-25		May-25		Jun-25		Jul-25		Ago-25		Set-25		Oct-25		Nov-25		Dic-25		Ene-26		Indice Base Actualizado	INDICE_dic. 2025	Conf.	Abr-26		May-26		Jun-26		Jul-26		Ago-26	
					(Jul-2024)	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	Dic 2025	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.	ÍNDICE	COEF.
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	ME	0.136	100.000%	742.39	763.51	0.140	763.51	0.140	763.51	0.140			767.67	0.141	767.67	0.141	767.67	0.141	767.67	0.141	767.67	0.141	767.67	0.141	767.67	0.141	96.77	100	0.141	101.35	0.143	101.35	0.143	101.35	0.143	101.35	0.143	101.35	0.143
13	ASFALTO	A	0.030	100.000%	3,307.54	3,481.55	0.084	3,230.86	0.078	3,172.34	0.077			2,995.94	0.072	3,031.86	0.073	2,987.37	0.072	2987.37	0.072	2987.37	0.072	2987.37	0.072	2987.37	0.072	110.72	100	0.072	110.49	0.080	118.95	0.086	118.68	0.086	117.78	0.085	120.52	0.087
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	CAT	0.156	72.436%	591.47	608.00	0.116	608.00	0.116	608.00	0.116			611.20	0.117	611.20	0.117	611.20	0.117	611.20	0.117	611.20	0.117	611.20	0.117	611.20	0.117	96.77	100	0.117	100.65	0.118	101.05	0.118	102.43	0.120	102.60	0.120	102.47	0.120
3	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO			21.154%	947.66	973.98	0.034	941.90	0.033	913.85	0.032			864.09	0.030	842.36	0.030	840.21	0.030	830.91	0.029	809.67	0.029	795.01	0.028	795.01	0.028	106.09	100	0.028	99.27	0.028	100.80	0.028	102.36	0.029	100.90	0.028	98.65	0.028
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZAD			6.410%	281.12	279.45	0.018	274.15	0.018	276.01	0.018			268.92	0.017	265.32	0.017	264.35	0.017	261.40	0.017	254.70	0.016	251.73	0.016	250.26	0.016	112.33	100	0.016	101.39	0.016	102.18	0.016	102.14	0.016	101.86	0.016	101.33	0.016
5	AGREGADO GRUESO	AM	0.067	77.011%	508.92	518.74	0.068	523.57	0.069	523.69	0.069			522.53	0.069	527.39	0.069	517.91	0.068	514.35	0.068	515.75	0.068	519.06	0.068	524.97	0.069	96.94	100	0.069	106.35	0.074	109.58	0.076	110.66	0.077	109.63	0.076	106.87	0.074
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.			22.589%	918.34	937.69	0.020	948.58	0.021	944.96	0.021			952.04	0.021	953.06	0.021	957.21	0.021	966.25	0.021	972.61	0.021	976.01	0.021	978.09	0.021	93.65	100	0.021	103.03	0.022	104.57	0.022	106.66	0.023	107.50	0.023	109.44	0.023
20	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	DF	0.065	56.923%	650.04	689.32	0.037	679.44	0.036	689.72	0.037			675.54	0.036	668.52	0.036	667.39	0.036	661.76	0.035	646.42	0.035	638.85	0.034	636.38	0.034	103.42	100	0.034	104.30	0.036	105.07	0.036	105.45	0.036	104.14	0.036	104.64	0.036
72	FLETE TERRESTRE			43.077%	551.34	556.13	0.028	560.18	0.028	560.18	0.028			562.93	0.029	562.93	0.029	562.93	0.029	564.12	0.029	562.69	0.029	562.93	0.029	567.59	0.029	97.14	100	0.029	106.23	0.031	106.23	0.031	106.23	0.031	104.14	0.030	111.10	0.032
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	MM	0.263	91.519%	441.96	443.61	0.260	435.82	0.255	443.24	0.260			437.23	0.256	433.04	0.254	432.60	0.254	430.24	0.252	419.20	0.246	416.26	0.244	415.52	0.244	106.36	100	0.244	103.89	0.253	104.15	0.254	103.87	0.253	102.96	0.251	102.81	0.250
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL			8.481%	404.81	404.92	0.024	400.70	0.024	403.22	0.024			399.30	0.024	397.21	0.024	396.65	0.024	395.16	0.023	391.08	0.023	389.70	0.023	388.70	0.023	104.14	100	0.023	95.47	0.022	95.11	0.022	94.95	0.022	96.21	0.022	96.06	0.022
39	IND. GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	I	0.193	100.000%	569.85	570.19	0.193	575.89	0.195	577.72	0.196			578.14	0.196	578.48	0.196	577.79	0.196	577.86	0.196	577.26	0.196	577.92	0.196	579.16	0.196	98.39	100	0.196	102.87	0.202	103.53	0.203	103.27	0.203	103.40	0.203	103.71	0.203
			1.00000			K (Ene-25)	1.014	K (Mar-25)	1.005	K (Abr-25)	1.010	K (May-25)	0.000	K (Jun-25)	1.005	K (Jul-25)	1.002	K (Ag-25)	1.000	K(sep-25)	0.995	K (Oct-25)	0.989	K (Nov-25)	0.985	K (Dic-25)		K (Dic-25)	0.986	K (Mar-26)	1.021	K (Abr-26)	1.031	K (May-26)	1.035	K (Jun-26)	1.029	K (Jul-26)	1.030		

ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, Valuación, Presupuestos y Programación

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1314

12.1. CÁLCULO DE REAJUSTE MEDIANTE ÍNDICES UNIFICADOS

- Para la determinación del reajuste de precios correspondiente a la valorización de obra, se empleó la metodología de fórmulas polinómicas conforme a la normativa vigente aplicable a obras públicas ejecutadas bajo el sistema de precios unitarios.
- El cálculo considera la actualización de los Índices Unificados (IU), los cuales representan la variación de precios de los principales insumos que intervienen en la ejecución de la obra, tales como mano de obra, combustibles, cemento, acero y maquinaria.

12.2. SE ADJUNTA TABLAS DE ÍNDICES UNIFICADOS DE:

- Julio-2026

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

El Peruano Firmado por: Editora Peru
Fecha: 19/08/2026 02:27

1312

Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos", la designación en cargos de confianza distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la acotada Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 9 y literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar a los empleados de confianza;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral N° D000047-2026-COFOPRI-DE del 12 de junio de 2026, se resuelve designar a partir de la publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial "El Peruano", al señor Mario Barrientos Ruidías, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina Zonal Piura del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728;

Que, se ha visto por conveniente adoptar la medida en materia de personal correspondiente;

Que, con Resolución de Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG del 30 de octubre de 2025, se resuelve aprobar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, el cual consta de un (01) funcionario público (FP), diez (10) directivos públicos (DP), veintidós (22) servidores civiles de carrera (SCC) y dos (02) servidores de actividades complementarias (SAC);

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000188-2025-SERVIR-PE de fecha 13 de noviembre de 2025, se formaliza el acuerdo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, adoptado en la Sesión N° 16-2025-CD, mediante el cual se aprueba el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;

Que, con el documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, señala que de la revisión de los requisitos del perfil del puesto del Manual de Perfiles de Puestos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado mediante Resolución Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG de fecha 30 de octubre de 2025, y del Decreto Supremo N° 145-2025-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, a fin de adecuarlo a las modificaciones dispuestas por la Ley N° 32507, así como de lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 002-2024-SERVIR-GDSRH "Diseño y estructura de puestos y posiciones para la elaboración, aprobación, administración y modificación del cuadro de puestos de la entidad", en la Novena Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 003-2024-SERVIR-GDSRH "Diseño de perfiles de puestos y elaboración, aprobación, administración y modificación del manual de perfiles de puestos", directivas cuya aprobación se formalizaron con Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros 000017-2024-SERVIR-PE y 000018-2024-SERVIR-PE respectivamente; y en el Decreto Legislativo N° 1602, corresponde dar por concluida la designación del señor Mario Barrientos Ruidías en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina Zonal Piura del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; así como encuentra viable designar al señor Paul Emerson Arrunátegui Sandoval, en el citado cargo de confianza, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728; lo cual va en la línea del numeral 3.7 del Informe Técnico N° 001300-2024-SERVIR-GPGSC del 13 de setiembre de 2024;

Que, en atención a ello, con el informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable expedir el acto resolutivo respectivo;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros 27594, 31419 y 32507; los Decretos Legislativos Nros 728 y 1602; los Decretos Supremos Nros 025-2007-VIVIENDA, 053-2022-PCM y 145-2025-PCM; las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros. 000017-2024-SERVIR-PE, 000018-2024-SERVIR-PE y 000188-2025-SERVIR-PE; la Resolución Gerencia General N° D000096-2025-COFOPRI-GG; y con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial "El Peruano", la designación del señor Mario Barrientos Ruidías en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina Zonal Piura del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, con relación al artículo 2 de la Resolución Directoral N° D000047-2026-COFOPRI-DE, dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la publicación de la Resolución Directoral en el Diario Oficial "El Peruano", al señor Paul Emerson Arrunátegui Sandoval, en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina Zonal Piura del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728.

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, notifique la presente resolución a los señores a que se refiere los artículos 1 y 2 que anteceden, para su conocimiento y fines.

Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y la Oficina de Sistemas realicen las acciones correspondientes, a fin que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal Institucional del COFOPRI (www.gob.pe/cofopri).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA ANTONIETA CASTRO TORRES
Directora Ejecutiva
COFOPRI

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

2544603-1

ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Aprueban Índices Unificados de Precios de la Construcción para las trece (13) Áreas Geográficas correspondientes al mes de julio de 2026

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 187-2026-INEI

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

Lima, 17 de agosto de 2026

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-07-2026/DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de la Construcción para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, correspondientes al mes de julio de 2026 y

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios de la Construcción (Base: diciembre 2025 = 100) para las trece (13) Áreas Geográficas correspondientes al mes de julio de 2026, que se indican en el cuadro siguiente:

ÁREAS GEOGRÁFICAS													
Cód.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14	115,14
02	100,59	98,83	105,82	97,42	97,94	100,53	100,63	101,51	102,10	103,83	101,05	100,81	99,70
03	100,69	98,65	99,96	99,37	99,42	100,39	100,69	98,75	99,71	98,97	98,79	98,19	98,56
04	110,57	117,37	107,20	107,74	113,64	111,11	105,30	106,62	109,74	104,63	109,07	108,44	111,58
05	104,60	106,87	102,98	108,16	109,36	105,98	105,26	105,78	112,52	109,70	104,65	(*)	105,30
06	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59	109,59
07	106,57	112,57	112,33	122,53	122,53	112,76	109,65	120,43	111,95	105,39	111,17	104,92	121,36
08	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32	119,32
09	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73	95,73
10	98,00	101,09	101,02	98,97	101,31	100,96	101,70	105,25	99,03	101,40	110,87	103,22	101,67
11	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39
12	94,92	99,85	103,71	100,80	100,80	102,20	97,56	107,07	103,18	101,13	93,10	101,50	98,71
13	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92	120,92
14	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36	106,36
16	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32	100,32
17	118,46	120,60	117,61	122,32	130,45	110,10	106,87	123,54	127,68	106,16	107,49	140,08	103,37
18	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55	104,55
19	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13	109,13
20	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12	127,12
21	102,96	102,47	102,55	103,15	102,18	100,96	103,94	103,97	103,81	103,76	106,66	98,78	104,28
24	108,32	103,97	98,34	98,67	97,44	99,71	103,18	99,00	99,69	108,68	98,06	98,30	103,75
26	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67
27	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87
28	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47	104,47
30	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04
31	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68
32	109,96	111,10	111,49	107,03	108,78	108,19	108,57	109,22	110,40	105,77	109,38	106,98	113,18
33	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53	104,53
34	130,19	129,86	130,43	127,55	134,32	131,61	126,29	131,97	130,34	135,34	131,73	119,23	127,80
37	102,49	101,90	98,91	101,43	101,51	97,87	100,62	100,47	104,89	100,82	100,99	99,65	102,59
38	109,22	112,03	104,76	106,40	101,14	105,93	107,09	108,14	110,97	112,29	113,62	(*)	108,14
39	103,71	103,71	103,71	104,09	103,71	103,71	103,71	103,71	103,71	103,71	103,71	103,71	103,71
40	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74	99,10	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74
41	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93
42	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65
43	106,52	109,44	110,92	106,07	112,20	123,41	103,45	112,04	116,76	120,92	124,56	104,20	109,61
44	100,64	101,80	101,86	102,48	102,34	102,33	101,11	102,13	106,09	103,24	106,27	99,12	102,21
46	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38
47	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35	101,35
47-1	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75	101,75
48	100,56	96,06	96,90	101,32	101,32	95,67	100,31	98,94	107,81	106,51	99,34	93,13	100,08
49	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81	102,81
50	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14
51	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
52	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56	104,56
53	142,35	138,28	139,51	137,76	145,11	140,31	144,61	140,76	138,36	148,87	145,74	141,54	156,42
54	99,74	100,55	100,51	99,20	99,39	100,84	100,73	101,34	101,47	101,98	101,34	101,19	99,74
55	103,19	104,62	106,67	99,91	100,00	103,88	98,44	106,48	101,85	102,73	110,25	100,00	103,27
56	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
57	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66	95,66

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC

1310

	ÁREAS GEOGRÁFICAS												
Cód.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	103,88	103,76	102,96	103,45	103,45	104,65	104,23	100,72	103,48	105,40	105,38	102,32	101,73
60	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81
61	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46	96,46
62	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04	100,04
65	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33	101,33
66	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97	113,97
68	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
71	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60
72	112,76	114,67	113,39	123,77	123,77	114,27	107,80	117,57	119,25	107,61	112,31	102,09	101,85
77	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12
78	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96	105,96
79	108,53	107,78	99,25	107,05	107,05	111,70	103,17	109,87	100,00	113,59	103,05	104,97	92,16
80	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01
81	100,66	101,64	103,06	103,15	103,88	105,21	104,25	101,51	103,72	116,71	104,14	99,60	103,99
82	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13	107,13
83	97,76	105,59	96,10	100,00	99,02	98,70	100,97	100,98	105,41	103,38	101,93	98,58	100,17
84	95,74	100,44	100,20	99,57	99,41	96,52	100,14	101,42	99,57	98,59	101,80	99,57	100,00
85	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18	100,18
86	100,24	99,51	98,35	96,17	99,01	101,26	100,05	103,39	100,78	101,99	97,34	102,33	99,92
87	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
88	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15	104,15
89	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98	101,98
90	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12	123,12
91	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06	105,06
92	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	98,61	98,61
93	100,52	100,52	100,52	100,48	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52	100,52
94	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87	100,87
95	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30	104,30

(*) Sin índice

Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se refiere el artículo 1, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Lambayeque, Piura y Tumbes.
Área 2 : Cajamarca y La Libertad.
Área 3 : Áncash.
Área 4 : Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Área 5 : Ica.
Área 6 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 7 : Amazonas y San Martín.
Área 8 : Huánuco, Junín y Pasco.
Área 9 : Ayacucho y Huancavelica.
Área 10 : Apurímac, Cusco y Madre de Dios.
Área 11 : Puno.
Área 12 : Loreto.
Área 13 : Ucayali.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Artículo 3.- Los Índices Unificados de Precios de la Construcción, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines.

Regístrese y comuníquese.

GASPAR HUMBERTO MORÁN FLORES
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

CONSORCIO SUPERVISOR MC

2544736-1

Aprueban Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las trece (13) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado, producidas en el mes de julio de 2026

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 188-2026-INEI

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP Nº 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Lima, 17 de agosto de 2026

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los Índices de los elementos que determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, deben elaborarse los Factores de Reajuste correspondientes a las obras de Edificación de las trece (13) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-07-2026/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, correspondientes al período del 1 al 31 de julio de 2026 y que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como

XIII. CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES Y DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

CONTROL DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES Y DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO:	15/04/2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 18/07/2025
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026
FECHA DE TÉRMINO:	22/09/2026

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
FACTOR DE RELACION:	0.99500
MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECH BASE:	Julio-2024

CONTROL GENERAL DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES

DATOS GENERALES	
MONTO CONTRATADO (Inc/IGV)	S/ 31,981,270.28
MONTO CONTRATADO (Sin/IGV)	S/ 27,102,771.42
ADELANTO SOLICITADO (Inc/IGV)	S/ 3,198,127.02
ADELANTO SOLICITADO (Sin/IGV)	S/ 2,710,277.14

ENTREGA DEL ADELANTO INC. IGV (S/)			
FECHA PAGO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
11-Nov-25	S/ 3,198,127.02	S/ 3,198,127.02	0.00

CONTROL GENERAL DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES					
VALORIZACIÓN		AMORTIZACIÓN			
MES	MONTO	(%)	MONTO	ACUMUL.	SALDO
(01/11/25 - 30/11/25)	S/ 2,296,502.63	32.25%	741,345.30	S/ 741,345.30	S/ 1,968,931.84
(01/12/25 - 31/12/25)	S/ 2,045,540.84	10.11%	206,741.62	S/ 948,086.92	S/ 1,762,190.22
(01/01/26 - 22/01/26)	S/ 1,247,453.48	10.00%	124,745.35	S/ 1,072,832.27	S/ 1,637,444.87
(21/04/26 - 30/04/26)	S/ 91,773.11	10.00%	9,177.31	S/ 1,082,009.58	S/ 1,628,267.56
(01/05/26 - 31/05/26)	S/ 1,556,930.97	10.00%	155,693.09	S/ 1,237,902.67	S/ 1,472,374.47
(01/06/26 - 30/06/26)	S/ 833,100.40	10.00%	83,310.04	S/ 1,321,212.71	S/ 1,389,064.43
(01/07/26 - 31/07/26)	S/ 395,803.10	77.78%	307,861.96	S/ 1,629,074.69	S/ 1,081,202.45
MAYOR METRADO N° 02	S/ 515,679.47	100.00%	515,679.47	S/ 2,144,754.16	S/ 565,522.98
(01/08/26 - 31/08/26)	S/ 161,866.19	100.00%	161,866.19	S/ 2,306,620.35	S/ 403,656.79
(01/09/26 - 22/09/26)					
TOTAL					

DEL ADELANTO		
CARTA FIANZA	MONTO INC. IGV (S/)	VENCIMIENTO
N°3002025042339	3,198,127.02	29/12/2025
3002025042339-3	1,932,184.95	25/09/2026

OBSERVACIONES :

Garantía de fiel cumplimiento emitida por ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

DETALLE DE MONTOS DE MATERIALES UTILIZADOS

$$A = Mu * \frac{Ima}{Imo}$$

A: Amortización por Adelanto Específico para Materiales
Mu: Monto de material utilizado
Imo: Índice a la fecha del Presupuesto Base, del elemento representativo dentro del que se encuentra el material o materiales para los cuales se otorgó el adelanto
Ima: Índice del mismo elemento representativo, a la fecha efectiva del adelanto

$$Dm = A * \frac{Imo}{Ima} * \left(\frac{Imr - Ima}{Imo}\right)$$

Dm: Deducción del Reajuste, que no corresponde por Adelanto Específico para Materiales
A: Monto del Adelanto utilizado en la Valorización que se reajusta
Imo: Índice a la fecha del Presupuesto Base, del elemento representativo dentro del que se encuentra el material o materiales para los cuales se otorgó el adelanto
Ima: Índice del mismo elemento representativo, a la fecha efectiva del adelanto
Imr: Índice del mismo elemento representativo, a la fecha del reajuste

N°	Monomios/Insumos	UND	Cantidades Otorgadas			Material Utilizado		Indices unificados			Amortización				Deducción (Dm)
			Cantidad	Precio unitario	Parcial	Cantidad utilizada	Monto Utilizado (Mu)	Imo	Ima	Imr	Acumulado Anterior	Actual (A)	Acumulado Actual	Saldo	Monto
21	CONCRETO PREMEZCLADO CON CEMENTO T-I														
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 CON CEMENTO T-I	M3		460.25	836,555.08		0.00								
	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	m3		460.25		50.00	23,012.50								
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2 CON CEMENTO T-I	M3		481.57	1,086,332.35		0.00								
	CONCRETO PREMEZCLADO CON CEMENTO T-I	M3			1,922,887.43		23,012.50	96.77	96.77	102.60	1,496,218.14	23,012.50	1,519,230.64	403,656.79	1,386.41
3	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO														
	ACERO CORRUGADO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		3.61	787,389.71	1.00000	138,853.69	106.09	106.09	100.90	648,536.02	138,853.69	787,389.71	0.00	-8,792.82
	TOTAL				2,710,277.14						2,144,754.16	161,866.19	2,306,620.35	403,656.79	-5,406.41

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

XIV. RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

RESUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA

Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.		
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VASQUEZ REGALADO	VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ	FACTOR DE RELACION:	0.99500
		MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
FECHA DE SUSPENSION N°:	02/05/2025 al 18/07/2025	MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025	FECH BASE:	Julio-2024
FECHA DE SUSPENSION N°:	23/01/2026 al 20/04/2026		
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026		

DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	REAJUSTES	DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		AMORTIZACIONES		MONTO A PAGAR			N° DE FACTURA	FECHA DE EMISIÓN DE LA CATURA	ESTADO
		REAJUSTES, INC. REINTEGROS	DEDUCC. DE REAJ. QUE NO CORRESP. POR ADEL. DIRECTO	DEDUCC. DE REAJ. QUE NO CORRESP. POR ADEL. DE MATERIALES	AMORT. DE ADELANTO DIRECTO	AMORT. DE ADELANTO DE MATERIALES	MONTO DE PAGO (SIN IGV)	IGV (18%)	MONTO DE FACTURA (CON IGV)			
	P	R	DAD	DAM	AD	AM	MP=P+R-DAD-DAM-AD-AM					
Valorización de obra N°01 del (15/04/25 - 30/04/25)	14,883.94	74.42	-13.21	0.00	1,488.39	0.00	13,483.18	2,426.97	15,910.15	E001-486	14/03/2025	Pagado
Valorización de obra N°02 del (01/05/25 - 01/05/25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E001-492	25/04/2025	Pagado
Valorización de obra N°03 del (19/07/25 - 31/07/25)	1,177,249.44	5,886.25	-1,044.90	0.00	117,724.94	0.00	1,066,455.65	191,962.02	1,258,417.67	E001-51	26/08/2025	Pagado
Valorización de obra N°04 del (01/08/25 - 31/08/25)	1,450,070.18	2,900.14	-1,716.06	0.00	145,007.02	0.00	1,309,679.36	235,742.28	1,545,421.64	E001-52	17/09/2025	Pagado
Valorización de obra N°05 del (01/09/25 - 30/09/25)	1,038,388.28	0.00	-1,433.67	0.00	103,838.83	0.00	935,983.12	168,476.96	1,104,460.08	E001-53	16/10/2025	Pagado
Valorización de obra N°06 del (01/10/25 - 31/10/25)	1,355,916.99	-6,779.58	-2,540.67	0.00	135,591.70	0.00	1,216,086.38	218,895.55	1,434,981.93	E001-55	18/11/2025	Pagado
Valorización de obra N°07 del (01/11/25 - 30/11/25)	2,298,502.63	-25,283.53	-5,666.92	0.00	229,850.26	741,345.30	1,307,690.46	235,384.28	1,543,074.74	E001-56	19/11/2025	Pagado
Valorización de obra N°08 del (01/12/25 - 31/12/25)	2,045,540.84	-30,683.11	-5,850.17	0.00	204,554.08	206,741.62	1,609,412.20	289,694.20	1,899,106.40	E001-61	02/02/2026	Pagado
Valorización de obra N°09 del (01/01/26 - 22/01/26)	1,247,453.48	-17,464.35	-3,444.64	0.00	124,745.35	124,745.35	983,943.07	177,109.75	1,161,052.82	E001-63	02/03/2026	Pagado
Valorización de obra N°10 del (21/04/26 - 30/04/26)	91,773.11	1,927.24	63.35	0.00	9,177.31	9,177.31	75,282.38	13,550.83	88,833.21	E001-65	22/05/2026	Pagado
Valorización de obra N°11 del (01/05/26 - 31/05/26)	1,558,930.97	48,326.86	2,613.59	0.00	155,893.10	155,893.09	1,292,858.05	232,714.45	1,525,572.50	E001-66	19/06/2026	Pagado
Valorización de obra N°12 del (01/06/26 - 30/06/26)	833,100.40	29,158.51	1,725.36	0.00	83,310.04	83,310.04	693,913.47	124,904.42	818,817.89	E001-74	03/08/2026	Pagado
Valorización de obra N°13 del (01/07/26 - 31/07/26)	395,803.10	11,478.29	585.51	0.00	39,580.31	307,861.98	59,253.59	10,665.65	69,919.24	E001-77	20/08/2026	Pagado
Valorización de obra N°14 del (01/08/26 - 31/08/26)	195,231.76	5,856.95	308.06	-5,406.41	19,523.18	161,866.19	24,797.69	4,463.58	29,261.27			
Valorización de obra N°15 del (01/09/26 - 22/09/26)												
TOTAL	13,702,845.12	25,398.09	-16,414.37	-5,406.41	1,370,284.51	1,790,940.88	10,588,838.60	1,905,990.94	12,494,829.54			

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil / CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1308

XV. CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES

CONTROL GENERAL DE LAS VALORIZACIONES
Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.		
UBICACIÓN	CAJAMARCA - CAJAMARCA - JESÚS - NAMORA - NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	A PRECIOS UNITARIOS
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	360 DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	VALOR REFERENCIAL (SIN IGV):	S/ 27,238,966.25
RESIDENTE	ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO	VALOR REFERENCIAL (CON IGV):	S/ 32,141,980.18
SUPERVISOR	ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ	FACTOR DE RELACION:	0.99500
		MONTO CONTRATADO (SIN IGV):	S/ 27,102,771.42
FECHA DE SUSPENSION N°1	02/05/2025 al 19/07/2025	MONTO CONTRATADO (CON IGV):	S/ 31,981,270.28
FECHA DE REINICIO N°1:	19/07/2025	FECH BASE:	Julio-2024
FECHA DE SUSPENSION N°2	23/01/2026 al 20/04/2026		
FECHA DE REINICIO N°2:	21/04/2026		

DESCRIPCIÓN	AVANCE DE OBRA PROGRAMADO				AVANCE DE OBRA EJECUTADO				REAJUSTES	DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		AMORTIZACIONES		MONTO A PAGAR			ESTADO
	PARCIAL (SIN IGV)	% DE AVANCE PARCIAL	ACUMULADO (SIN IGV)	% DE AVANCE ACUM.	PARCIAL (SIN IGV)	% DE AVANCE PARCIAL	ACUMULADO (SIN IGV)	% DE AVANCE ACUM.	REAJUSTES, INC. REINTEGROS	DEDUCC. DE REAL QUE NO CORRESP. POR ADEL. DIRECTO	DEDUCC. DE REAJ. QUE NO CORRESP. POR ADEL. DE MATERIALES	AMORT. DE ADELANTO DIRECTO	AMORT. DE ADELANTO DE MATERIALES	MONTO DE PAGO A LA FECHA (SIN IGV)	IGV (18%)	MONTO DE PAGO (CON IGV)	
					P				R	DAD	DAM	AD	AM	MP=P+R-DAD-DAM-DAE-AD-AM-AE			
Valorización de obra N°01 del (15/04/25 - 30/04/25)	14,883.94	0.05%	14,883.94	0.05%	14,883.94	0.05%	14,883.94	0.05%	74.42	-13.21	0.00	1,488.39	0.00	13,483.18	2,426.97	15,910.15	PAGADO
Valorización de obra N°02 del (01/05/25 - 01/05/25)	0.00	0.00%			0.00	0.00%								0.00	0.00	0.00	
Valorización de obra N°03 del (19/07/25 - 31/07/25)	1,177,249.44	4.34%	1,192,133.38	4.40%	1,177,249.44	4.34%	1,192,133.38	4.40%	5,886.25	-1,044.90	0.00	117,724.94	0.00	1,066,455.65	191,962.02	1,258,417.67	PAGADO
Valorización de obra N°04 del (01/08/25 - 31/08/25)	1,450,070.18	5.35%	2,642,203.56	9.75%	1,450,070.18	5.35%	2,642,203.56	9.75%	2,900.14	-1,716.06	0.00	145,007.02	0.00	1,309,679.36	235,742.28	1,545,421.64	PAGADO
Valorización de obra N°05 del (01/09/25 - 30/09/25)	1,038,388.28	3.83%	3,680,591.84	13.58%	1,038,388.28	3.83%	3,680,591.84	13.58%	0.00	-1,433.67	0.00	103,838.83	0.00	935,983.12	168,476.96	1,104,460.08	PAGADO
Valorización de obra N°06 del (01/10/25 - 31/10/25)	1,355,916.99	5.00%	5,036,508.83	18.58%	1,355,916.99	5.00%	5,036,508.83	18.58%	-6,779.58	-2,540.67	0.00	135,591.70	0.00	1,216,086.38	218,895.55	1,434,981.93	PAGADO
Valorización de obra N°07 del (01/11/25 - 30/11/25)	2,298,502.63	8.48%	7,335,011.46	27.06%	2,298,502.63	8.48%	7,335,011.46	27.06%	-25,283.53	-5,666.92	0.00	229,850.26	741,345.30	1,307,690.46	235,384.28	1,543,074.74	PAGADO
Valorización de obra N°08 del (01/12/25 - 31/12/25)	2,045,540.84	7.55%	9,380,552.30	34.61%	2,045,540.84	7.55%	9,380,552.30	34.61%	-30,683.11	-5,850.17	0.00	204,554.08	206,741.62	1,609,412.20	289,694.20	1,899,106.40	PAGADO
Valorización de obra N°09 del (01/01/26 - 22/01/26)	1,247,453.48	4.60%	10,628,005.78	39.21%	1,247,453.48	4.60%	10,628,005.78	39.21%	-17,464.35	-3,444.64	0.00	124,745.35	124,745.35	983,043.07	177,109.75	1,161,052.82	PAGADO
Valorización de obra N°10 del (21/04/26 - 30/04/26)	508,394.39	1.88%	11,136,400.17	41.09%	91,773.11	0.34%	10,719,778.89	39.55%	1,927.24	63.35	0.00	9,177.31	9,177.31	75,282.38	13,550.83	88,833.21	PAGADO
Valorización de obra N°11 del (01/05/26 - 31/05/26)	1,819,683.82	6.71%	12,956,083.99	47.80%	1,558,930.97	5.75%	12,278,709.86	45.30%	48,326.86	2,613.59	0.00	155,893.10	155,893.09	1,292,858.05	232,714.45	1,525,572.50	PAGADO
Valorización de obra N°12 del (01/06/26 - 30/06/26)	3,371,710.27	12.44%	16,327,794.26	60.24%	833,100.40	3.07%	13,111,810.26	48.38%	29,158.51	1,725.36	0.00	83,310.04	83,310.04	693,913.47	124,904.42	818,817.89	PAGADO
Valorización de obra N°13 del (01/07/26 - 31/07/26)	1,366,032.31	5.04%	17,693,826.57	65.28%	395,803.10	1.46%	13,507,613.36	49.84%	11,478.29	585.51	0.00	39,580.31	307,861.98	59,253.59	10,665.65	69,919.24	PAGADO
Valorización de obra N°14 del (01/08/26 - 31/08/26)	6,668,689.39	24.61%	24,362,515.96	89.89%	195,231.76	0.72%	13,702,845.12	50.56%	5,856.95	308.06	-5,406.41	19,523.18	161,866.19	24,797.69	4,463.58	29,261.27	En trámite
Valorización de obra N°15 del (01/09/26 - 22/09/26)	2,740,255.46	10.11%	27,102,771.42	100.00%													-
TOTAL	27,102,771.42				13,702,845.12				25,398.09	-16,414.37	-5,406.41	1,370,284.51		10,588,138.60			

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

1306

XVI. CONCLUSIONES

- Las partidas ejecutadas durante el mes de agosto se desarrollaron de acuerdo al cronograma Gantt, cumpliendo con las metas y objetivos establecidos en el proyecto.
- Los metrados verificados corresponden a las partidas realmente ejecutadas en obra, lo que garantiza la transparencia y precisión de la valorización.
- La valorización elaborada incluye los costos directos resultantes de los metrados multiplicados por los precios unitarios contractuales, así como los gastos generales y la utilidad, en concordancia con lo estipulado en el contrato.
- La valorización del mes se encuentra conforme a los metrados aprobados y sustentados técnicamente, por lo que corresponde su aprobación y el trámite administrativo pertinente.
- La valorización N° 14 del mes de agosto (Del 01 al 31) del año 2026; presenta un avance programado Acumulado de 89.89 %, y se cuenta con una Avance Ejecutado acumulado de 50.56 %, encontrándose la obra ATASADA en -39.33 %. La supervisión mediante cuaderno de obra N°758 y N°821, ha solicitado el nuevo cronograma de obra acelerado. En la actual valorización nuevamente el avance acumulado ejecutado está por debajo del 80% respecto del avance programado acumulado. A la fecha la supervisión no ha podido verificar el avance acumulado ejecutado al mes de agosto respecto al cronograma acelerado solicitado debido a que la empresa contratista no ha hecho llegar dicho cronograma.
- Se realizó el deductivo por adelanto de materiales en CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 CON CEMENTO T-I correspondiente al deductivo de concreto en muros cuyo monto asciende a S/23,012.69. El saldo de S/. 403,656.79 se considerará en la próxima valorización.
- Se realiza el deductivo por adelanto de materiales en ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 valorizado que corresponde a S/ 138,866.19. Siendo amortizado en su totalidad.
- El total amortizado para la valorización N°14, correspondiente al mes de agosto es de: S/ 161,866.19.
- El pago a favor del contratista incluido IGV correspondiente a la Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 es S/. 29,261.27 (**Veintinueve mil doscientos sesenta y uno con 27/100 soles**).

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 428824
Especialista en Costos


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1305

XVII. PANEL FOTOGRÁFICO:


FOTOGRAFÍA N° 01 : SEGURIDAD

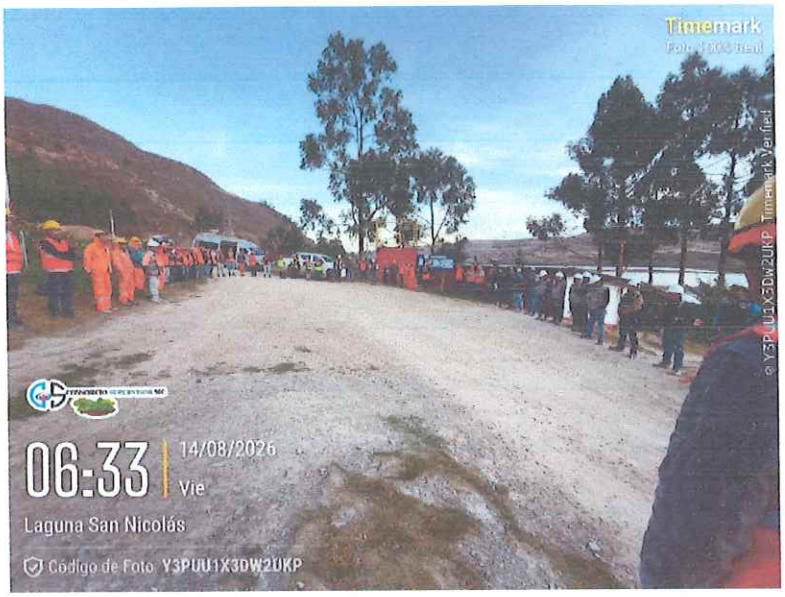

DESCRIPCIÓN: Participación en la charla de seguridad.

Fuente: Elaboración propia, 2026

FOTOGRAFÍA N° 02 : BADENES

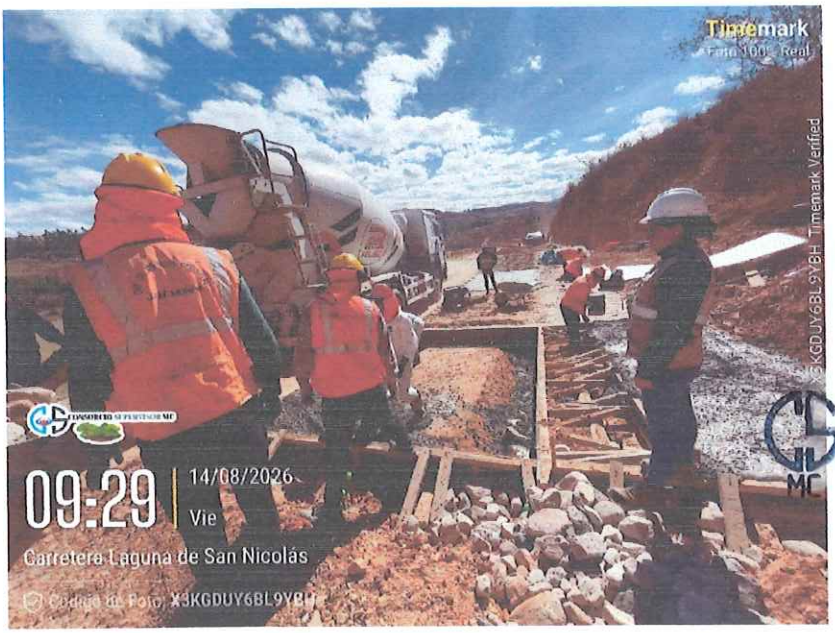

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


Fuente: Elaboración propia, 2026

DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto en badenes.

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

FOTOGRAFÍA N° 03 : CUNETAS


1304

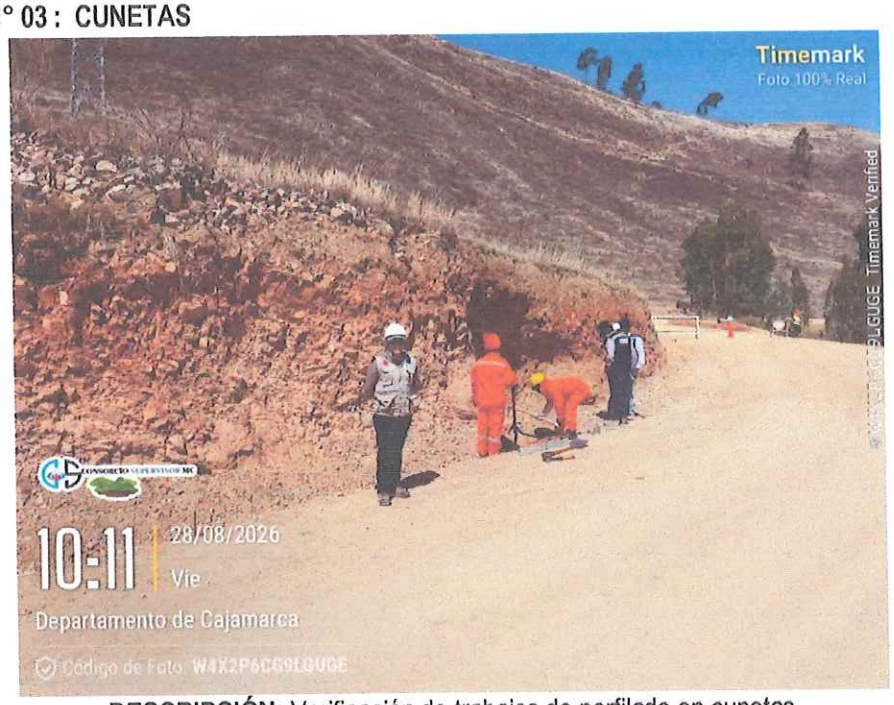

DESCRIPCIÓN: Verificación de trabajos de perfilado en cunetas.

Fuente: Elaboración propia, 2026

FOTOGRAFÍA N° 04 : MANTENIMIENTO VIAL

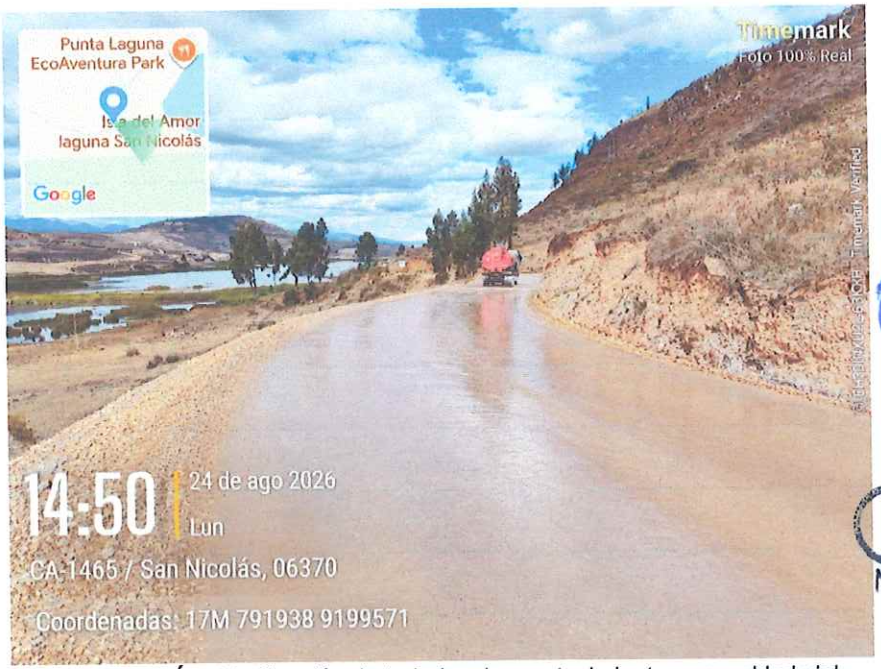

DESCRIPCIÓN: Verificación de trabajos de mantenimiento y seguridad vial.

Fuente: Elaboración propia, 2026


CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1303


FOTOGRAFÍA N° 05 : CANTERA

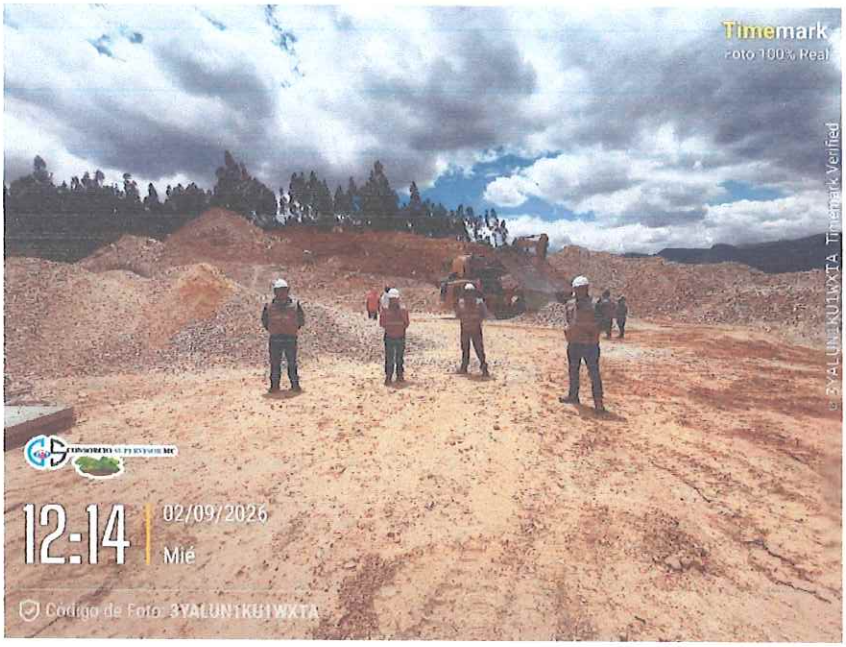

DESCRIPCIÓN: Verificación de preparación de material en cantera.

Fuente: Elaboración propia, 2026

FOTOGRAFÍA N° 06: BADENES

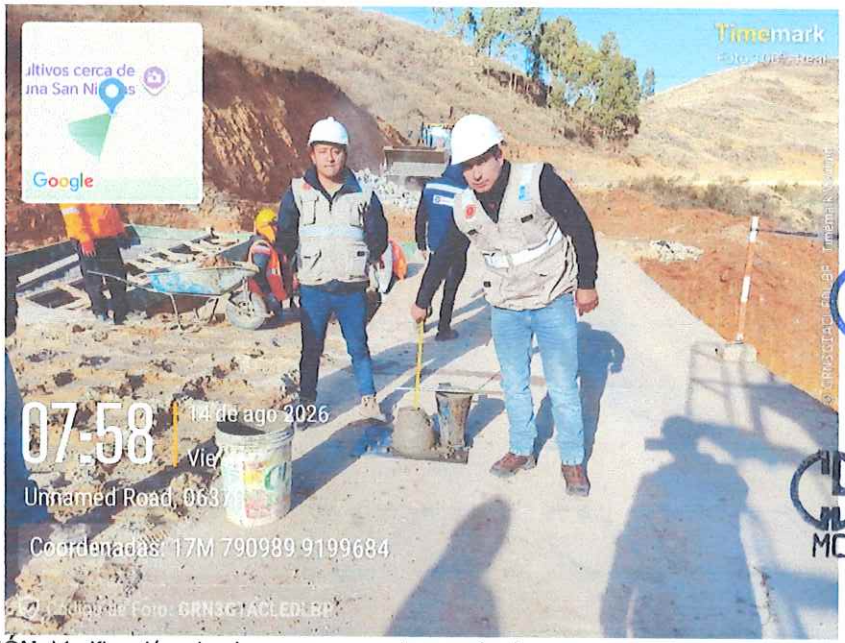

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

DESCRIPCIÓN: Verificación de slump en concreto para badenes.

Fuente: Elaboración propia, 2026

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

1302

ANEXOS:
HOLA DE VALORIZACIÓN N°14 APROBADA POR LA SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

INFORME DE LA SUPERVISION Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1	OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS – PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA – REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857.
2	TIPO DE PROCESO	: A L.P. 011-2024-GRCAJ PRIMERA CONVOCATORIA
3	CONTRATO N°	: N°006-2025-GRCAJ-GGR
4	FECHA DEL CONTRATO	: 13 de enero del 2025
5	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: A PRECIOS UNITARIOS
6	UBICACIÓN	
	DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
	PROVINCIA	: CAJAMARCA
	DISTRITO	: JESÚS - NAMORA
	LOCALIDADES	: NAMORA-LAGUNA SAN NICOLAS-EMPALME PE-3N
7	ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
8	CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL DEL NORTE
9	REPRESENTANTE COMUN	: LIC. JOSE LUIS YOPLA VERGARA
10	RESIDENTE	: ING. ALEX HIDELBRANDO VÁSQUEZ REGALADO
11	SUPERVISOR	: ING. OSCAR CUEVA RODRIGUEZ
12	VALOR REFERENCIAL SIN IGV	: S/ 27,238,966.25
13	VALOR REFERENCIAL CON IGV	: S/ 32,141,980.18
14	MONTO DEL CONTRATO, SIN IGV	: S/ 27,102,771.42
15	MONTO DEL CONTRATO, CON IGV	: S/ 31,981,270.28
16	FACTOR DE RELACION	: 0.995
17	FECHA DE PRESUPUESTO BASE	: Julio-2024
18	PLAZO DE EJECUCIÓN	: 360 DÍAS CALENDARIO
19	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 28/01/2025
20	FECHA DE INICIO DE OBRA	: 15/04/2025
21	FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	: 09/04/2026
22	ADICIONALES DE OBRA	: 22/05/2026

ADICIONAL DE OBRA N°01	**Monto Sin IGV:** S/ 330,835.93 **Resolución:** N°D231-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 22/05/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 390,386.40	
ADICIONAL DE OBRA N°02	**Monto Sin IGV:** S/ 660,201.84 **Resolución:** N°D288-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 30/06/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 779,038.17	
ADICIONAL DE OBRA N°03	**Monto Sin IGV:** S/ 446,513.54 **Resolución:** N°D313-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 21/07/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 526,885.98	
ADICIONAL DE OBRA N°04	**Monto Sin IGV:** S/ 3,262,557.77 **Resolución:** N°D323-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 04/08/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 3,849,818.17	

23	DEDUCTIVOS DE OBRA	: 00/01/1900	
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01	**Monto Sin IGV:** S/ 117,987.14 **Resolución:** N°D288-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 30/06/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 139,224.83	
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02	**Monto Sin IGV:** S/ 1,248,131.31 **Resolución:** N°D323-2026-GR.CAJ/GGR **Fecha de Notificacion:** 04/08/2026	**Monto Inc. IGV:** S/ 1,472,794.95	

24	AMPLIACIONES DE PLAZO	: En controversia Ampliacion de plazo N°01 (Presentado a la JRD con Expediente JPRD-0017-2025) Fecha 17/07/2026			
	ATRASO JUSTIFICADO	: Presentado Con CARTA N° 069-2026-JLYV-RC-CVN: FECHA:31/07/2026			
25	PLAZO VIGENTE DE EJECUCIÓN	360 DÍAS CALENDARIO			
26	SUSPENSION DE PLAZO N°01	: INICIO	02/05/2025	FIN	18/07/2025
27	FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N°01	19/07/2025			
28	SUSPENSION DE PLAZO N°02	: INICIO	23/01/2026	FIN	20/04/2026
29	FECHA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION N°02	21/04/2026			
30	FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	22/09/2026			

II. CONTROL DE CARTAS FIANZAS

1 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO PRINCIPAL	**Monto Inc. IGV:** S/ 3,198,127.03	**Número de fianza:**	N°3002024037117-3
	Aseguradora: ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento: 19/11/2026	**Estado Actual:**	Vigente -

2 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO

CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO	**Monto Inc. IGV:** S/ 3,198,127.02	**Número de fianza:**	3002024037118-6
	Aseguradora: ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento: 05/10/2026	**Estado Actual:**	Vigente

3 CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES

CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES	**Monto Inc. IGV:** S/ 3,198,127.02	**Número de fianza:**	3002025042339-3
	Aseguradora: ALVA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		
	Fecha de Vencimiento: 25/09/2026	**Estado Actual:**	Vigente

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

III. ANTECEDENTES

1 Con fecha 13 de enero del 2025 se firma el contrato de obra N°006-2025-GRCAJ-GGR entre el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO VIAL DEL NORTE y la entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

2 Con fecha 28 Enero de 2025 la entidad GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA realiza la entrega de terreno a la empresa contratista CONSORCIO VIAL DEL NORTE

3 Con fecha 15 Abril de 2025 se da inicio al plazo de ejecución de obra

4 El plazo de ejecución de la obra es de 360 DÍAS CALENDARIO

5 El 07 de mayo del 2025 se suscribe el acta de suspension de plazo de ejecucion de obra N° 01 que rige a partir del 02 de mayo del 2025.

6 El 19 de julio del 2025 se suscribe el acta de reinicio del plazo de ejecución.

7 El 23 de enero del 2026 se suscribe el acta de suspension de plazo de ejecucion de obra N°02 que rige a partir del 23 de enero del 2026.

8 EL 21 de abril del 2026 se suscribe el acta de reinicio del plazo de ejecucion de obra N 01

Descripción	estado	Descripción	estado
Valorización de obra N°01 del (15/04/25 - 30/04/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°08 del (01/12/25 - 31/12/25)	PAGADO
Valorización de obra N°02 del (01/05/25 - 01/05/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°09 del (01/01/26 - 22/01/26)	PAGADO
Valorización de obra N°03 del (19/07/25 - 31/07/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°10 del (21/04/26 - 30/04/26)	PAGADO
Valorización de obra N°04 del (01/08/25 - 31/08/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°11 del (01/05/26 - 31/05/26)	PAGADO
Valorización de obra N°05 del (01/09/25 - 30/09/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°12 del (01/06/26 - 30/06/26)	PAGADO
Valorización de obra N°06 del (01/10/25 - 31/10/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°13 del (01/07/26 - 31/07/26)	PAGADO
Valorización de obra N°07 del (01/11/25 - 30/11/25)	**PAGADO**	Valorización de obra N°14 del (01/08/26 - 31/08/26)	En trámite

IV. DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS

- Los metrados jecutados de la Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 cuya cuantificación se realizó conjuntamente con el supervisor de obra, Tal como se puede apreciar en las planillas y resumenes de metrados adjuntos a la presente valorización de obra.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL (01/08/26 - 31/08/26)	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
			BASE				
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	GLB	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50
01.02	CARTEL DE OBRA	und	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	19.76	18.36	0.00	18.36	1.40
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	mes	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
01.05	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	2,465.86	0.00	0.00	0.00	2,465.86
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01	TERRAPLEN O RELLENO P/SUBRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS.	HA	1.49	1.39	0.00	1.39	0.10
02.01.02	CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CORTE EXCEDENTE.	M3	30,808.27	30,808.27	0.00	30,808.27	0.00
02.01.03	PREPARACION DE MATERIAL PARA BASE EN CANTERA	M3	23,115.08	0.00	0.00	0.00	23,115.08
02.01.04	PREPARACION DE MATERIAL PARA SUB BASE EN CANTERA	M3	28,351.36	28,351.36	0.00	28,351.36	0.00
02.01.05	PREPARACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CANTERA	M3	25,890.95	25,890.95	0.00	25,890.95	0.00
02.02	CORTE EN EXPLANACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.01	CORTE EN MATERIAL SUELTO, H=2,300-3,800 MSNM	M3	164,906.57	133,746.90	-76.22	133,670.68	31,235.89
02.02.02	CORTE EN ROCA SUELTA, H=2300-3800 MSNM	M3	2,995.75	2,995.75	0.00	2,995.75	0.00
02.02.03	CORTE EN ROCA FIJA, H=2300-3800 MSNM	M3	1,613.15	1,613.15	0.00	1,613.15	0.00
02.02.04	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, e=0.30 M	M3	11,837.99	11,837.99	0.00	11,837.99	0.00
02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO SUBRASANTE	M2	123,551.70	123,551.70	0.00	123,551.70	0.00
02.02.06	PERFILADO DE CORTES EN TALUD	M2	7,902.85	7,135.88	0.00	7,135.88	766.97
02.02.07	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1 KM	M3K	111,383.06	94,115.63	-99.09	94,016.54	17,366.52
02.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D>1 KM	M3K	140,564.10	96,122.84	0.00	96,122.84	44,441.26
02.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL A MEDIA LADERA C/MAQUINARIA	M3	59,678.76	36,676.96	0.00	36,676.96	23,001.80
03	SUB BASE - BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	5,919.00	5,146.40	0.00	5,146.40	772.60
03.02	SUB BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.20 M.	M3	16,764.09	16,764.09	0.00	16,764.09	0.00
03.03	BASE GRANULAR C/RODILLO E=0.15 M.	M3	18,492.06	0.00	0.00	0.00	18,492.06
04	PAVIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA (TSB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	123,551.70	0.00	0.00	0.00	123,551.70
04.01.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA, e=1"	M2	126,017.56	0.00	0.00	0.00	126,017.56
04.02	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

04.02.01	NIVELACION DE TECHO DE BUZONES	und	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
04.02.01	**DESCRIPCIÓN**	**und**	**METRADO BASE**	**ACUM. ANTERIOR**	**MET. ACTUAL**	**METRADO ACUMULADO**	**SALDO DE METRADO**
04.02.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	36.00	33.00	0.00	33.00	3.00
04.02.03	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 1/2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	306.03	306.03	0.00	306.03	0.00
04.02.04	REPOSICION DE TUBERIA AGUA 2" (INCL PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION)	m	1,228.87	755.50	0.00	755.50	473.37
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01	BADENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,906.13	143.15	0.00	143.15	1,762.98
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,906.13	143.15	879.81	1,022.96	883.17
05.01.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	80.45	0.00	0.00	0.00	80.45
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	877.31	200.20	677.11	877.31	0.00
05.01.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	459.05	0.00	0.00	0.00	459.05
05.01.02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A	M3	543.73	260.26	283.47	543.73	0.00
05.01.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	125.17	29.26	75.94	105.20	19.97
05.01.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	1,906.13	143.15	764.44	907.59	998.54
05.01.02.06	ACOMODO DE PIEDRA	M3	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
05.01.03	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	397.03	70.58	188.17	258.75	138.28
05.01.03.02	CONCRETO PARA MURO DE BADEN f'c=175 kf/cm2	M3	87.78	0.00	0.00	0.00	87.78
05.01.03.03	CONCRETO EN ENBOQUILLADO DE ENTRADA Y SALIDA f'c=140 kf/cm2	M3	225.90	0.00	0.00	0.00	225.90
05.01.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES	M2	582.16	78.40	186.23	264.63	317.53
05.01.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO BADEN	M2	166.73	0.00	0.00	0.00	166.73
05.01.03.06	JUNTAS DE DILATACION	m	591.27	0.00	0.00	0.00	591.27
05.02	ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	1,405.96	545.03	0.00	545.03	860.93
05.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,405.96	545.03	0.00	545.03	860.93
05.02.01.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	97.76	97.76	0.00	97.76	0.00
05.02.01.04	REMOCION DE ALCANTARILLAS TMC	m	24.68	24.68	0.00	24.68	0.00
05.02.01.05	LIMPIEZA EN ALCANTARILLAS TMC	und	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	2,110.02	411.50	0.00	411.50	1,698.52
05.02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	80.52	63.27	0.00	63.27	17.25
05.02.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	253.06	253.05	0.00	253.05	0.01
05.02.02.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D<=1.80 KM	M3	2,638.35	617.21	0.00	617.21	2,021.14
05.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	716.34	495.28	0.00	495.28	221.06
05.02.02.06	CAMA DE APOYO E= 10 cm	M3	466.09	190.78	0.00	190.78	275.31
05.02.02.07	ACOMODO DE PIEDRA	M3	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
05.02.03	INSTALACION TMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.03.01	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	138.09	0.00	138.09	170.22
05.02.03.02	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	58.93	0.00	58.93	0.00
05.02.03.03	ARMADO ALCANTARILLA TMC D=60"	m	11.92	11.92	0.00	11.92	0.00
05.02.03.04	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=24"	m	308.31	138.09	0.00	138.09	170.22
05.02.03.05	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=36"	m	58.93	58.93	0.00	58.93	0.00
05.02.03.06	INSTALACION ALCANTARILLA TMC D=60"	m	17.89	17.89	0.00	17.89	0.00
05.02.04	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.04.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PARAPETOS	M3	21.32	3.49	0.00	3.49	17.83
05.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PARAPETOS	M2	204.77	25.09	0.00	25.09	179.68
05.02.04.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% PM PARA CABEZALES	M3	111.95	75.80	0.00	75.80	36.15
05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CABEZALES	M2	704.94	506.28	0.00	506.28	198.66
05.02.04.05	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	17.99	16.16	0.00	16.16	1.83
05.02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	M2	113.14	104.87	0.00	104.87	8.27
05.02.04.07	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + PIEDRA =12"	M3	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
05.02.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PA ENBOQUILLADO DE PIEDRA	M2	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
05.03.01	**DESCRIPCIÓN**	**0**	**METRADO BASE**	**ACUM. ANTERIOR**	**MET. ACTUAL**	**METRADO ACUMULADO**	**SALDO DE METRADO**
05.03	MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO Y BESBROCE	M2	7,686.15	4,473.55	0.00	4,473.55	3,212.60
05.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	M2	7,686.15	4,473.55	0.00	4,473.55	3,212.60
05.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	M3	7,363.90	7,148.05	0.00	7,148.05	215.86
05.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	7,363.90	1,591.70	0.00	1,591.70	5,772.20
05.03.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	8,030.45	8,030.45	0.00	8,030.45	0.00
05.03.02.04	PERFILADO Y COMPACTACION	M2	2,572.40	2,572.40	0.00	2,572.40	0.00
05.03.03	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.03.01	SOLADO f'c=100 kg/cm²	M3	2,748.80	296.39	0.00	296.39	2,452.41
05.03.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PG	M3	1,864.16	1,864.16	0.00	1,864.16	0.00
05.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,541.25	3,541.25	0.00	3,541.25	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CALOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

05.03.04	CONCRETO ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm²	M3	2,050.74	1,738.94	0.00	1,738.94	311.80
05.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA	M2	2,164.80	1,826.29	0.00	1,826.29	338.51
05.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	3,270.05	2,474.38	0.00	2,474.38	795.67
05.03.04.04	ACERO F'Y=4200 KG/CM2	kg	207,079.02	171,095.11	0.00	171,095.11	35,983.91
05.03.05	MISCELANEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.05.01	DRENAJE CON MATERIAL OVER DE 2" - 4"	M3	940.73	940.73	0.00	940.73	0.00
05.03.05.02	TUBO DE PVC Ø 2"	m	435.59	376.41	0.00	376.41	59.18
05.03.05.03	JUNTA DE DILATACIÓN DE TECNOPOR e= 2", PARA MUROS	M2	964.36	964.36	0.00	964.36	0.00
05.03.05.04	SELLO ASFÁLTICO EN PANTALLA	m	1,735.64	1,735.64	0.00	1,735.64	0.00
05.04	CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01	CUNETAS REVESTIDAS e=0.10M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4,110.64	0.00	76.22	76.22	4,034.42
05.04.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM	M3	4,110.64	0.00	99.09	99.09	4,011.55
05.04.01.01.03	REFINE Y COMPACTACION	M2	24,890.36	0.00	0.00	0.00	24,890.36
05.04.01.01.04	EXCAVACION Y PERFILADO DE ZANJAS DE CORONACION.	M3	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50
05.04.01.02	CONCRETO SIMPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.04.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA TRIANGULAR	M2	830.09	0.00	0.00	0.00	830.09
05.04.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CUNETA RECTANGULAR	M2	4,171.92	0.00	0.00	0.00	4,171.92
05.04.01.02.03	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	M3	2,133.45	0.00	0.00	0.00	2,133.45
05.04.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION e= 1"	m	9,348.03	0.00	0.00	0.00	9,348.03
06	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.01	LINEAS CONTINUAS	m	71,437.00	0.00	0.00	0.00	71,437.00
06.01.02	LINEAS DISCONTINUAS	m	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
06.01.03	MARCAS EN EL PAVIMENTO	M2	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
06.02	SEÑALIZACION VERTICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.02.01	HITOS KILOMÉTRICOS	und	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
06.02.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
06.02.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
06.02.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
06.02.05	GUARDAVIAS METALICOS	m	1,265.10	0.00	0.00	0.00	1,265.10
06.02.06	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	und	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
06.02.07	REDUCTOR DE VELOCIDAD, TIPO RESALTO, CIRCULAR	und	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
07	MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01	MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00	0.84	0.08	0.92	0.08
07.01.02	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE	GLB	1.00	0.84	0.08	0.92	0.08
07.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO	GLB	1.00	0.85	0.08	0.93	0.07
07.01.04	PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	GLB	1.00	0.76	0.08	0.84	0.16

07.01.06.02	DESCRIPCIÓN	GLB	METRADO BASE	ACUM. ANTERIOR	MET. ACTUAL	METRADO ACUMULADO	SALDO DE METRADO
07.01.05	PROGRAMA DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA	GLB	1.00	0.68	0.08	0.76	0.24
07.01.06	PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.01.06.01	PARTICIPACION CIUDADANA	GLB	1.00	0.77	0.08	0.85	0.15
07.01.06.02	PARTICIPACION DE EMPLEO LOCAL	GLB	1.00	0.77	0.08	0.85	0.15
07.01.06.03	PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS	GLB	1.00	0.85	0.08	0.93	0.07
07.01.06.04	MONITOREO DE DEUDAS LOCALES	GLB	1.00	0.69	0.08	0.77	0.23
07.02	PLAN DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01	PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE FENOMENOS NATURALES.	GLB	1.00	0.77	0.08	0.85	0.15
07.02.02	SISTEMA DE EXTINTORES PORTATILES	und	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
07.02.03	GABINETES CONTRA INCENDIO	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
07.02.04	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	0.91	0.08	0.99	0.01
07.02.05	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE DERRAMES	und	8.00	7.08	0.08	7.16	0.84
07.02.06	EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA ASISTENCIA MEDICA	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
07.02.07	SIMULACROS	und	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
07.03	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.03.01	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	und	24.00	18.00	0.00	18.00	6.00
07.03.02	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	und	12.00	9.00	0.00	9.00	3.00
07.03.03	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	und	8.00	6.00	0.00	6.00	2.00
07.03.04	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	und	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
07.04	PLAN DE ABANDONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04.01	ABANDONO DE INSTALACIONES AUXILIARES	GLB	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
07.04.02	RESTAURACION DE AREAS DEFORESTADAS	GLB	1.00	0.24	0.08	0.32	0.68
08	FLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	0.93	0.00	0.93	0.07

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BORLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219318
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDA YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 326824
Jr. Cinco Esquinas [illegible] - San Luis - II ETAPA - Cajamarca

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Borly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

V. AVANCE FISICO DE LA OBRA

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°14

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		MONTO (S/)	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO (S/)	%
COMPONENTE 01	**21,992,833.80**	**10,960,897.36**	**49.84%**	**158,422.90**	**0.72%**	**11,119,320.26**	**50.56%**	**10,873,513.54**	**49.44%**
TRABAJOS PRELIMINARES	631,351.38	446,236.23	70.68%	0.00	0.00%	446,236.23	70.68%	185,115.15	29.32%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,327,199.85	3,514,178.39	81.21%	-724.17	-0.02%	3,513,454.22	81.19%	813,745.63	18.81%
SUB BASE - BASE	1,723,138.38	897,815.98	52.10%	0.00	0.00%	897,815.98	52.10%	825,322.40	47.90%
PAVIMENTOS	3,667,502.35	90,331.41	2.46%	0.00	0.00%	90,331.41	2.46%	3,577,170.94	97.54%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	9,843,421.97	5,338,364.97	54.23%	132,974.97	1.35%	5,471,339.94	55.58%	4,372,082.03	44.42%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD V	936,424.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	936,424.50	100.00%
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AM	468,607.83	306,445.98	65.39%	26,172.10	5.59%	332,618.08	70.98%	135,989.75	29.02%
FLETE	395,187.54	367,524.40	93.00%	0.00	0.00%	367,524.40	93.00%	27,663.14	7.00%
TOTAL COSTO DIRECTO	21,992,833.80	10,960,897.36		158,422.90		11,119,320.26		10,873,513.54	
GASTOS GENERALES (16.8538266314 73%)	3,706,634.08	1,847,330.65		26,700.32		1,874,030.97		1,832,603.11	
UTILIDAD(6.380730879073 52%)	1,403,303.54	699,385.36	49.84%	10,108.54	0.72%	709,493.90	50.56%	693,809.64	49.44%
SUBTOTAL	27,102,771.42	13,507,613.37		195,231.76		13,702,845.13		13,399,926.29	
IGV(18%)	4,878,498.86	2,431,370.41		35,141.72		2,466,512.13		2,411,986.73	
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL INC IGV	31,981,270.28	15,938,983.78		230,373.48		16,169,357.26		15,811,913.02	

VI. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Avance físico Programado	24.61%	Avance Físico ejecutado del mes	0.72%
Avance físico Acumulado programado	89.89%	Avance físico ejecutado Acumulado	50.56%

VII. DEL PAGO AL CONTRATISTA

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO (SIN IGV)	VALORIZACION				SALDO (S/)
		ANTERIOR ACUM.	ACTUAL (S/)	ACUMULADO (S/)	% AVANCE ACUMULADO	
A. VALORIZACIÓN CONTRACTUAL						
MONTO VALORIZADO SIN IGV	27,102,771.42	13,507,613.37	195,231.76	13,702,845.13	50.56%	13,399,926.29
TOTAL	**27,102,771.42**	**13,507,613.37**	**195,231.76**	**13,702,845.13**		**13,399,926.29**
AVANCE FISICO DE LA OBRA		49.84%	0.72%	50.56%		49.44%
CONTROL DE LINEA BASE						
Monto de Avance físico acumulado			f=	**13,702,845.13**		
Monto de avance programado acumulado			g=	**24,362,515.96**		
Cumplimiento de monto programado (f/g)				**56.25%**		
B. REAJUSTES						
Reajuste contrato principal		19,541.14	5,856.95	25,398.09		
TOTAL		**19,541.14**	**5,856.95**	**25,398.09**		
C. DEDUCCIONES DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**		
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo		-S/ 16,722.43	S/ 308.06	-S/ 16,414.37		
Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales		S/ 0.00	-S/ 5,406.41	-S/ 5,406.41		
TOTAL		**-S/ 16,722.43**	**-S/ 5,098.35**	**-S/ 21,820.78**		
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = A+B-C)		**13,543,876.94**	**206,187.06**	**13,750,064.00**		
D. AMORTIZACIONES		**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**		
Amortización de adelanto directo		1,350,761.33	19,523.18	1,370,284.51		
Amortización de adelanto de materiales		1,629,074.69	161,866.19	1,790,940.88		
TOTAL		**2,979,836.02**	**181,389.37**	**3,161,225.39**		
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB-D)		**13,527,154.51**	**24,797.69**	**13,551,952.20**		
MONTO POR I.G.V. (VN x 18%)		1,901,527.37	4,463.58	1,905,990.95		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		**12,465,568.29**	**29,261.27**	**12,494,829.56**		
TOTAL A FACTURAR PARA EL PRESENTE MES INCLUIDO IGV			**29,261.27**			

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI YUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822
Especialista en Costos, Metrados, Presupuestos y Valorizaciones

VIII. CONTROL DE OBRA

a.- CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

PERIODO	MES	MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS				SITUACIÓN
		MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES		MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES		
		PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PARCIAL %	ACUMUL. %	PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PARCIAL %	ACUMUL. %	
	MES 00									
(15/04/25 - 30/04/25)	MES 01	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	14,883.94	14,883.94	0.05%	0.05%	
(01/05/25 - 01/05/25)	**MES 02**	**0.00**	**14,883.94**	0.00%	**0.05%**	0.00	14,883.94	0.00%	0.05%	
(19/07/25 - 31/07/25)	MES 03	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	**4.40%**	1,177,249.44	1,192,133.38	4.34%	4.40%	ADELANTADA
(01/08/25 - 31/08/25)	MES 04	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	**9.75%**	1,450,070.18	2,642,203.56	5.35%	9.75%	ADELANTADA
(01/09/25 - 30/09/25)	MES 05	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	**13.58%**	1,038,388.28	3,680,591.84	3.83%	13.58%	ADELANTADA
(01/10/25 - 31/10/25)	MES 06	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	**18.58%**	1,355,916.99	5,036,508.83	5.00%	18.58%	ADELANTADA
(01/11/25 - 30/11/25)	MES 07	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	**27.06%**	2,298,502.63	7,335,011.46	8.48%	27.06%	ADELANTADA
(01/12/25 - 31/12/25)	MES 08	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	**34.61%**	2,045,540.84	9,380,552.30	7.55%	34.61%	ADELANTADA
(01/01/26 - 22/01/26)	MES 09	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	**39.21%**	1,247,453.48	10,628,005.78	4.60%	39.21%	ADELANTADA
(21/04/26 - 30/04/26)	MES 10	508,394.39	11,136,400.17	1.88%	**41.09%**	91,773.11	10,719,778.89	0.34%	39.55%	ATRASADA
(01/05/26 - 31/05/26)	MES 11	1,819,683.82	12,956,083.99	6.71%	**47.80%**	1,558,930.97	12,278,709.86	5.75%	45.30%	ATRASADA
(01/06/26 - 30/06/26)	MES 12	3,371,710.27	16,327,794.26	12.44%	**60.24%**	833,100.40	13,111,810.26	3.07%	48.38%	ATRASADA
(01/07/26 - 31/07/26)	MES 13	1,366,032.31	17,693,826.57	5.04%	**65.28%**	395,803.10	13,507,613.36	1.46%	49.84%	ATRASADA
(01/08/26 - 31/08/26)	MES 14	6,668,689.39	24,362,515.96	24.61%	**89.89%**	195,231.76	13,702,845.12	0.72%	50.56%	ATRASADA
(01/09/26 - 22/09/26)	MES 15	2,740,255.46	27,102,771.42	10.11%	**100.00%**					
	TOTAL	**27,102,771.42**		**100.00%**		**13,702,845.12**		**50.56%**		

- AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. AVANCE FÍSICO EJECUTADO

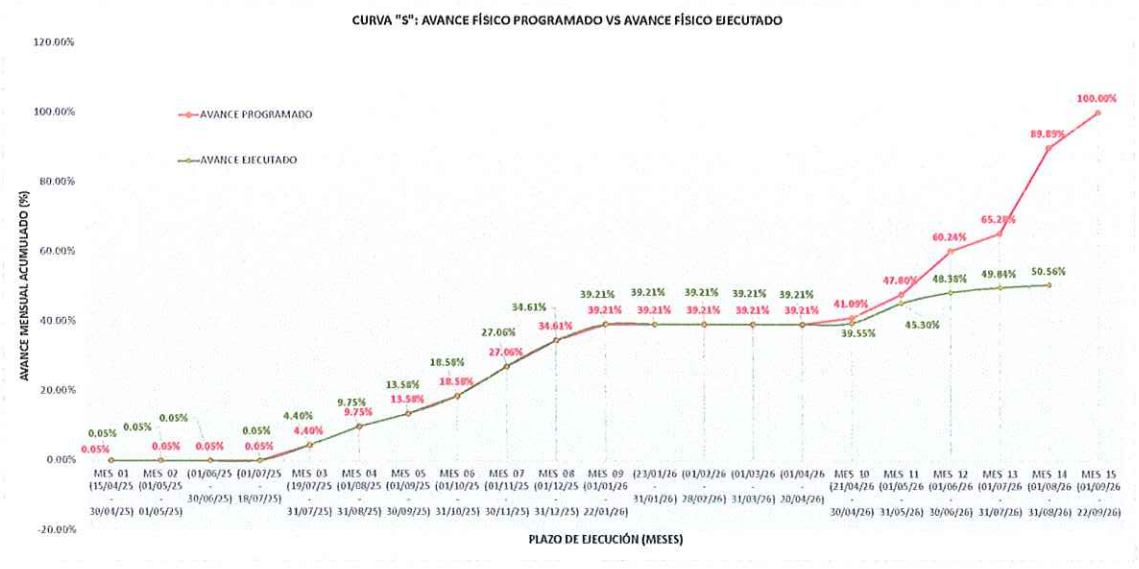


CONSORCIO SUPERVISOR MC
Ing. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Programaciones

1295

- AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

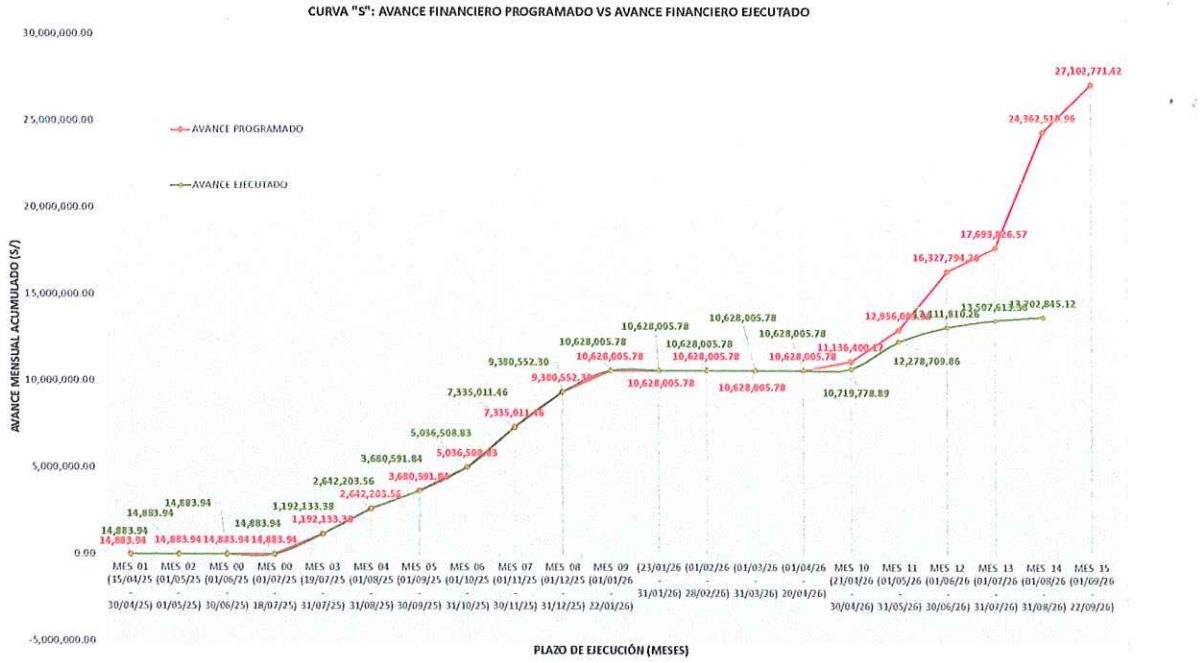

IX. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO

AVANCE EJECUTADO DEL MES	0.72%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	50.56%
AVANCE PROGRAMADO DEL MES	24.61%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	89.89%
PORCENTAJE DE ADELANTO Y/O ATRAZO	-39.33%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO RESPECTO AL PROGRAMADO EJECUTADO	56.3%
SITUACIÓN DE LA OBRA	ATRASADA

X. ASPECTO ECONOMICO

Valorizaciones tramitadas:	13
Valorizaciones pagadas:	11
Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 Sin IGV:	195,231.76
Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 Con IGV:	230,373.48
Reajuste Sin IGV:	5,856.95
Reajuste Con IGV:	6,911.20
Amortización del adelanto directo Sin IGV:	19,523.18
Amortización del adelanto directo con IGV:	23,037.35
Amortización adelanto materiales Sin IGV:	161,866.19
Amortización adelanto materiales Con IGV:	191,002.10
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Sin IGV:	308.06
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto directo Con IGV:	363.51
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Sin IGV:	-5,406.41
Ded. De Reajuste que no corresponde por adelanto para materiales Con IGV:	-6,379.56
Monto neto a facturar Sin IGV:	24,797.69
Monto neto a facturar Con IGV:	29,261.27

XI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance mensual de la Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 es del 0.720338732060192% respecto a lo programado que deberia ser del 24.60519%,

- El avance programado acumulado total de la obra es del 89.88938% y el avance ejecutado acumulado es del 50.5588336618898%

- El avance ejecutado acumulado total de la obra respecto al avance programado acumulado es del 56.3%

-Se realiza el deductivo por adelanto de materiales en ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 valorizado que corresponde a s/ 138,866.19. Siendo amortizado en su totalidad.

- Se realiza el deductivo por adelanto de materiales en CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2 CON CEMENTO T-I correspondiente al deductivo de concreto en muros cuyo monto asciende a s/23,012.69. El saldo de s/. 403,656.79 se considerará en la proxima -Total amortizado para la valorización N°14- correspondiente al mes de agosto es de: s/ 161,866.19.

- El monto neto a favor del contratista incluido IGV correspondiente a la Valorización de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2026 es de S/ 29,261.27 ().

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219918
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y Valorizaciones

1794

ANEXOS:
ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA RESPECTO A CALENDARIO ACELERADO DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDI JUDITH CANOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328822

Correo electrónico: cuevarooscar@gmail.com
Celular: 930 758 673
Dirección: Jr. Cinco Esquinas N° 1581 URB. San Luis II ETAPA- Cajamarca.

Asiento del Cuaderno de Incidencias

1293

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857

Contratista: CONSORCIO VIAL DEL NORTE

Número de asiento: 758

Título ASIENTO N°758 DEL SUPERVISOR DE OBRA

Fecha y Hora 10/08/2026 17:56

Usuario: CUEVA RODRIGUEZ, OSCAR BERLY

Rol: SUPERVISOR

Tipo de asiento: CALENDARIO ACELERADO DE OBRA

Descripción: La supervisión el día 07 de agosto de 2026 dio trámite ante la Entidad (Gobierno Regional de Cajamarca) la valorización de ejecución de obra N°13 correspondiente al mes de julio de 2026 mediante EXP. MAD3 N° 000775-2026-049856, en la cual se ha podido apreciar que la obra se encuentra con un avance mensual ejecutado del 1.46 % y un avance ejecutado acumulado del 49.84 %, el Avance de Obra Programado Acumulado Vigente es de 65.28 % lo que significa que la Obra está atrasada en 15.45 % respecto a lo programado, es decir el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha es menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada, por consiguiente en cumplimiento al numeral 203.1 del Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución del RLCE, solicito al Residente de Obra se me haga llegar el nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, es decir se me haga llegar el calendario acelerado de los trabajos de la ejecución de la obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Cargo Valorizacion N13- mes julio contra.pdf

Hash 256: 5d84a802411fd978cae3d3e25f0b8387f155b43cab490d0ed62ae3edb5a84437

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
LEYDA JUDITH CAYOTOPA CABRERA
Ing. Civil Reg. CIP N° 328824
Especialista en Costos, metrados, presupuestos y valorizaciones

Asiento del Cuaderno de Incidencias

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA TRAMO: NAMORA - LAGUNA SAN NICOLÁS- EMPALME PE -3 N, - DISTRITO DE JESÚS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA, - DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA - CUI 2384857

Contratista: CONSORCIO VIAL DEL NORTE

Número de asiento: 821

Título ASIENTO N°821 DEL SUPERVISOR DE OBRA

Fecha y Hora 08/09/2026 09:14

Usuario: CUEVA RODRIGUEZ, OSCAR BERLY

Rol: SUPERVISOR

Tipo de asiento: CALENDARIO ACELERADO DE OBRA

Descripción: La supervisión el día 07 de agosto de 2026 dio trámite ante la Entidad (Gobierno Regional de Cajamarca) la valorización de ejecución de obra N°13 correspondiente al mes de julio de 2026 mediante EXP. MAD3 N° 000775-2026-049856, en la cual se ha podido apreciar que la obra se encuentra con un avance mensual ejecutado del 1.46 % y un avance ejecutado acumulado del 49.84 %, el Avance de Obra Programado Acumulado Vigente es de 65.28 % lo que significa que la Obra está atrasada en 15.45 % respecto a lo programado, es decir el monto de la valorización acumulada ejecutada a la fecha es menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada.
Mediante asiento N°758 de fecha 10/08/2026, solicito se me haga llegar el calendario acelerado de obra.
El contratista mediante carta N°102-2026-JLYV-RC-CVN, de fecha 25/08/2026, hacen llegar su sustento de retraso justificado.
La supervisión mediante CARTA Nº 104-2026-OBCR /RC/ CONSORCIO SUPERVISOR MC, de fecha 26/08/2026, mediante registro MAD 3N° 000775-2026-054976, ingresa al Gobierno Regional de Cajamarca, el informe de Remisión de Informe y opinión sobre Sustento de atraso justificado y afectaciones a la ruta crítica por demora de la entidad en la atención de consultas y adicionales, mediante el cual se declara improcedente dicha justificación.

Por consiguiente, en cumplimiento al numeral 203.1 del Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución del RLCE, REITERO al Residente de Obra se me haga llegar el nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, es decir se me haga llegar el calendario acelerado de los trabajos de la ejecución de la obra, solicitado mediante asiento N° 758.

Asiento de Referencia: 758 - ASIENTO N°758 DEL SUPERVISOR DE OBRA

Archivos anexos: 01

CARGO CARTA 104-2026.pdf

Hash 256: c60926b0d1277615fb7b07a5a3fa8e3ae2398f0c5be314a51b3f0db2ea41bfd4

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil - CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR MC

1291

N° - A - 0234940

LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): CAYOTOPA CABRERA LEYDI YUDITH

Adscrito al Consejo Departamental de: CAJAMARCA

Con Registro de Matrícula del CIP Nº: 328822 Fecha de Incorporación: 17/01/2024

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	==========
LUGAR	==========

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2027

CAJAMARCA , 20 de ABRIL del 2026

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental de Cajamarca
Ing. Rosa Victoria Ortiz Rojas
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SUPERVISOR MC
ING. OSCAR BERLY CUEVA RODRIGUEZ
Ing. Civil CIP N° 219818
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR MC
Oscar Berly Cueva Rodriguez
REPRESENTANTE COMÚN
